

Drienovská Nová Ves			
Číslo spisu:	DNU-2018/184/025 - 001		
Číslo záznamu:	025	Dátum:	15.10.2018
Prílohy:	/	Vybavuje:	ING. SZOZMAN

Zmluva o dielo

**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci
Drienovská Nová Ves**

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "A"

Objednávateľ:

Názov: Obec Drienovská Nová Ves
Sídlo: Obecný úrad, Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice
IČO: 00326976
DIČ: 2021225448
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Ing. Ján Brozman – starosta obce
IBAN:
ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Ing. Viliam Čech
Sídlo: K Surdoku 9, 080 01 Prešov
IČO: 34347470
DIČ: 1020745781
IČ DPH: SK1020745781
Zapísaný v : Živnostenský register č. 707-12275, OÚ Prešov
Zastúpený: Ing. Viliam Čech
IBAN: SK68 1111 0000 0068 8602
ďalej ako "zhotoviteľ"

sa dohodli na nasledujúcich podmienkach uskutočnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich služieb pri realizácii zákazky s názvom „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves**“.

I. PREAMBULA

1. Objednávateľ je podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovenia § 7 ods. 1, písm. b) verejným obstarávateľom, a výber zhotoviteľa sa uskutočnil v zmysle tohto zákona na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej :
vo vestníku verejného obstarávania číslo : 165/2018 pod značkou : 11694 - WYP
dňa: 21.08.2018 ďalej ako výzva, alebo ako oznámenie o vyhlásení
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a v súlade s podmienkami získania zákazky.

Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že je oprávnený na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a to najmä v zmysle tzv. Živnostenského zákona, má odborné znalosti a praktické skúsenosti na realizáciu predmetu tejto zmluvy a je ochotný a schopný predmet tejto zmluvy za jej podmienok k spokojnosti objednávateľa vykonať.

V súlade s platnými právnymi predpismi sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli nasledovne:

II. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác, dodávok materiálov, technologických častí a poskytnutie súvisiacich služieb, ktorých výsledkom bude stavebné dielo s názvom „**Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves**“ podľa:

- podmienok tejto zmluvy,
- platných právnych predpisov,
- predmetu, rozsahu, podmienok a informácii definovaných vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého sa táto zmluva uzatvorila (výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady vrátane príloh k súťažným podkladom a prípadné vysvetlenia)
- ponuky zhotoviteľa

V takomto poradí je aj vzájomná nadradenosť vyššie uvedených dokumentov/dokladov.

III. ZMLUVNÁ CENA

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene

celková cena bez dane z pridanej hodnoty : 455 053,65 €

daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% : 91 010,73 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : **546 064,38 €**

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :

Päťstoštyridsaťšesťtisícšesťdesiatštyri EURO, 38 Centov

a objednávateľ mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohách Zmluvy časť "D": Cena diela a platobné podmienky - "Fakturačný formulár" a „Formuláre špecifikácie položiek“.

IV. LEHOTA VÝSTAVBY

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví predmet tejto zmluvy v lehote do :

.. 6 .. mesiacov

odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

V. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej časti :
 - B. Definície
 - C. Všeobecné zmluvné podmienky
 - D. Cena diela a platobné podmienky
 - E. Technické zmluvné podmienky
 - F. Technické riešenie zhotoviteľa
 - G. Ostatné doklady zmluvy
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že svojim podpisom na tejto zmluve zároveň vyjadruje súhlas s formulármi a dokumentami, ktoré boli poskytnuté objednávateľom a zverejnené v profile, alebo poskytnuté objednávateľom k spracovaniu ponuky, a v nezmenenej podobe ako boli zverejnené alebo poskytnuté tvoria súčasť tejto zmluvy (Definície, Všeobecné zmluvné podmienky, Platobné podmienky, Technické zmluvné podmienky a pod.), a tieto budú pri plnení tejto zmluvy pre neho platnými, účinnými a záväznými v plnom rozsahu, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ich nebol v štádiu predkladania svojej súťažnej ponuky povinný fyzicky predložiť, alebo samostatne verifikovať v zmysle podmienok súťaže.
3. Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške rovnajúcej sa **10 000,00 € (desaťtisíc eur)** prostredníctvom bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa (podrobné podmienky uvedené v ZoD časť „C“ bod 24.)
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť túto zmluvu, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevýhodných podmienok, túto zmluvu vrátane jej príloh si pred jej uzatvorením prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.
6. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, pričom každá zmena tejto zmluvy musí byť v súlade s platnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
7. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, pričom týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu alebo iných ustanovení uvedených osobitne v inej časti tejto zmluvy.

8. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
9. Táto zmluva stratí platnosť a účinnosť, a to bez nároku Zhotoviteľa na úhradu ušlého zisku alebo iných nákladov, ak Objednávateľ do jedného roku od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy nezíska na spolufinancovanie zákazky finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program: Integrovaný regionálny operačný plán) alebo iných fondov; ak sa zmluvné strany medzitým nedohodnú inak.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019


Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:



Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "B" Definície

V Zmluvných podmienkach („tieto Podmienky“), ktoré zahŕňajú tieto Všeobecné a Zvláštne podmienky nasledujúce slová a výrazy budú mať ďalej uvedený význam pre túto zmluvu. Slová označujúce osoby alebo strany zahŕňujú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné.

1. Zmluva

- 1.1. "EÚ" znamená Európska únia
- 1.2. "SR" znamená Slovenská republika
- 1.3. "DÚR" alebo "dokumentácia pre ÚR" znamená dokumentácia pre územné rozhodnutie
- 1.4. "DSP" alebo "dokumentácia pre SP" znamená dokumentácia pre stavebné povolenie
- 1.5. "DRS" alebo "dokumentácia RS" znamená dokumentácia pre realizáciu stavby
- 1.6. "DSV" znamená dokumentácia skutočného vyhotovenia
- 1.7. "Tendrová dokumentácia" znamená dokumentácia poskytnutá objednávateľom v súťaži na základe, ktorej bola uzavretá táto zmluva
- 1.8. "Zákon o VO" znamená zákon NR SR č. 343/2015 Z. z. v platnom znení pre verejné obstarávanie na základe, ktorého bola uzatvorená táto zmluva o dielo
- 1.9. "Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Z. z. v platnom znení
- 1.10. "Verejný obstarávateľ" znamená Objednávateľ v čase súťaže
- 1.11. "Uchádzač" znamená potencionálny Zhotoviteľ v čase súťaže
- 1.12. "Súťaž" znamená postup podľa zákona o VO na základe, ktorého bola uzatvorená táto zmluva o dielo

- 1.13. **"Oznámenie o vyhlásení"** alebo **"oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania"** znamená oznámenie podľa zákona o VO prostredníctvom, ktorého bola vyhlásená súťaž na základe, ktorého bola uzatvorená táto zmluva o dielo
- 1.14. **"Výzva na predkladanie ponúk"** alebo **"Výzva"** znamená oznámenie zverejnené vo vestníku verejného obstarávania podľa zákona o VO prostredníctvom, ktorým bola vyhlásená súťaž, ktorej výsledkom bola uzatvorená táto zmluva o dielo
- 1.15. **"Súťažné podklady"** znamená súbor informácií bez ohľadu na ich tvar poskytnutých v zmysle zákona o VO v súťaži v rámci súťažných podkladov
- 1.16. **"Doklady súťaže"** znamená všetky informácie a podmienky bez ohľadu na ich tvar poskytnuté objednávateľom v súťaži (napríklad oznámenie o vyhlásení, súťažné podklady vrátane ich všetkých príloh, vysvetlenia poskytnuté verejným obstarávateľom v rámci súťaže a podobne)
- 1.17. **"Ponuka uchádzača"**, alebo len **"Ponuka"** znamená ponuka predložená Zhotoviteľom v súťaži
- 1.18. **"Prijatá ponuka"** znamená ponuka predložená Zhotoviteľom v súťaži a v rámci súťaže prijatá Objednávateľom
- 1.19. **"Predbežné technické riešenie"** znamená návrh zhotoviteľa predložený ako súčasť ponuky v súťaži bez ohľadu na to či sa jedná a textový alebo grafický formát, ktorou uchádzač navrhuje/navrhol, čo je predmetom jeho ponuky, či už obsahovo, spôsobom realizácie a dodávok, ktorým preukazuje ako, v akom rozsahu a kvalite zhotoví predmet tejto zmluvy o dielo v prípade jej uzavretia
- 1.20. **"Technické riešenie"** znamená Predbežné technické riešenie ktoré bolo objednávateľom v súťaži prijaté, a ktoré sa po prijatí objednávateľom stalo záväzným pre realizáciu predmetu zmluvy o dielo. Ten istý význam má aj Predbežné technické riešenie Prijatej ponuky, keďže ponuka bola prijatá a tým je pre predmet zmluvy záväzná
- 1.21. **"Zmluva/Zmluvné dokumenty"**, znamená Zmluvu o dielo, Oznámenie o prijatí ponuky, Ponukový list, tieto Podmienky, Technicko – kvalitatívne podmienky, Výkresy, Súvisiace dokumenty a ďalšie dokumenty (pokiaľ sú nejaké), ktorých zoznam je uvedený v Zmluve o dielo alebo v Oznámení o prijatí ponuky
- 1.22. **"Oznámenie o prijatí ponuky"** znamená oznámenie o formálnom prijatí Ponuky objednávateľom vrátane všetkých priložených dokumentov, ktoré zahrňujú dohody medzi stranami a sú nimi podpísané.
- 1.23. **"Výkresy/Projektová dokumentácia"** znamenajú projektovú dokumentáciu diela (stavby) poskytnuté v súťaži Verejným obstarávateľom, vrátane ich upresnení, ako napríklad vysvetlenia v rámci súťaže a podobne, a všetky

dodatočné, alebo zmenené výkresy/Projektové dokumentácie vydané Zhotoviteľom v súlade so zmluvou o dielo.

- 1.24. **"Súvisiace dokumenty"** znamenajú dokument(y) s názvom Súvisiace dokumenty, zostavené zhotoviteľom a predložené spolu s Ponukovým listom tak, ako je to uvedené v Zmluve. Takýto dokument môže zahrňovať súpis položiek, údaje, zoznamy a rozpisy sadziieb a/alebo cien. Súvisiacimi dokumentmi sú aj dokumenty, ktoré je zhotoviteľ povinný zhotoviť v zmysle Zmluvy o dielo
- 1.25. **"Stavebný zákon"** znamená zákon č. 50/1976 Zb. v platnom znení

2. Strany a osoby

- 2.1. **"Strana"** znamená objednávateľa alebo zhotoviteľa, podľa kontextu.
- 2.2. **"Objednávateľ"** znamená osobu označenú ako objednávateľ a právnych nástupcov tejto osoby.
- 2.3. **"Zhotoviteľ"** znamená osobu(y) označenú ako zhotoviteľ a právnych nástupcov tejto osoby alebo osôb.
- 2.4. **"Stavebný dozor"** znamená osobu stanovenú objednávateľom na to, aby konala ako stavebný dozor pre účely zmluvy, alebo inú osobu určenú podľa potreby objednávateľom a ohlásenú zhotoviteľovi.
- 2.5. **"Predstaviteľ zhotoviteľa"** znamená osobu menovanú zhotoviteľom v zmluve alebo určenú podľa potreby zhotoviteľom, ktorá koná v mene zhotoviteľa.
- 2.6. **"Pracovníci objednávateľa"** znamená stavebný dozor, jeho pomocníkov podľa, zástupcu vo veciach technických, koordinátor projektu a všetkých ostatných pracovníkov, robotníkov a ďalších zamestnancov stavebného dozora a objednávateľa, ako aj všetkých ostatných pracovníkov nahlásených zhotoviteľovi objednávateľom alebo stavebným dozorom ako zástupcovia objednávateľa.
- 2.7. **"Pracovníci zhotoviteľa"** znamená predstaviteľa zhotoviteľa a všetkých pracovníkov, ktorých zhotoviteľ využíva na stavenisku, čo môže byť personál, robotníci a ďalší zamestnanci zhotoviteľa a ktoréhokoľvek podzhotoviteľa a to v celom rade, a všetci ďalší pracovníci, ktorí pomáhajú zhotoviteľovi pri vyhotovovaní diela.
- 2.8. **"Subdodávateľ"** znamená ktorúkoľvek osobu uvedenú v zmluve, alebo neuvedenú výslovne v zmluve ako sudodávateľa alebo ktorúkoľvek osobu ustanovenú za subdodávateľa a to v celom rade, povereného vyhotovením časti diela, ako aj právnych nástupcov všetkých týchto osôb.

3. Dátumy, skúšky, lehoty a dokončenie

- 3.1. **"Základný dátum"** znamená dátum, posledný deň na predloženie Ponuky.

- 3.2. "**Dátum začatia prác**" znamená dátum oznámený podľa podčlánkov Začatie prác v časti "E".
- 3.3. "**Lehota výstavby**" znamená dobu na vyhotovenie diela alebo jeho časti (podľa okolností) podľa podčlánkov IV. Lehota výstavby v časti "A", ktorá je počítaná od dátumu odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.4. "**Preberacie skúšky**" znamenajú skúšky, ktoré sú špecifikované v Zmluve, alebo tie na ktorých sa dohodnú obidve strany, alebo sú nariadené ako zmena a ktoré sú vykonané podľa článku Preberacie skúšky časti "E" predtým, než je dielo alebo jeho časť (podľa okolností) prebraté objednávatelom.
- 3.5. "**Preberací protokol**" znamená dokument vydaný podľa článku Preberanie stavby objednávatelom v časti "E".
- 3.6. "**Skúšky po dokončení**" znamenajú skúšky (pokiaľ nejaké jestvujú), ktoré sú špecifikované v zmluve a sú vykonané v súlade s ustanoveniami Zvláštnych podmienok po prebratí diela, alebo jeho časti (podľa okolností) objednávatelom.
- 3.7. "**Záručná doba**" (Lehota na oznámenie závad) znamená obdobie pre oznámenie závad na diele, alebo jeho časti (podľa okolností) podľa podčlánkov Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie väd v časti "E" tak, ako je uvedené v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánkov Predĺženie záručnej doby v časti "E" počítané od dátumu, kedy je dokončenie diela alebo jeho časti potvrdené podľa podčlánkov Preberacie konanie a Prebratie častí stavby v časti "E".
- 3.8. "**Protokol o vyhotovení diela**" (Protokol o ukončení záručnej doby) znamená dokument vydaný podľa podčlánkov Protokol o vyhotovení diela v časti "E".
- 3.9. "**Deň**" znamená kalendárny deň, a „**rok**“ znamená 365 dní.
- 3.10. "**Pracovný deň**" znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného voľna, alebo dňom pracovného pokoja.
- 3.11. "**Mesiac**" znamená 30 dní.
- 3.12. „**Rok**“ znamená 365 dní.

4. Ceny a platby

42. "**Akceptovaná zmluvná cena**" znamená čiastku potvrdenú v Oznámení o prijatí ponuky za vyhotovenie predmetu zmluvy a odstránenie akýchkoľvek väd. Ak nie je potvrdená v oznámení o prijatí ponuky, je ňou cena uvedená v ponuke ktorá bola prijatá.
43. "**Zmluvná cena**" znamená cenu definovanú v podčlánku III. Zmluvná cena časti "A" a zahŕňa úpravy vykonané v súlade so Zmluvou.
44. "**Náklady**" znamenajú všetky výdavky, ktoré zhotoviteľ vynaložil (alebo, ktoré má vynaložiť) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžii a podobných poplatkov, ktoré však nezahŕňujú zisk.

45. **"Potvrdenie konečnej faktúry"** znamená potvrdenie platby vydané podľa podčlánkov Vydanie potvrdenia konečnej faktúry v časti "D"
46. **"Konečný súpis vykonaných prác"** znamená dokument/súpis definovaný v podčlánkov Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry v časti "D".
47. **"Cudzia mena"** znamená menu, v ktorej je splatná časť (alebo celá) zmluvná cena; neznamená však domácu menu.
48. **"Potvrdenie čiastkovej faktúry"** znamená potvrdenie nároku na čiastkovú platbu, vydané podľa časti "D" je však iné než Potvrdenie konečnej faktúry.
49. **"Domáca mena"** znamená menu "Krajiny" (krajina v ktorej sa realizuje stavba).
- 4.10. **"Potvrdenie faktúry"** (potvrdenie platby) znamená potvrdenie oprávnenosti faktúry (nároku na platbu) vydané podľa kapitoly časti "D"
- 4.11. **"Súpis vykonaných prác"** znamená súpis vykonaných prác predložený zhotoviteľom ako súčasť žiadosti o potvrdenie faktúry podľa článku časti "D" a to podľa vzoru stanoveného objednávateľom.

5. **Práce a vybavenie**

- 5.1. **"Zariadenie zhotoviteľa"** znamená všetky prístroje, stroje, vozidlá, mechanizmy a ďalšie veci potrebné, alebo nevyhnutné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých závad. Avšak zariadenie zhotoviteľa nezahŕňa dočasné dielo, zariadenia objednávateľa (ak nejaké je), technologické zariadenia, materiály a akékoľvek ďalšie veci, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť trvalého diela.
- 5.2. **"Vybavenie"** znamená zariadenie zhotoviteľa, materiály, technologické zariadenia a dočasné dielo, alebo čokoľvek z toho tak, ako je to potrebné na vyhotovenie diela.
- 5.3. **"Materiály"** znamenajú veci všetkého druhu (iné než technologické zariadenie), ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť trvalého diela, vrátane materiálov dodaných bez montáže (ak také sú), ktoré majú byť dodané zhotoviteľom podľa Zmluvy.
- 5.4. **"Trvalé dielo"** znamená práce a ich trvalý hmotný výsledok, ktoré majú byť vyhotovené zhotoviteľom podľa Zmluvy.
- 5.5. **"Technologické zariadenie"** znamená prístroje, stroje a vozidlá, ktoré majú tvoriť alebo tvoria časť trvalého diela.
- 5.6. **"Časť stavby"** znamená časť stavebného diela, špecifikovanú v Prílohe k ponuke ako časť (úsek), ak nejaká existuje.

5.7. **"Dočasné dielo"** znamená všetky práce a dočasné konštrukcie a objekty (iné ako zariadenie zhotoviteľa) potrebné na stavenisku pre vyhotovenie a dokončenie stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek závad.

5.8. **"Dielo"** znamená "trvalé dielo" a prípadne "dočasné dielo", alebo ktorékoľvek z nich, podľa toho čo sa hodí.

6. **Ďalšie definície**

6.1. **"Dokumentácia zhotoviteľa"** znamená výpočty, počítačové programy a ďalšie programové vybavenie (software), výkresy, príručky, modely a ďalšie dokumenty technickej povahy (ak nejaké sú) dodané zhotoviteľom podľa Zmluvy a v rozsahu podľa zmluvy ak tá stanovuje ich rozsah.

6.2. **"Dokumentácia objednávateľa"** znamená dokumentáciu poskytnutú objednávateľom v rámci súťaže, a to či už samotnú dokumentáciu, alebo aj ostatné podmienky súťaže. Pritom je jedno v akom tvare alebo formáte bola poskytnutá

6.3. **"Dokumentácie pre realizáciu, alebo realizačná dokumentácia"** znamená dokumentáciu, ktorú zhotoviteľ vypracoval/dopracoval v zmysle platných právnych predpisov, podmienok súťaže a tejto zmluvy a to v akejkolvek výstupnej forme.

6.4. **"Dokumentácie skutočného vyhotovenia"** znamená dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, ktorú je povinný zhotoviteľ odovzdať v zmysle platných právnych predpisov a podmienok tejto zmluvy objednávateľovi pri odovzdaní ukončeného predmetu tejto zmluvy.

6.5. **"Krajina"** znamená krajinu, v ktorej sa nachádza stavenisko (alebo väčšina z neho), na ktorom má byť vyhotovené trvalé dielo.

6.6. **"Zariadenie objednávateľa"** znamená prístroje, stroje a vozidlá (ak nejaké sú) a podobne, ktoré dáva k dispozícii na použitie zhotoviteľovi pri vyhotovení stavebného diela tak, ako sa to uvádza v technicko-kvalitatívnych podmienkach; nezahrňuje však technologické zariadenie, ktoré neprevzal objednávateľ.

6.7. **"Vyššia moc"** znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť:

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať a ktorú nie je možné v Zásade pripísať druhej strane.

6.8. **"Právne predpisy"** znamenajú všetku legislatívu, nariadenia, vyhlášky a ďalšie právne predpisy legálne ustanovených orgánov verejnej správy.

6.9. **"Zábezpeka na vykonanie prác"** (na splnenie zmluvných záväzkov)" znamená zábezpeku (alebo zábezpeky) podľa podčlánkov Zábezpeka na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) v častiach "A" a „C").

- 6.10. "**Stavenisko**" znamená miesta, kde má byť vyhotovené trvalé dielo a kde majú byť dodané technologické zariadenia a materiály, ako aj akékoľvek ďalšie miesta, ktoré môžu byť špecifikované v Zmluve ako súčasť staveniska.
- 6.11. "**Nepredvídateľné okolnosti**" znamenajú okolnosti, ktoré nemôžu byť predvídané (predpokladané) ani skúseným, a odborne zdatným zhotoviteľom k spracovaniu ponuky. Medzi nepredvídateľné okolnosti nemožno zaradiť také, ktoré mohol zhotoviteľ zistiť pri spracovaní ponuky, alebo ich mohol vzhľadom na jeho požadovanú odbornosť a skúsenosť predvídať, alebo predpokladať
- 6.12. "**Zmena**" znamená akúkoľvek zmenu stavebného diela, ktorá je nariadená alebo schválená ako zmena podľa článkov Zmeny a úpravy v časti "E".
- 6.13. "**doklad**" znamená originál dokladu (písomnosti), alebo v zmysle platných právnych predpisov úradne osvedčená fotokópia originálneho dokladu
- 6.14. "**fotokópia dokladu**" znamená úradne neoverená fotokópia originálneho dokladu

7. Výklad pojmov

V Zmluve, okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné:

- a) slová v jednom gramatickom rode označujú všetky rody,
- b) slová v jednotnom čísle označujú taktiež množné číslo a slová v množnom čísle označujú aj číslo jednotné,
- c) ustanovenia obsahujúce slovo "súhlasit", "odsúhlasit" alebo "súhlas/dohoda" vyžadujú, aby súhlas alebo dohoda boli zaznamenané písomne a
- d) "písomný" alebo "písomné" znamenajú písaný ručne, písacím strojom, vytlačený alebo zhotovený elektronicky a existujúci v tlačenej podobe,
- e) ustanovenia obsahujúce výraz „náklady plus primeraný zisk“ vyžadujú, aby primeraný zisk bol maximálne dvadsatinou nákladov (5%).

8. Komunikácia

8.1. Kdekoľvek tieto Podmienky predpokladajú schválenie alebo vydanie súhlasu, potvrdenia, schválenia, rozhodnutia, oznámenia a požiadania, takýto prostriedok komunikácie musí byť:

- a) písomný a odovzdaný osobne (oproti potvrdeniu), doručený poštou alebo kuriérom, alebo prenášaný za použitia akéhokoľvek z vopred odsúhlasených systémov elektronického prenosu a
- b) doručený, na adresu príjemcu s tým, že:
 - i) ak príjemca oznámi zmenu adresy, takáto správa/oznámenie sa potom doručí podľa toho a
 - ii) ak príjemca vopred neuviedol inak pri žiadosti o schválenie alebo súhlas ináč, môže sa správa/ oznámenie o schválení zaslať na adresu, z ktorej bola odoslaná žiadosť.

8.2. Schválenia, potvrdenia, súhlas a rozhodnutia sa nesmú bez rozumného dôvodu odoprieť alebo odkladať. Keď je pre niektorú zo strán vydané potvrdenie, ten kto ho vydáva je povinný zaslať kópiu aj druhej strane. Keď jednej strane vydá

oznámenie druhá strana alebo stavebný dozor, kópia takého oznámenia sa musí zaslať podľa okolností, buď stavebnému dozorovi, alebo druhej strane.

9. Právne predpisy a jazyk

- 9.1. Zmluva sa bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 9.2. Pre obe zmluvné strany sú záväzné všetky platné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, Technické normy, všeobecne záväzné nariadenia a pod.
- 9.3. Ak má ktorákoľvek časť zmluvných dokumentov verzie napísané vo viac než jednom jazyku, bude mať prednosť verzia v slovenskom jazyku.
- 9.4. Jazyk pre komunikáciu je Slovenský jazyk.

10. Poradie záväznosti dokumentov

- 10.1. Dokumenty tvoriace Zmluvu je treba chápať ako vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo vrátane jej príloh,
 - b) Platné právne predpisy
 - c) Podmienky súťaže,
 - d) Ponuka predložená v súťaži.
- 10.2. Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, Oprávnená osoba konať v mene zhotoviteľa vo veciach zmluvy je povinná vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019

Podpis:

Zhotoviteľ

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:



K S
IČO:

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "C" Všeobecné zmluvné podmienky

V Zmluvných podmienkach („tieto Podmienky“), ktoré zahŕňajú tieto Všeobecné podmienky nasledujúce slová a výrazy budú mať ďalej uvedený význam pre túto zmluvu. Slová označujúce osoby alebo strany zahrňujú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné.

Žiadna zo strán nesmie postúpiť (na inú osobu) celú zmluvu/zákazku alebo jej časť, alebo akúkoľvek výhodu alebo prospech z nej.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

1. Výzva k náprave

Ak zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, môže stavebný dozor oznámením vyzvať zhotoviteľa, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom čase.

2. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

2.1 Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak zhotoviteľ:

- a) nevyhovie podčlánku Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov v časti "E" alebo nesplní výzvu podčlánku Výzva k náprave ,
- b) opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy o dielo,
- c) bez dôvodného ospravedlnenia/vysvetlenia:
 - i. nepokračuje v prácach v súlade s článkami Začatie prác, oneskorenia a prerušenie prác časti "E", alebo
 - ii. nesplní výzvu vydanú podľa podčlánkov Odmietnutie časti "E", alebo podčlánkov Opravné práce časti "E" do 28 dní po jej obdržaní,
- d) zadá celú zákazku ako subdodávku alebo časť zákazky ako subdodávku bez súhlasu objednávateľa , alebo postúpi zákazku,
- e) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo mu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo právneho konania, rokuje s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí, alebo
- f) poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
 - i. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo

- ii. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocencov alebo subdodávateľov zhotoviteľa poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu popísanú v tomto pododstavci (f). Zákonná provízia a odmena pracovníkom zhotoviteľa však neopravňuje objednávateľa k odstúpeniu od Zmluvy o dielo.
 - g) nesplní svoje záväzky vyplývajúce pre neho z ustanovení článkov Poistenie v časti "C" tejto zmluvy.
22. Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže objednávateľ so 14-dňovou výpovednou lehotou odstúpiť od Zmluvy o dielo a vypovedať zhotoviteľa zo stavby. Okrem prípadov uvedených v pododstavci (e), alebo (f) môže objednávateľ vypovedať Zmluvu okamžite. Odstúpenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musí byť písomné a nadobudne účinnosť uplynutím lehoty od jeho doručenia zhotoviteľovi alebo dorúčením výpovede zhotoviteľovi.
23. Rozhodnutie objednávateľa odstúpiť od Zmluvy neruší žiadne iné právo objednávateľa podľa tejto Zmluvy alebo iné jeho práva.
24. Zhotoviteľ je potom povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozorovi akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý vo výpovedi pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.
25. Po odstúpení môže objednávateľ dokončiť stavbu a/alebo zariadiť, aby tak urobili iné právnické osoby. Objednávateľ a tieto osoby potom môžu využiť celé vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a ďalšie projektové dokumentácie zhotovené zhotoviteľom alebo v jeho zastúpení.
26. A nedôjde k takémuto postupu objednávateľ potom oznámi, že vybavenie zhotoviteľa a dočasné práce budú vydané zhotoviteľovi na stavenisku alebo v jeho blízkosti. Zhotoviteľ urýchlene zariadi ich odstránenie na svoje riziko a náklady.

3. Ocenenie k dátumu odstúpenia

- 3.1. Čo najskôr bezodkladne, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy v časti "C" zo strany objednávateľa nadobudne účinnosť, bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "C", aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou.

4. Platba po odstúpení

- 4.1. Potom, čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa v časti "C" nadobudlo účinnosť, môže objednávateľ:
- a) postupovať v zmysle podčlánkov Nároky objednávateľa,
 - b) odmietnuť ďalšie platby zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené ceny vykonaných prác, ich dokončenie a odstránenie všetkých väd, škody spôsobené oneskorením pri dokončení (ak k nemu došlo) a všetky ďalšie náklady spôsobené objednávateľovi, a/alebo

- i obdržať od zhotoviteľa náhradu za všetky straty, ktoré znáša objednávateľ a všetky mimoriadne náklady na dokončenie prác po započítaní všetkých čiastok splatných zhotoviteľovi podľa podčlánkov Ocenenie k dátumu odstúpenia. Po obdržaní náhrady za všetky tieto straty a mimoriadne výdavky vyplatí objednávateľ zostatok zhotoviteľovi.

PRERUŠENIE PRÁC A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITEĽA

5. Oprávnenie zhotoviteľa prerušiť práce

- 5.1. Ak stavebný dozor nevydá potvrdenie v súlade s podčlánkami Vydanie potvrdenia konečnej faktúry v časti "D" alebo objednávateľ neplní podčlánkov Finančné opatrenia objednávateľa v časti "E" alebo podčlánkov Platba v časti "D", môže zhotoviteľ potom, po uplynutí 21-dňovej lehoty od doručenia oznámenia objednávateľovi prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác) do tej doby, pokiaľ zhotoviteľ neobdrží potvrdenie o platbe, dostatočný dôkaz alebo platbu, podľa okolností a podľa toho, čo stojí v oznámení.
- 5.2. Tento krok neobmedzuje nárok zhotoviteľa na pokutu podľa podčlánkov (Oneskorená platba v časti "D" a na odstúpenie podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti "C").
- 5.3. Ak zhotoviteľ následne obdrží toto potvrdenie o platbe, dôkaz alebo platbu (ako je to popísané vo vyššie uvedenom oznámení) predtým ako dá oznámenie o odstúpení, vráti sa k normálnej práci tak skoro, ak je to prakticky možné.
- 5.4. Ak zhotoviteľovi vznikne preukázateľne oneskorenie a/alebo náklady dôsledkom prerušenia prác (alebo spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty výstavby za každé takéto oneskorenie, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené, podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E" a na zaplatenie všetkých preukázateľných nákladov z toho vzniknutých.
- 5.5. Po obdržaní takýchto oznámení bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa

- 6.1. Zhotoviteľ bude oprávnený na odstúpenie od Zmluvy o dielo, ak:
 - a) objednávateľ zásadným spôsobom neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy,
 - b) predĺžené prerušenie prác má vplyv na celú stavbu tak, ako to je popísané v podčlánkoch Predĺženie prerušenia v časti "E", alebo
 - c) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zahájení konkurzného alebo právneho konania, jedná s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí.
- 6.2. Keď nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže zhotoviteľ s 30-dňovou výpovednou lehotou odstúpiť od Zmluvy o dielo. Okrem prípadov uvedených v ods. 1 písm. e) alebo f) môže zhotoviteľ vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou.

- 6.3. Odstúpenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musí byť písomné a nadobudne účinnosť uplynutím lehoty od jeho doručenia objednávateľovi alebo doručením výpovede objednávateľovi.
- 6.4. Rozhodnutie zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy o dielo neruší žiadne iné právo zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo alebo iné.

7. Ukončenie prác a odstránenie zariadení zhotoviteľa

- 7.1. Po tom, čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa v časti "C", podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti "C" alebo podčlánkov Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie v časti "C" nadobudlo účinnosť, zhotoviteľ urýchlene:
 - a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal stavebný dozor pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť na stavbe,
 - b) odovzdá dokumentáciu zhotoviteľa, technologické zariadenia, materiály a ďalšie práce, za ktoré obdržal platbu a
 - c) odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály okrem tých, ktoré sú potrebné k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.
- 7.2. Potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti "C" vstúpi do platnosti, objednávateľ urýchlene:
 - a) vráti zhotoviteľovi pomernú časť zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov,
 - b) zaplatí zhotoviteľovi v súlade s podčlánkami Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie v časti "C".

RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

8. Náhrada škody

Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a jeho personál, pacientov a návštevy a prípadne sprostredkovateľov a zaistí, aby im nevznikla škoda, v prípade akýchkoľvek nárokov, škôd, strát a výdavkov (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ

- a) súvisia s telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré preukázateľne vznikli v príčinnej súvislosti alebo z dôvodu vykonávania prác zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad, pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením Zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi
- b) sa týkajú poškodenia alebo straty akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je dielo) do tej miery, že také poškodenie alebo strata:
 - i. vzniklo, alebo prebieha, alebo je dôsledkom realizácie a ukončenia diela a odstránenia závad, a
 - ii. môže byť pripísané akémukoľvek zanedbaniu, úmyselnému skutku alebo porušeniu Zmluvy zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne sprostredkovateľmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnanou kýmkoľvek z nich a jedná sa o záležitosti, ktoré môžu byť vylúčené z poisťovacieho krytia.

9. Starostlivosť zhotoviteľa o stavbu

- 9.1 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za starostlivosť o stavbu a vybavenie od dátumu zahájenia prác až do doby, kedy je vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) preberací

protokol podľa podčlánkov Prebracie konanie v časti "E", keď zodpovednosť za starostlivosť o stavbu prejde na objednávateľa. Ak je preberací protokol vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) k etape alebo niektorej časti stavby, zodpovednosť za starostlivosť o etapu; alebo časť stavby potom prejde na objednávateľa.

- 9.2 Po tom, čo zodpovednosť podľa uvedeného prešla na objednávateľa, bude zhotoviteľ zodpovedať za dozor o všetky práce, ktoré treba vykonať ku dňu uvedenému v preberacom protokole, pokiaľ stavebný dozor nestanoví, že chýbajúce práce boli dokončené.
- 9.3 Ak stavba, vybavenie, materiály alebo dokumentácia zhotoviteľa utrpí akúkoľvek stratu alebo poškodenie behom obdobia, kedy za starostlivosť zodpovedá zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené v podčlánku 11. (Riziká objednávateľa), zhotoviteľ na vlastné riziko a náklady stratu alebo poškodenie napraviť tak, aby stavba, vybavenie, materiály a dokumentácia zhotoviteľa zodpovedali Zmluve.
- 9.4 Zhotoviteľ bude rovnako zodpovedný za všetky straty alebo poškodenia spôsobené akýmkoľvek krokom zhotoviteľa po tom, čo bol vydaný preberací protokol. Tiež bude zodpovedať za všetky straty alebo poškodenia, ktoré sa objavia po vydaní preberacieho protokolu a ktoré vznikli v dôsledku predchádzajúcich činností, za ktoré bol zhotoviteľ zodpovedný.

10. Riziká objednávateľa

Riziká, ku ktorým sa vzťahuje ďalej uvedený podčlánok 12 v tejto časti "C" sú:

- a) vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty, invázie, činnosť nepriateľov zo zahraničia,
- b) vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna v krajine objednávateľa alebo zhotoviteľa,
- c) výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než je personál zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa a subdodávateľov,
- d) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu rádioaktivitou v krajine stavby, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu, výbušniny, žiarenie alebo rádioaktivitu použil zhotoviteľ,
- e) tlakové vlny zapríčinené lietadlom alebo inými vzdušnými objektmi pohybujúcimi sa rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou,
- f) použitie alebo zabratie časti trvalého diela objednávateľom, okrem prípadov popísaných v Zmluve,
- g) projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti stavby vypracovaná zamestnancami objednávateľa alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný objednávateľ a všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený zhotoviteľ nemohol proti nim podniknúť náležité opatrenia.

11. Dôsledky rizík objednávateľa

- 11.1 Ak riziká uvedené v podčlánku 11. tejto časti "C" vedú ku stratám alebo poškodeniu stavby, vybavenia alebo dokumentácie zhotoviteľa, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne stavebnému dozorovi a napraviť túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom stavebným dozorom.
- 11.2 Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku odstraňovania tejto straty alebo poškodenia, podá zhotoviteľ stavebnému dozorovi ďalšie oznámenie a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na:

- a) predĺženie času v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude preukázateľne dokončenie oneskorené, podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E" a
 - b) zaplatenie všetkých preukázateľných nákladov, ktoré zhotoviteľovi v tejto súvislosti vznikli.
- 11.3 Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

12. Duševné a priemyselné vlastnícke práva

- 12.1 V tomto podčlánku "porušenie" znamená porušenie (alebo údajné porušenie) akéhokoľvek patentového práva, registrovanej projektovej dokumentácie, autorského práva, ochrany známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných duševných alebo vlastníckych práv súvisiacich so stavbou; a "nárok" znamená nárok (alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri obvinení z porušenia.
- 12.2 Kedykoľvek niektorá zo strán neoznámí druhej strane nárok do 28 dní po jeho vzniku, bude to považované, že sa vzdala všetkých práv na odškodnenie podľa tohto článku.
- 12.3 Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a zaistí, aby mu nevznikla ujma, v prípade akýchkoľvek nárokov, ktoré vzniknú v súvislosti s (používaním, predajom akéhokoľvek vybavenia, alebo projektovou dokumentáciou, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 12.4 Ak má strana právo na odškodnenie podľa tohto článku, povedie odškodňujúca strana (na svoje náklady) jednanie vedúce k vyriešeniu nároku a všetkých súdnych sporov alebo arbitrážneho konania, ktoré z tohto môžu vzniknúť. Druhá strana sa bude na požiadanie a náklady odškodňujúcej strany, zúčastňovať rokovaní ohľadne nároku. Táto druhá strana (a jej personál) neurobí žiadne prehlásenie, ktoré by mohlo poškodiť odškodňujúcu stranu, pokiaľ odškodňujúca strana nezanedbala vedenie nejakého rokovania, súdneho sporu alebo arbitrážneho konania, keď k tomu bola druhou stranou vyzvaná.

13. Obmedzenie zodpovednosti

- 13.1 Žiadna zo strán nebude zodpovedná druhej strane za škody z používania akéhokoľvek diela, stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá druhej strane vznikne v súvislosti so Zmluvou, inak než v súlade s podčlánkami Platba pri odstúpení v časti "C" a podčlánkov Náhrada škody) v časti „C“.
- 13.2 Celková zodpovednosť zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, iná než podľa podčlánkov Elektrina, voda a plyn v časti "E", podčlánkov Náhrada škody v časti "C" a podčlánkov Duševné a priemyselné vlastnícke práva) v časti "C", nepresiahne zmluvnú cenu.
- 13.3 Tento článok neobmedzuje zodpovednosť v prípade podvodu, úmyselného nesprávneho jednania, alebo bezohľadného počínania vinnou stranou.

POISTENIE

14. Všeobecné požiadavky na poistenie

- 14.1. V tomto článku "Poisťujúca strana" znamená, že u každého druhu poistenia je strana zodpovedná za účinnosť a udržiavanie poistenia, ktoré je špecifikované v príslušnom podčlánku. Podľa tejto zmluvy sa poisťujúcou stranou rozumie výhradne zhotoviteľ.

- 14.2. Kedykoľvek je poisťujúcou stranou zhotoviteľ, bude každé poistenie uzatvorené s poisťovateľmi za podmienok schválených objednávateľom. Vyžaduje sa hromadné poistenie, podľa ktorého bude zmluva platiť jednotlivo pre všetky poistenia, ako by pre každého z hromadne poistených bola vydaná samostatná poisťovacia zmluva.
- 14.3. Platby podľa každej poisťovacej zmluvy proti strate alebo poškodeniu budú poskytované v mene euro, požadovanej pre náhradu straty alebo škody. Platby od poisťovateľa budú použité na nápravu strát alebo škôd
- 14.4. Zhotoviteľ bude kedykoľvek na požiadanie objednávateľa predkladať objednávateľovi:
- a) dôkazy, že poistenia popísané v tomto článku sú v platnosti, a
 - b) kópie poisťovacích zmlúv pre poistenia popísané v podčlánkoch Poistenie predmetu zmluvy v časti "C" a podčlánkoch Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku v časti "C",
 - c) dôkazy o uhradení splatného poisťového,
- 14.5. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť dôkaz o splnení jeho povinností podľa podčlánkov Poistenie v časti "C" najneskôr 7 dní pred začatím prác na predmete zmluvy.
- 14.6. Každá zo strán splní podmienky uvedené v každej z poisťovacích zmlúv. Poisťujúca strana bude informovať poisťovateľa o všetkých dôležitých zmenách vo výkone prác a musí zabezpečiť, aby poistenie bolo udržiavané v súlade s týmto článkom.
- 14.7. Zhotoviteľ neuskutoční žiadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
- 14.8. Ak zhotoviteľ neuzavrie a neudrží v platnosti niektoré poistenie, ktoré má podľa Zmluvy uzavrieť a udržiavať, alebo neposkytne uspokojivé dôkazy a kópie poisťovacích zmlúv v súlade s týmto článkom, môže objednávateľ podľa svojho uváženia a bez toho aby to ovplyvnilo jeho nárok z ktoréhokoľvek iných práv alebo náhrad uzavrieť poistenie pre dôležité krytie a platbu splatného poisťového. Zmluvná cena bude podľa toho upravená o výšku týchto čiastok uhradeného poisťového. Odpočíta sa to z platieb za zmluvnú cenu.

15. Poistenie predmetu zmluvy

- 15.1. Zhotoviteľ poisť predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujúcu stavbu, na ktorej sa má stavba podľa tejto zmluvy realizovať, technologické zariadenia, materiály a dokumentáciu minimálne na pokrytie nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na demoláciu, odstránenie sutiny a odborné honoráre a ušlý zisk. Toto poistenie bude v platnosti odo dňa, v ktorom budú predložené dôkazy podľa podčlánkov Všeobecné požiadavky na poistenie v časti "C", až do doby vydania preberacieho protokolu. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním Preberacieho protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené zhotoviteľom počas iných činností (vrátane činností podľa článkov Zodpovednosť za vady v časti "E").
- 15.2. Zhotoviteľ poisť svoje zariadenia minimálne na sumu preplatenia plnej hodnoty zariadení, vrátane dodávky na stavenisko. Pre každú časť zariadení zhotoviteľa musí byť poistenie účinné, a to v priebehu doby, keď sú dopravované na stavenisko až do doby, keď už nie je viac potrebné ako zariadenie zhotoviteľa.
- 15.3. Pokiaľ nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podľa tohto článku:
- a) bude uzatvorené a udržiavané zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,

- b) bude kryť všetky straty a škody z akýchkoľvek príčin neuvedených v podčlánkov Riziká objednávateľa v časti "C"),
 - c) bude tiež kryť stratu alebo poškodenie spôsobené na časti stavby, ktoré možno pripísať tomu, že objednávateľ používa alebo obsadil inú časť stavby a straty alebo škody od rizík uvedených v podčlánkoch Riziká objednávateľa v časti "C", mimo rizík, ktoré sú nepoistiteľné za obchodne prijateľných podmienok, s odpočítateľnými položkami za vznik poistných udalostí, ktorých s týka výluka poistenia,
 - d) bude zahŕňať poistenie stavby ako takej proti škodám z vyššej moci, vandalizmu a krádeže.
- 15.4 Ak uplynie viac ako jeden rok od základného dátumu, prestane byť poistenie popísané vyššie v ods. 4 písm. d) k dispozícii za prijateľných obchodných podmienok, oznámi to zhotoviteľ (ako poisťujúca strana) objednávateľovi, spolu s podrobnými údajmi. Objávateľ potom bude mať podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" nárok na zaplatenie sumy, ktorá je ekvivalentná k týmto komerčne primeraným podmienkam, a akú by mal zhotoviteľ očakávať, že bude zaplatená za poistenie, a pokiaľ nezaistí toto poistenie za prijateľných obchodných podmienok, že súhlasí s vypustením podľa podčlánkov Všeobecné požiadavky na poistenie časti "C".

16. Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku

- 16.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť pred nástupom na stavenisko poistnú zmluvu na poistenie proti jeho zodpovednosti každej strany za stratu, poškodenie, smrť alebo telesnú ujmu, ktoré by mohlo postihnúť fyzický majetok (s výnimkou vecí poistených podľa podčlánkov Poistenie predmetu zmluvy v časti "C", alebo niektorú osobu (s výnimkou osôb poistených podľa podčlánkov Poistenie zamestnancov zhotoviteľa v časti C, ktoré môže vzniknúť z plnenia Zmluvy zhotoviteľom, ku ktorému došlo pred vydaním Protokolu o vyhotovení diela.
- 16.2. Toto poistenie bude uzatvorené pre maximálne poistné plnenie na jednu udalosť, so žiadnym obmedzením na počet poistných udalostí.
- 16.3. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia špecifikované v tomto článku:
- a) budú účinné a udržiavané zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,
 - b) budú v spoločnom mene oboch strán,
 - c) budú rozšírené na krytie zodpovednosti za všetky straty a poškodenia na majetku objednávateľa (s výnimkou vecí poistených podľa podčlánkov Poistenie predmetu zmluvy v časti "C", ktoré vznikli pri realizácii stavby, a
 - d) môžu však vyňať zodpovednosť v rozsahu, ktorý vznikne z:
 - i. práva objednávateľa mať vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a vlastníť tento pozemok pre trvalé dielo,
 - ii. príčiny uvedenej v článkoch Riziká objednávateľa v časti "C", s výnimkou prípadov kedy je krytie dostupné za rozumných obchodných podmienok.

17. Poistenie zamestnancov zhotoviteľa

- 17.1. Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať poistenie zodpovednosti za poškodenia, straty a výdavky (vrátane správnych poplatkov a výdavkov), ktoré vzniknú zo zranenia, ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u zhotoviteľa alebo kohokoľvek iného, zo zamestnancov zhotoviteľa.
- 17.2. Objávateľ a stavebný dozor budú tiež odškodnení na základe poistnej zmluvy, s výnimkou prípadu, že toto poistenie môže vylučovať straty a nároky v rozsahu, ktorý vznikne z činnosti alebo nedbalosti objednávateľa alebo personálu objednávateľa.

- 17.3. Poistenie bude udržiavané v platnosti a s účinnosťou počas celej doby, kedy sa tento personál zúčastní realizácie stavby. Poistenie zamestnancov subdodávateľa môže uzavrieť subdodávateľ, ale zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržanie tohto článku.

VYŠŠIA MOC

18. Vyššia moc

Vyššia moc môže zahŕňať, avšak neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo okolnosti, uvedené nižšie ak sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d):

- a) vojna, vojnový stav (či bola alebo nebola vojna vyhlásená), invázia, činnosť cudzích nepriateľov,
- b) vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojená alebo uchvatiteľská sila, alebo občianska vojna v krajine, .
- c) nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako je personál zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa a subdodávateľov,
- d) vojnové streľivo, výbušný materiál, materiál vyžarujúci rádioaktivitu alebo kontaminovaný rádioaktivitou, s výnimkou, keď je používanie streľiva, výbušného materiálu, rádioaktívnych látok možné pripísať zhotoviteľovi,
- e) prírodné katastrofy, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická činnosť.

19. Oznámenie o vyššej moci

- 19.1. Ak sa niektorej zo strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 5 pracovných dní potom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc preukázateľne bráni v ich vykonávaní.
- 19.2. Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto článku, vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosti jednej strany vykonať platby druhej strane na základe Zmluvy.

20. Povinnosť minimalizovať oneskorenie

- 20.1. Každá strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri výkone svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
- 20.2. Strana podá oznámenie druhej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.

21. Dôsledky vyššej moci

- 21.1. Ak sa zhotoviteľovi bráni vo vykonávaní niektorých jeho povinností podľa Zmluvy z dôvodu vyššej moci, čo oznámil podľa podčlánkov Oznámenie o vyššej moci v časti "C" a vznikne mu oneskorenie a/alebo náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, zhotoviteľ má nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty výstavby za takéto oneskorenie, pokiaľ dokončenie je alebo bude oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu, podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E".
- 21.2. Po obdržaní tohto oznámenia bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

22. Vyššia moc ovplyvňujúca subdodávateľa

Ak ktorýkoľvek z subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, vzťahujúcej sa na dielo na úľavu v dôsledku vyššej moci za podmienok dodatočných alebo obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku, takéto dodatočné alebo rozsiahlejšie prípady alebo okolnosti vyššej moci nezbavia zhotoviteľa jeho povinností, alebo ho neoprávňujú na úľavu podľa tohto článku.

23. Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie

- 23.1. Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená podľa podčlánkov Oznámenie o vyššej moci v časti "C" realizácii v zásade celej rozostavenej stavby po nepretržitú dobu 84 dní, alebo pri viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dĺžka činí viac ako 140 dní, z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci, potom môže jedna strana dať druhej oznámenie o odstúpení od Zmluvy. V tom prípade bude ukončenie platné po 7 dňoch po podaní oznámenia, a zhotoviteľ bude postupovať v súlade s podčlánkami Ukončenie prác a odstránenie zariadení zhotoviteľa.
- 23.2. Pri takom ukončení určí stavebný dozor hodnotu vykonaných prác a vydá potvrdenie faktúry, ktorá bude obsahovať:
- sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve;
 - náklady na technologické zariadenia a materiály objednané pre stavbu, ktoré boli dodané zhotoviteľovi, alebo ich dodávku je zhotoviteľ povinný prijať: Tieto technologické zariadenia a materiály sa stávajú majetkom (a rizikom) objednávateľa, až za ne objednávateľ zaplatí, a zhotoviteľ ho dá k dispozícii objednávateľovi;
 - všetky ďalšie náklady alebo záväzky, ktoré za daných okolností vznikli zhotoviteľovi v snahe dokončiť práce;
- 23.3. Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto článku, ak vznikne akákoľvek udalosť alebo okolnosť vymykajúca sa kontrole strán (vrátane vyššej moci, ale neobmedzujúc sa len na ňu), ktorá znemožňuje jednej alebo obovom stranám plnenie jej alebo ich zmluvných povinností, alebo ich robí nezákonnými, alebo ktorá na základe právnych predpisov, ktorými sa riadi Zmluva, oprávňuje strany na uvoľnenie z ďalšieho plnenia Zmluvy, potom po oznámení takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej strane:
- strany budú zbavené ďalšieho plnenia bez poškodenia práv niektorej strany s ohľadom na predchádzajúce nedodržanie Zmluvy, a
 - suma splatná objednávateľom zhotoviteľovi bude v rovnakej výške, aká by bola bývala splatná podľa podčlánkov Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie, ak by bola Zmluva ukončená podľa podčlánkov Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy

24. Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov.

- 24.1 Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov“) minimálne vo výške rovnajúcej sa **10 000,00 € (desaťtisíc eur)** prostredníctvom bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, a to najneskôr **do 10 dní od doručenia ním podpísanej tejto Zmluvy verejnému obstarávateľovi.**

- 24.12 V prípade, že nedôjde k odovzdaniu staveniska do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy z dôvodu, že objednávateľ podal, resp. podá žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, resp. dotácie a jej schválenie je podmienkou k následnému financovaniu stavebného diela, alebo to neumožnia dlhodobovo vhodné klimatické, resp. poveternostné podmienky pre realizáciu, môžu zmluvné strany pristúpiť k rokovaniu o dočasnom vrátení zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov a to až do termínu odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný ku dňu odovzdania staveniska opätovne zložiť zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10 000,00 € (desaťtisíc eur), ktorá mu bola dočasne vrátená. Zhotoviteľ bude písomne objednávateľom zároveň s pozvánkou na prevzatie staveniska vyzvaný na opätovné zloženie zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov a to v lehote 10 (desiatich) pracovných dní pred dňom určeným objednávateľom ako riadny termín odovzdania staveniska. V prípade, že zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov v tomto termíne nepredloží, bude sa táto skutočnosť považovať za akt zmarenia odovzdania staveniska. Náhradný termín na odovzdanie a prevzatie staveniska bude objednávateľom určený až po zložení zábezpeky na splnenie zmluvných záväzkov, pričom lehota, ktorá uplynie medzi riadnym termínom a náhradným termínom odovzdania staveniska bude na úkor lehoty výstavby stavebného diela (lehota výstavby začína plynúť dňom zhotoviteľom zmareného aktu odovzdania a prevzatia staveniska).
- 24.13 Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy, kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.
- 24.14 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle zábezpeky na vykonanie prác vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:
- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť zábezpeky na vykonanie prác tak, ako je to opísané v predchádzajúcom odseku; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú čiastku zábezpeky na vykonanie prác,
 - b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi oprávnenú čiastku a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom alebo stanovenú podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" alebo podľa článkov Požiadavky, spory a rozhodcovské konanie v časti "C", do 42 dní po tomto odsúhlasení alebo rozhodnutí,
 - c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
 - d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa v časti "C" a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.
- 24.15 Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania zábezpeky na vykonanie prác v rozsahu, na ktorý objednávateľ nemal nárok.
- 24.16 Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác zhotoviteľovi najneskôr do 21 dní potom, ako obdrží kópiu Protokolu o vyhotovení diela s uvedením, že dielo bolo zrealizované bez väd a nedorobkov.

ZMLUVNÉ SANKCIE

25. Zmluvné sankcie

- 25.1. Ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s dodaním predmetu zmluvy alebo jeho vybratých častí oproti schválenému harmonogramu podľa článkov Harmonogram prác v časti "E" alebo lehoty výstavby podľa článku IV. Lehota výstavby v časti "A" tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela (bez DPH) za každý deň oneskorenia, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokončenie a odovzdanie diela a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác pokiaľ neprekročí 10 dní, 0,05 % pri prekročení 10 dní do 20 dní nad 20 dní 0,2 %, až do splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tým nie dotknutý prípadný nárok objednávateľa na odškodnenie alebo na náhradu škody.
- 25.2. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa tejto zmluvy je oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.
- 25.3. Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi v lehotách stanovených v tejto zmluve doklad o poistení jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v článkoch Poistenie v časti "C" tejto Zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu až do výšky 5 % ponúkanej ceny diela, alebo jeho časti, k poisteniu ktorej si zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 25.4. Ak zhotoviteľ nezabezpečí poistenie jeho zodpovednosti podľa tejto Zmluvy od prevzatia staveniska až do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na požiadanie objednávateľa o tom v stanovenom termíne nepredloží dôkaz má objednávateľ právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 5 % ponúkovej ceny diela, alebo jeho časti, k poisteniu ktorej si zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 25.5. Ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve, je zhotoviteľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania až do prevzatia staveniska.

POŽIADAVKY, SPORY

26. Požiadavky zhotoviteľa

- 26.1. Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty pre dokončenie stavby a/alebo na dodatočnú platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto Podmienok, alebo nak podľa Zmluvy, oznámi to zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi s popisom skutočnosti alebo okolnosti, za ktorých vznikol tento nárok. Oznámenie musí podať stavebnému dozorovi najskôr ako je to možné, ale nie neskôr ako 14 dní po tom, čo sa zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o vzniku udalostí alebo okolností. Oznámenie musí obsahovať minimálne : názov diela/zákazky, zmluvu o dielo na základe ktorej sa zákazka realizuje, opis rozhodujúcich skutočností o ktorých sa zhotoviteľ domnieva že má nárok na predĺženie lehoty na dokončenie stavby, dátum a podpis zhotoviteľa.
- 26.2. Ak zhotoviteľ nepredloží oznámenie o nároku v lehote 14 dní, čas dokončenia stavby sa nesmie predĺžiť, zhotoviteľ nesmie mať nárok na dodatočnú platbu a objednávateľ

- bude zbavený celkovej zodpovednosti v súvislosti s nárokom. Inak budú platiť nasledujúce ustanovenia tohto podčlánku.
- 26.3. Zhotoviteľ predloží ďalšie dôkazy podporujúce dôvody pre nárok, všetko vzťahujúce sa k danej skutočnosti či okolnosti.
- Zhotoviteľ bude uchovávať všetky vedené záznamy, ktoré by mohli byť dôležité pre zdôvodnenie nároku, a to buď na stavenisku alebo na iných miestach, prijateľných pre stavebného dozora. Bez toho, aby sa tým objednávateľ zaväzoval, môže stavebný dozor potom, čo obdržal oznámenie podľa tohto podčlánku skontrolovať vedenie záznamov a/alebo uložiť zhotoviteľovi, aby viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ umožní stavebnému dozorovi, aby preveril všetky tieto záznamy a keď je o to požiadaný odovzdá stavebnému dozorovi ich kópie.
- 26.4. Do 21 dní potom, čo sa zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o udalosti alebo okolnosti, z ktorých vyplýva nárok, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá zhotoviteľom a schválená stavebným dozorom, predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi nárok so všetkými podrobnosťami, so všetkými podrobnými argumentmi, na ktorých sa zakladá nárok na predĺženie lehoty a/alebo dodatočnú platbu. Ak udalosť alebo okolnosť z ktorých vzniká nárok pokračuje,:
- tento podrobný nárok bude považovaný za predbežný,
 - zhotoviteľ je povinný zasielať ďalšie predbežné nároky v mesačných intervaloch; udá v nich nazhromaždené oneskorenie a/alebo požadovanú časť a ďalšie podrobnosti, ktoré môžu byť stavebným dozorom požadované a
 - zhotoviteľ zašle konečný nárok do 14 dní po skončení dôvodov, vyplývajúcich zo skutočnosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá zhotoviteľom a schválená stavebným dozorom a objednávateľom.
- 26.5. Do 21 dní po obdržaní nároku alebo ďalších podrobností, ktoré podporujú predchádzajúci nárok, alebo v inej lehote, ktorá bola navrhnutá stavebným dozorom a schválená zhotoviteľom, zašle stavebnému dozorovi svoj súhlas alebo nesúhlas s podrobným komentárom. Môže si tiež vyžiadať ďalšie nutné podrobnosti, avšak musí dať svoje stanovisko k zásadám nároku v danom čase.
- 26.6. Každé potvrdenie faktúry bude obsahovať časti za všetky nároky, ktoré boli opodstatnené podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Pokiaľ a pokým dodané poskytnuté doklady nie sú postačujúce k tomu, aby zdôvodnili celý nárok, má zhotoviteľ nárok iba na zaplatenie takej časti požiadavky, ktorú by bol schodný preukázať.
- 26.7. Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E", aby odsúhlasil alebo určil (i) predĺženie lehoty výstavby (pred jej vypršaním alebo po ňom) v súlade s podčlánkami Predĺženie lehoty výstavby v časti "E" a/alebo (ii) dodatočnú platbu (ak vôbec), na ktorú má zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy.
- 26.8. Požiadavky tohto podčlánku sa pridávajú k požiadavkám uvedených v iných podčlánkoch, ktoré je možné použiť pre nárok. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní tento alebo iný podčlánok v súvislosti s nárokom, predĺženie lehoty výstavby a/alebo dodatočná platba vezmú do úvahy rozsah (pokiaľ existuje), a kým nesplnenie bránilo v riadnom vyšetrovaní nároku, ak ale nárok nie je vyňatý na základe druhého odstavca tohto článku.

27. Spory

- 27.1. Všetky spory, ktoré prípadne vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, ako aj zo súvisiacich právnych vzťahov (vrátane zodpovednostných právnych vzťahov), sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým mimosúdnou dohodou, akceptovateľnou oboma zmluvnými stranami.

- 27.2. Ak sa spor nepodarí vyriešiť mimosúdne, zmluvné strany dohodli, že takýto spor budú riešiť súdnou cestou v zmysle platných právnych predpisov.

DORUČOVANIE PÍ SOMNOSTÍ

28. Doručovanie písomností

- 28.1. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi odberateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v štátnom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti a bude sa uskutočňovať formou doporučených poštových zásielok, zápisníc a záznamov.
- 28.2. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
- 28.3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa budú zasielať na adresu sídla adresáta, uvedenú v tejto zmluve alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, bude sa považovať za doručенú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.
- 28.4. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy budú považovať za doručенé aj okamihom ich osobného odovzdávania fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak druhá strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.
- 28.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi odberateľom a poskytovateľom sa môže uskutočniť aj elektronickou poštou, alebo faxom (elektronické prostriedky) a to na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Takéto písomnosti ale musí zmluvná strana odoslať aj doporučenou poštovou zásielkou, najneskôr do dvoch kalendárnych dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami. Ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

29. Záverečné ustanovenia

- 29.1. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka v platnom znení.
- 29.2. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto Zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
- 29.3. V prípade sporu platí znenie platnej a účinnej Zmluvy.
- 29.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma

zmluvnými stranami a až následne prípadným postupom podľa podčlánkov Spory v časti "C" tejto Zmluvy.

29.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a) Poskytovateľ finančnej podpory alebo finančnej dotácie a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "D" Cena diela a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre túto zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže zhotoviteľ domáhať zvýšenia ceny jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy nemožno považovať tie, o ktorých bol zhotoviteľ informovaný pred uzavretím zmluvy, alebo si ich mohol overiť alebo zistiť z tých o ktorých bol informovaný, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy ich mohol predvídať alebo predpokladať z tých, o ktorých bol informovaný. Toto bolo okrem iného aj zistiteľné, alebo okrem iného aj predvídateľné zo všetkých poskytnutých dokladov, dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, alebo mieste realizácie predmetu zmluvy, verejne prístupných informácií okrem iného aj na internete a podobne.
2. Ak nie je v zmluvných podmienkach uvedené inak:
 - a) zmluvná cena je stanovená podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako víťaza verejného obstarávania, ako cena maximálna, a je uvedená v podčlánku III Zmluvná cena, časti "A" zmluvy o dielo.
 - b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou o dielo, napr. v prípade, že niektoré práce alebo dodávky nebudú realizované.
 - c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom okrem prípadov uvedených v podčlánku 2. tejto časti zmluvy (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien).
 - d) Pokiaľ nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrýva akceptovaná zmluvná cena stavby všetky požiadavky zhotoviteľa podľa Zmluvy (vrátane cien, ak existujú) a všetky veci potrebné pre správne vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie všetkých väd. Zhotoviteľ mal možnosť pred predložením cenovej ponuky oboznámiť sa so skutočnosťami na tvare miesta a ich vplyv premietnuť do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyužil, toto nemôže byť neskôr na ťarchu objednávateľa, alebo požiadavkou na dodatočné navýšenie zmluvnej ceny.
3. **Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych zmien**
 - 3.1. Zmluvná cena bude upravená tak, aby brala do úvahy všetky zvýšenia alebo zníženia nákladov vyplývajúcich zo zmien v legislatíve krajiny alebo zo súdnych alebo oficiálnych výkladov tejto legislatívy, ku ktorým došlo po základnom dátume a ktoré ovplyvňujú zhotoviteľa pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy o dielo.
 - 3.2. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo mu vznikajú (alebo vzniknú) dodatočné náklady v dôsledku týchto zmien v legislatíve alebo v jej výklade po základnom dátume, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia, ak je alebo bude dokončenie oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.

33. Pri vzniku takejto skutočnosti budú zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom.

4. Ponúknuté ceny budú počas trvania zmluvy pevné/nemenné a celková cena maximálna. Zhotoviteľ prehlasuje že jeho ponuková cena, t.j. cena diela obsahuje aj :
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a ostatného vybavenia Zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, tlače a kopírovania, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov), na prenájom pozemku na zariadenie staveniska, ktoré si zriadi zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby, náklady na vypracovanie geometrických plánov celej stavby a jednotlivých stavebných objektov,
 - náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov Zhotoviteľa proti odcudzeniu počas Lehoty výstavby, vrátane nákladov na strážnu službu,
 - náklady na provizórne oplotenie staveniska, resp. objektov, kde sa realizujú práce podľa dohody s prevádzkovateľom Objednávateľa,
 - náklady na podrobné vytýčenie diela Zhotoviteľom,
 - náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov,
 - zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení (okrem stavebného povolenia) pred zahájením prác vrátane poplatkov,
 - všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
 - náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
 - náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku, vrátane poplatkov za zneškodnenie nebezpečného odpadu do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
 - náklady na rezanie asfaltobetónových alebo betónových komunikácií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke,
 - náklady na znovuzriadenie komunikácií vrátane všetkých potrebných prác vrátane zarovnania styčnej plochy podkladu komunikácie,
 - náklady na nakládku/vykládku a odvoz vyburaného materiálu, sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
 - náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
 - náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr. lešenie, podoprenie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh vrátane prípadného použitia štetovnicových stien,
 - náklady na ďalšie dočasné práce priamo neuvedené vo formulároch (napr. dočasné obchádzky, premostenia výkopov ľahkými alebo ťažkými premosteniami, opravy miestnych komunikácií a mostov, poľných ciest a nehnuteľností poškodených

- stavebnou činnosťou, preložky autobusových zastávok, dočasný zásyp ryhy štrkodrovou alebo obalovaným kamenivom (poľa požiadaviek správcu cesty) pred jej konečnou spätnou úpravou) a pod.,
- všetky náklady na dodávku a montáž výrobkov a zariadení, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály bez ohľadu na to či je „dodávka a montáž“ vo výkazoch výmer uvedená alebo nie,
 - náklady na stratné,
 - náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov Zhotoviteľa,
 - náklady na čiastočné uzavretie a užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
 - náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
 - náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie odpadov,
 - náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,
 - náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov, preložiek autobusových staníc,
 - náklady na dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody v tokoch, jestvujúcich objektoch stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,
 - náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia vrátane nákladov na realizovanie čerpacích studní, dodávky čerpadiel, výtlačných potrubí, drenážnych potrubí a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vrátane nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
 - náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia Objednávateľom,
 - náklady na výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
 - všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod.
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
 - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
 - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane čistenia komunikácií,
 - náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,

- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vrátane vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy a s tým súvisiace poplatky,
 - všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác,
 - všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie prác.
 - náklady na likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov,
 - náklady na vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami uvedenými v zmluve,
 - náklady na vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu individuálnych a komplexných skúšok, vrátane nákladov na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení na Technickej inšpekcii, resp. inej oprávnenej osoby,
 - náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných prehliadok, revízií (vrátane prvej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení) vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
 - náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany (napr. odolnosť všetkých materiálov, dverí, náklady súvisiace s deklarovaním výdatnosti hydrantov, požiarne prepážky a pod.), náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov podľa projektu PO,
 - všetky náklady na činnosti, práce a dodávky vyplývajúce z dokladov súťaže
 - všetky náklady na činnosti, práce a dodávky, ktoré mohol zhotoviteľ vzhľadom na svoju odbornosť a praktické skúsenosti, ktoré sa vyžadujú pri druhu a rozsahu diela ako je toto, predpokladať, predvídať, alebo si ich mohol akýmkoľvek iným spôsobom zistiť.
 - všetky náklady na podklady pre vypracovanie/dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 - všetky náklady na vypracovanie/dopracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ako i na jej publikáciu (tlač a pod.)
- a to bez ohľadu na skutočnosť či tieto činnosti sú samostatne uvedené alebo nie v rozpočtoch (Fakturačný formulár, Formulár špecifikácie položiek). V prípade, že sa vo formulári špecifikácie nenachádza položka, ktorá zodpovedá požiadavkám na ocenenie z prioritnej grafickej (výkresovej) časti súťažných podkladov, má sa za to, že prislúchajúca cena je premietnutá do ceny súvisiacej položky (napr. príplatky k základnej cene) alebo je rozložená rovnomerne vo všetkých ostatných jednotkových cenách a sadzbách.

5. Má sa za to, že zisk, režijné náklady, prevádzkové náklady a potrebné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách.
6. Ponuková cena, t.j. cena diela je rozpísaná v rozpočte zhotoviteľa nazvanom ako "Fakturačný formulár", ktorý tvorí prílohu tejto časti "D" Zmluvy o dielo. Pokiaľ sa v

zmluve vyskytuje slovné spojenie fakturačný rozpočet, jedná sa o rozpočet "Fakturačný formulár".

7. Formulár špecifikácie položiek slúžil v rámci súťaže na kontrolu prípadných neúmerne nízkych cien, a v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu na určenie hodnoty nerealizovanej časti pre vzájomné vyrovnanie.

8. Právo fakturácie

8.1. Právo fakturácie za predmet zmluvy má Zhotoviteľ len za ukončené fakturačné celky (vrátane preukázania príslušných kvalitatívnych parametrov ako je vykonanie všetkých príslušných skúšok a predloženie ich listinných dôkazov, a podobne)

8.2. Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti aj podľa zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (v platnom znení). Musí byť objednávateľovi doručená v 6 rovnopisoch, pričom musí obsahovať :

- Meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby/ objednávateľa/ Prijímateľa,
- meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne dodávateľa/zhotoviteľa ktorý dodáva tovar alebo službu,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- číslo faktúry,
- dátum, keď bol tovar, práca alebo služba dodaná alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- lehota splatnosti faktúry (v závislosti od systému platieb),
- číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa projektovej dokumentácie),
- IČO a DIČ/IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa,
- IČO a DIČ objednávateľa
- názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa,
- číslo bankového účtu objednávateľa/Prijímateľa,
- číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa,
- množstvo a druh dodaného tovaru, prác alebo rozsah a druh dodanej služby (podľa fakturačného formulára),
- výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
- sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
- výšku dane spolu v EUR,
- podpis zodpovednej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa.

8.3. K faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy :

- a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu fakturačným formulárom je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom stavebného dozora, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo.

- b) Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s fakturačným rozpočtom,
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných odávateľom/zhotoviteľom v súlade s fakturačným rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravených dodatkom k ZoD, musia byť „upravené“ časti vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k ZoD;
- c) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi ako napr. meranie výškového a priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných sústav (exteriér aj interiéry), merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla (tam kde to príslušne legislatíva vyžaduje), merania strát v elektrických rozvodoch, merania elektrických izolačných odporov, merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania podloží pod spevnené plochy merania vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.
- d) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným dozorom
- e) V prípade fakturácie aj odvozu a likvidácie odpadu, doklad o likvidácii príslušného odpadu
- f) certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudované tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže že boli dodané a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov.
- g) V prípade fakturácie tých častí, ktoré boli zhotovené subdodávateľom, doklad o práve fakturácie zhotoviteľom, a to doklad o odovzdaní a prevzatí predmetnej časti medzi zhotoviteľom a jeho subdodávateľom, podpísaný štatutárnymi zástupcami jednotlivých strán. V prípade splnomocnených osôb aj platné splnomocnenia na tieto osoby.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať objednávateľovi alebo koordinátorovi projektu na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe.

9. Platba

9.1. Čas plnenia peňažného záväzku je: do 90 dní odo dňa vystavenia faktúry

- Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa ukončenia osobitnej prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie.
- Dohodou podľa §340b ods.4 zákona č.9/2013Z.z. sa stanovuje dĺžka lehoty na prehliadku na 60 dní (prehliadka má dve časti: administratívna časť a kontrola na mieste)
- V prípade, že sa nebude uplatňovať osobitná prehliadka, lehota splatnosti je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry

9.2. Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v Zmluve o dielo.

10. Oneskorená platba

10.1. Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkami Platba v časti "D" má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške špecifikovanej v podčlánkoch Zmluvné sankcie v časti "C". Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom platby špecifikovaným v podčlánkoch Platba v časti "D" bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.

11. Konečný súpis prác

11.1. Do 14 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ stavebnému dozorovi 4 rovnopisy konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktorý bude vyjadrovať:

- a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu uvedenému v preberacom protokole
- b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné a
- c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené oddelene.

11.2. Stavebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade s podčlánkami Vydanie potvrdenia konečnej faktúry v časti "D".

12. Žiadosť o potvrdenie konečnej faktúry

12.1. Do 14 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, zhotoviteľ odovzdá stavebnému dozorovi 4 rovnopisy návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej stavebným dozorom:

- a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo
- b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo alebo inak.

12.2. Ak stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných prác alebo ju nemôže overiť, oznámi zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké stavebný dozor odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá stavebnému dozorovi konečný súpis vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác.

12.3. Ak sa po diskusiách medzi stavebným dozorom a zhotoviteľom o všetkých zmenách v návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor, odovzdá stavebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu konečného súpisu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu zhotoviteľovi). Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši podľa podčlánkoch Rozhodcovská doložka v časti "C" zhotoviteľ pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu stavebnému dozorovi).

13. Prehlásenie o splnení záväzkov

13.1. Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží zhotoviteľ písomné prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.

14. Vydanie potvrdenia konečnej faktúry

14.1. Vzhľadom na malý rozsah predmetu zákazky, touto zmluvou sa neuplatňuje vydanie potvrdenia konečnej faktúry

15. Ukončenie záväzkov objednávateľa

15.1. Objednávateľ nebude zaviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác inak, než záväzkami vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne zhotoviteľ neuplatní nárok:

- a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež
- b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v podčlánkoch Konečný súpis prác v časti "D".

15.2. Tento článok však neobmedzuje záväzky objednávateľa v akomkoľvek prípade podvodu, úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany objednávateľa.

16. Mena platieb

16.1. Zmluvná cena bude vyčíslená a uhradená v eurách (€).

17. Prílohy :


- Fakturačný formulár - ako vyplnené a doplnené formuláre z podmienok súťaže a tejto zmluvy o dielo
- formuláre špecifikácie položiek - ako vyplnené a doplnené formuláre z podmienok súťaže a tejto zmluvy o dielo

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:

FAKTURAČNÝ FORMULÁR

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ceny uvedené v prílohe tejto časti, zhotoviteľ v čase ich zostavovania spočítal a uviedol s náležitou starostlivosťou s využitím svojich odborných a praktických skúseností pri realizácii zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru a zahŕňajú všetky náklady na realizáciu zákazky v zmysle podmienok tejto Zmluvy o dielo, ako i podmienok v rámci súťaže (ako napr. Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady vrátane ich príloh bez ohľadu na skutočnosť či sa jedná o textové alebo grafické informácie, Prípadné vysvetlenia v súťaži v zmysle zákona a vlastné merania v rámci obhliadky staveniska). Príloha tabuľková časť je vo formáte s textáciou a obsahom podľa formulára poskytnutého v súťaži, a doplnená a spracovaná zhotoviteľom v zmysle podmienok súťaže a Zmluvy o dielo

Tento fakturačný formulár má .. 1 .. strán príloh.

Prílohy : Fakturačný formulár tabuľková časť 1 x v tlačenej podobe a 1x v elektronickej vo formáte MS Excel (-.xls), alebo kompatibilnom s formátom MS Excel (-.xls)

V Prešove, dňa 12.10.2018

.....
zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves
Fakturačný formulár

P.č.	Názov fakturačného celku	Špecifikácia fakturačného celku	Počet MJ	Celková cena (EUR) bez DPH	Celková cena DPH	Celková cena spolu s DPH
1	Fakturačný celok 1	Obsahuje činnosti uvedené vo formulári: Špecifikácia položiek - fakturačný celok č.1: Lokalita č. 1 - Oddychová zóna	1	118 147,28	23 629,46	141 776,74
2	Fakturačný celok 2	Obsahuje činnosti uvedené vo formulári Špecifikácia položiek - fakturačný celok č.2: Lokalita č. 2 - Detské ihrisko	1	137 665,17	27 533,03	165 198,20
3	Fakturačný celok 3	Obsahuje činnosti uvedené vo formulári Špecifikácia položiek - fakturačný celok č.3: Lokalita č. 2 - Chodník	1	19 720,97	3 944,19	23 665,16
4	Fakturačný celok 4	Obsahuje činnosti uvedené vo formulári Špecifikácia položiek - fakturačný celok č.4: - Lokalita č. 3 Oddychovo športová zóna	1	133 153,57	26 630,71	159 784,28
5	Fakturačný celok 5	Obsahuje činnosti uvedené vo formulári Špecifikácia položiek - fakturačný celok č.5: - Elektromontážne práce	1	46 366,66	9 273,33	55 639,99
Spolu:				455 053,65	91 010,73	546 064,38

Zhotoviteľ : Ing. Viliam Čech

Dátum : 17.9.2018

Pečiatka, podpis :

tel.: 051/7710 088

FORMULÁR ŠPECIFIKÁCIE POLOŽIEK

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ceny a množstvá uvedené v prílohe tejto časti, zhotoviteľ v čase ich zostavovania spočítal na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska a uviedol ich s náležitou starostlivosťou s využitím svojich odborných a praktických skúseností pri realizácii zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru, a pričom sú množstvami ako i cenami reálne. Sú spracované a uvedené ako vyplývajú z podmienok tejto Zmluvy o dielo, ako i podmienok v rámci súťaže (ako napr. Výzva na predkladanie ponúk, Súťažné podklady vrátane ich príloh bez ohľadu na skutočnosť či sa jedná o textové alebo grafické informácie, Prípadné vysvetlenia v súťaži v zmysle zákona a vlastné meranie v rámci obhliadky staveniska). Prílohy tabuľková časť sú vo formáte s textáciou a obsahom podľa formulára poskytnutého v súťaži, a doplnené a spracované zhotoviteľom v zmysle podmienok súťaže a podmienok Zmluvy o dielo.

Tento formulár špecifikácie položiek má .. 5 .. príloh, a .. 18 .. strán príloh.

Prílohy : Formuláre špecifikácií položiek tabuľková časť 1 x v tlačenej podobe a 1x v elektronickej vo formáte MS Excel (-.xls), alebo kompatibilnom s formátom MS Excel (-.xls)

V Prešove, dňa 12.10.2018

.....
zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 1

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
Lokalita č. 1 - Oddychová zóna					118 147,28
HSV - Práce a dodávky HSV					115 107,76
	1 - Zemné práce				29 230,17
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	81,000	5,05	409,05
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	81,000	0,90	72,90
3	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	13,520	30,60	413,71
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,210	21,20	661,65
5	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	31,210	6,00	187,26
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	125,560	0,50	62,78
7	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	125,560	0,50	62,78
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	125,560	1,50	188,34
9	Založenie trávnik parkového v rovine	m2	1 603,480	3,18	5 099,07
10	<i>Trávové semeno - výber</i>	kg	52,857	10,99	580,90
11	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	270,220	0,65	175,64
12	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 603,480	1,64	2 629,71
13	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 603,480	0,07	112,24
14	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 603,480	0,03	48,10
15	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	21,000	7,12	149,52
16	<i>Katalpa bignoniova</i>	ks	5,000	137,60	688,00
17	<i>Ovocný strom - čerešňa, jabloň</i>	ks	8,000	84,20	673,60
18	<i>Jarabina - Sorbus</i>	ks	8,000	15,40	123,20
19	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	7,000	7,05	49,35
20	<i>Lipa - Tilia cordata alt. listnatý strom stredného vzrastu</i>	ks	7,000	102,50	717,50
21	Zakotvenie drevin troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	168,000	9,22	1 548,96
22	<i>Kolové konštr.</i>	ks	168,000	6,30	1 058,40
23	Výsadba živého plota do vopred vyhlbenej ryhy so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevin s balom	m	100,000	28,54	2 854,00
24	<i>Krušpan</i>	ks	515,000	15,33	7 894,95

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 1

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
25	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom hniezdovo	m2	1 873,650	1,11	2 079,75
26	Chemické odburinenie trávnik Bofix, alebo ekvivalent	l	15,010	45,89	688,81
	2 - Zakladanie				2 570,94
27	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	270,220	0,30	81,07
28	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	12,600	40,58	511,31
29	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,760	144,00	973,44
30	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	6,980	144,00	1 005,12
	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie				644,81
31	X Priplatok za zaoblenie muriva s vnútorným polomerom pôdorysu	m3	1,480	31,56	46,71
32	X Murivo obkladové režné z kameňa lomársky upraveného tr.I, kyklopské viacuholníkové	m3	1,480	404,12	598,10
	4 - Vodorovné konštrukcie				2 437,33
33	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami	m2	279,560	4,20	1 174,15
34	Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	284,500	4,44	1 263,18
	5 - Komunikácie				21 991,13
35	Štrkove drenážne plochy - štrk parkovy hr. 60 mm	m2	8,941	54,66	488,72
36	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	269,220	15,04	4 049,07
37	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	168,236	5,58	938,76
38	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	63,890	6,30	402,51
39	Gumena rohož vrátane okrajových prvkov	m2	63,890	78,00	4 983,42
40	Kryt plôch pre telovýchovu-pieskových hr. 50 mm	m2	35,885	8,25	296,05
41	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	160,258	13,56	2 173,10
42	Semmelrock NATURO maloformátová dlažba 6 cm, granit svetlá, alebo ekvivalent	m2	176,000	42,00	7 392,00
43	Kladenie stupnic do lôžka v rov.-sv. do 1:5	m2	10,000	15,65	156,50
44	Drevené šlapaky impregnovane	m2	10,100	110,00	1 111,00
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				49 810,68
45	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	260,000	11,21	2 914,60
46	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá, alebo ekvivalent	ks	262,800	9,51	2 499,23
47	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	39,950	123,00	4 913,85

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 1

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
48	Osadenie prvkov drobnej architektúry so zabetónovaním nôh alt. ukotvením	ks	24,000	125,00	3 000,00
49	Lavička pre oddych	ks	20,000	528,00	10 560,00
50	Smetný koš	ks	6,000	305,00	1 830,00
51	Kruhové sedenie pri stojanoch na bycikle	ks	1,000	841,00	841,00
52	Detská hojdačka	ks	2,000	555,00	1 110,00
53	Detská zostava pre menšie deti	ks	1,000	1 799,00	1 799,00
54	Pieskovisko so sedením 1500x1500	ks	1,000	2 410,00	2 410,00
55	Piknikové lavice so stolom	ks	1,000	1 015,00	1 015,00
56	Workhoutova zostava Street	ks	1,000	8 250,00	8 250,00
57	Exterierový šach vyrobený z paliet	ks	1,000	2 269,00	2 269,00
58	Hmyzište (hotel pre hmyz)	ks	1,000	709,00	709,00
59	Stojan na bicykle	ks	1,000	325,00	325,00
60	Info tabuľa	ks	1,000	2 246,00	2 246,00
61	Drevený okrasný mostík cez štrkovú drenáž	ks	1,000	3 119,00	3 119,00
	99 - Presun hmôt HSV				8 422,70
62	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	353,895	23,80	8 422,70
PSV - Práce a dodávky PSV					3 039,52
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				98,77
63	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	160,280	0,16	25,64
64	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, alebo ekvivalent	t	0,047	1 556,00	73,13
	762 - Konštrukcie tesárske				2 871,66
65	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien vrátane spodnej konštrukcie (vankušov)	m2	9,415	29,54	278,12
66	Agatova doska hobľovaná	m2	9,400	264,00	2 481,60
67	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	27,640	4,05	111,94
	783 - Dokončovacie práce - nátery				69,09
68	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	9,400	1,20	11,28
69	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	9,400	2,84	26,70

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 1

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
70	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo ekvivalent	m2	9,400	3,31	31,11
Cena celkom bez DPH					118 147,28

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.
Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vyplňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.

Zhotoviteľ: Ing. Viliam Čech

Pečiatka:

Dátum: 17.9.2018

Podpis:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 2

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
Lokalita č. 2 - Detské ihrisko					137 665,17
HSV - Práce a dodávky HSV					121 047,39
	1 - Zemné práce				13 882,68
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	82,110	5,05	414,66
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	82,110	0,90	73,90
3	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,630	30,60	355,88
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,100	21,20	214,12
5	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	10,100	6,00	60,60
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	103,980	0,50	51,99
7	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	103,980	0,50	51,99
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	103,980	1,50	155,97
9	Založenie trávnikového parkového v rovine	m2	1 454,600	3,18	4 625,63
10	Trávové semeno - výber	kg	47,800	10,99	525,32
11	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	272,600	0,60	163,56
12	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 454,600	1,64	2 385,54
13	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 454,600	0,07	101,82
14	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 454,600	0,03	43,64
15	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	28,000	2,15	60,20
16	Ostružiny (egreš, ribezľa, malina)	ks	21,000	15,50	325,50
17	Krušpan	ks	7,000	15,33	107,31
18	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	11,000	7,12	78,32
19	Katalpa bignoniowa	ks	7,000	137,60	963,20
20	Jarabina - Sorbus	ks	4,000	15,40	61,60
21	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	33,000	9,22	304,26
22	Kolove koňštr.	ks	33,000	6,30	207,90
23	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom hniezdovo	m2	1 728,220	1,11	1 918,32
24	Chemické odburinenie trávnikového Bofix, alebo ekvivalent	l	13,760	45,89	631,45

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 2

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
	2 - Zakladanie				2 639,49
25	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	273,880	0,30	82,16
26	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	12,630	40,58	512,53
27	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	2,790	144,00	401,76
28	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	11,410	144,00	1 643,04
	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie				38 036,40
29	Osadenie dielov protihlukovej steny z do stĺpov profilu H výšky 2,0m	m2	84,000	81,50	6 846,00
30	Protihlukova stena - drevené elementy vrátane vysadenia ťahavých rastlín do rašeliny	m2	86,400	361,00	31 190,40
	4 - Vodorovné konštrukcie				2 136,68
31	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytením sponami	m2	244,660	4,20	1 027,57
32	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextilie	m2	249,800	4,44	1 109,11
	5 - Komunikácie				34 623,08
33	Štrkové drenážne plochy - štrk parkovy hr. 60 mm	m2	75,500	54,66	4 126,83
34	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	273,880	15,04	4 119,16
35	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	28,880	5,58	161,15
36	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	244,650	6,30	1 541,30
37	Gumena rohož vrátane okrajových prvkov	m2	244,650	78,00	19 082,70
38	Kryt plôch pre telovýchovu-pieskových hr. 50 mm	m2	36,200	8,25	298,65
39	Kladenie stupníc do lôžka v rov.-sv. do 1:5	m2	28,880	15,65	451,97
40	Nášlapné kamene andezits upravou	m2	24,970	176,00	4 394,72
41	Drevené šlapaky impregnovane	m2	4,060	110,00	446,60
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 061,00
42	Osadenie prvkov drobnej architektury so zabetónovaním nôh alt. ukotvením	ks	25,000	125,00	3 125,00
43	Lavička pre oddych	ks	7,000	528,00	3 696,00
44	Smetny koš	ks	4,000	305,00	1 220,00
45	Detska hojdačka	ks	2,000	555,00	1 110,00
46	Pieskovisko so sedením 3000x3000	ks	1,000	3 425,00	3 425,00
47	Piknikove lavice so stolom	ks	3,000	1 020,00	3 060,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 2

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
48	Stojan na bicykle	ks	4,000	325,00	1 300,00
49	Detska zostava so sieťou (certifikovaná) - pavuk	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
50	Detska zostava hojdačka+ šmykalka	ks	1,000	715,00	715,00
51	Stojan a budka pre vtáctvo	ks	1,000	810,00	810,00
	99 - Presun hmôt HSV				9 668,06
52	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	406,221	23,80	9 668,06
PSV - Práce a dodávky PSV					16 617,78
	762 - Konštrukcie tesárske				15 520,79
53	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	301,850	4,78	1 442,84
54	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 400-650 100x120,140	m3	5,760	238,00	1 370,88
55	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm	m2	125,660	1,45	182,21
56	Lata podkladná 60/40	m	503,210	1,20	603,85
57	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	9,980	35,00	349,30
58	Montáž a dodávka drevenej šindlovej krytiny	m2	70,756	39,56	2 799,11
59	Montáž a dodávka dreveného zabradlia altanku	m2	12,500	40,00	500,00
60	Položenie podláh hobfovaných na zraz z dosiek a fošien vrátane spodnej konštrukcie (vankušov)	m2	25,000	29,54	738,50
61	Agátova doska hoblovana	m2	26,250	264,00	6 930,00
62	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12m	%	149,160	4,05	604,10
	783 - Dokončovacie práce - nátery				1 096,99
63	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	149,250	1,20	179,10
64	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	149,250	2,84	423,87
65	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo ekvivalent	m2	149,250	3,31	494,02
Cena celkom bez DPH					137 665,17

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 2

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
------	---	------	---------------------	--------------------	-------------

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.

Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vypĺňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.

Zhotoviteľ: Ing. Viliam Čech

Pečiatka:

Dátum: 17.9.2018

Podpis:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 3

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
Lokalita č. 2 - Chodník					19 720,97
HSV - Práce a dodávky HSV					19 651,43
	1 - Zemné práce				1 171,92
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	34,060	5,05	172,00
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	34,060	0,90	30,65
3	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	21,800	21,20	462,16
4	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	21,800	6,00	130,80
5	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	55,880	0,50	27,94
6	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	55,880	0,50	27,94
7	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	55,880	1,50	83,82
8	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	113,680	0,60	68,21
9	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom hniezdovo	m2	113,680	1,11	126,18
10	<i>Chemické odburinenie trávnik Bofix, alebo ekvivalent</i>	l	0,920	45,89	42,22
					988,95
11	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami	m2	113,680	4,20	477,46
12	<i>Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextilie</i>	m2	115,200	4,44	511,49
	5 - Komunikácie				9 135,58
13	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	113,680	15,04	1 709,75
14	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	113,680	5,58	634,33
15	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	113,680	13,56	1 541,50
16	<i>Semmelrock NATURO maloformátová dlažba 6 cm, granit svetlá, alebo ekvivalent</i>	m2	125,000	42,00	5 250,00
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 125,75
17	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	181,660	11,21	2 036,41
18	<i>Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá, alebo ekvivalent</i>	ks	183,100	9,51	1 741,28
19	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	27,220	123,00	3 348,06
	99 - Presun hmôt HSV				1 229,23
20	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akekoľvek dĺžky objektu	t	195,116	6,30	1 229,23

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 3

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
PSV - Práce a dodávky PSV					69,54
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				69,54
21	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	113,680	0,16	18,19
22	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, alebo ekvivalent	l	0,033	1 556,00	51,35
Cena celkom bez DPH					19 720,97

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.
Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vyplňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.

Zhotoviteľ: Ing. Viliam Čech

Pečiatka:

Dátum: 17.9.2018

Podpis:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 4

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
Lokalita č. 3 - Oddychovo špotrová zóna					133 153,57
HSV - Práce a dodávky HSV					121 664,39
1 - Zemné práce					18 007,61
1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	114,798	5,05	579,73
2	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	114,798	0,90	103,32
3	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,010	30,60	214,51
4	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	35,750	21,20	757,90
5	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	35,750	6,00	214,50
6	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 15000 m	m3	157,510	0,50	78,76
7	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	157,510	0,50	78,76
8	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	157,510	1,50	236,27
9	Založenie trávnik parkového v rovine	m2	1 521,200	3,18	4 837,42
10	Trávové semeno - výber	kg	50,500	10,99	555,00
11	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	382,800	0,60	229,68
12	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1 521,200	1,64	2 494,77
13	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 521,200	0,07	106,48
14	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 521,200	0,03	45,64
15	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 výšky do 2 m	ks	7,000	2,30	16,10
16	Krušpan	ks	7,000	15,33	107,31
17	Výsadba stromu do predom vyhlúbenej jamky zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	18,000	7,12	128,16
18	Katalpa bignoniava	ks	9,000	137,60	1 238,40
19	Ovocný strom - čeršňa, jabloň	ks	5,000	84,20	421,00
20	Jarabina - Sorbus	ks	4,000	15,40	61,60
21	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	54,000	9,22	497,88
22	Kolove konštr.	ks	54,000	6,30	340,20
23	Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy so zaliatím na svahu nad 1:2 do 1:1 z drevín s balom	m	27,600	28,00	772,80
24	Tuja - Thuja occidentalis Malonyana, d 40 - 60 cm	ks	108,000	9,87	1 065,96

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 4

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
25	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom hniezdovo	m2	1 903,000	1,11	2 112,33
26	Chemické odburinenie trávnik <i>Bofix, alebo ekvivalent</i>	l	15,540	45,89	713,13
	2 - Zakladanie				1 600,80
27	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	382,680	0,30	114,80
28	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	12,560	40,58	509,68
29	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,780	144,00	976,32
	3 - Zvislé a kompletne konštrukcie				5 437,29
30	X Priplatok za zaoblenie muriva s vnútorným polomerom pôdorysu	m3	12,480	31,56	393,87
31	X Murivo obkladové rezné z kameňa lomársky upraveného tr.I, kyklopské viacuholníkové	m3	12,480	404,12	5 043,42
	4 - Vodorovné konštrukcie				3 913,73
32	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm, s uchytением sponami	m2	448,600	4,20	1 884,12
33	<i>Separáčne, filtračné a spevňovacie geotextílie</i>	m2	457,120	4,44	2 029,61
	5 - Komunikácie				45 787,64
34	Štrkove drenážne plochy - štrk parkovy hr. 60 mm	m2	64,250	54,66	3 511,91
35	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	384,500	15,04	5 782,88
36	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm	m2	237,600	5,58	1 325,81
37	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m2	153,660	6,30	968,06
38	Gumena rohož vratane okrajových prvkov	m2	118,000	78,00	9 204,00
39	Kryt plôch pre telovýchovu-pieskových hr. 50 mm	m2	30,620	8,25	252,62
40	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	140,600	13,56	1 906,54
41	<i>Semmelrock NATURO maloformátová dlažba 6 cm, granit svetlá, alebo ekvivalent</i>	m2	154,440	42,00	6 486,48
42	Kladenie stupnic do lôžka v rov.-sv. do 1:5	m2	97,210	15,65	1 521,34
43	<i>Nášlapné kamene andezits upravou</i>	m2	58,000	176,00	10 208,00
44	<i>Drevené šlapaky impregnovane</i>	m2	42,000	110,00	4 620,00
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie				38 288,82
45	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	280,660	11,21	3 146,20
46	<i>Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá, alebo ekvivalent</i>	ks	283,640	9,51	2 697,42
47	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	42,400	123,00	5 215,20

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 4

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
48	Osadenie prvkov drobnej architektúry so zabetónovaním nôh alt. ukotvením	ks	34,000	125,00	4 250,00
49	Lavička pre oddych	ks	22,000	528,00	11 616,00
50	Smetny koš	ks	4,000	305,00	1 220,00
51	Kruhové sedenie pri stojanoch na bycikle	ks	1,000	850,00	850,00
52	Detska hojdačka	ks	2,000	555,00	1 110,00
53	Piknikove lavice so stolom	ks	4,000	1 015,00	4 060,00
54	Branka na loptove hry	ks	2,000	336,00	672,00
55	Detska workoutova zostava	ks	1,000	3 452,00	3 452,00
	99 - Presun hmôt HSV				8 628,50
56	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	362,542	23,80	8 628,50
PSV - Práce a dodávky PSV					11 489,18
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				101,80
57	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	140,230	0,16	22,44
58	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch, alebo ekvivalent	t	0,051	1 556,00	79,36
	762 - Konštrukcie tesárske				11 175,40
59	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien vrátane spodnej konštrukcie (vankušov)	m2	28,280	29,54	835,39
60	Agatova doska hobľovaná	m2	30,000	264,00	7 920,00
61	Drevená tieniaca pergola	sub	1,000	1 985,00	1 985,00
62	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	107,410	4,05	435,01
	783 - Dokončovacie práce - nátery				211,98
63	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	28,840	1,20	34,61
64	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	28,840	2,84	81,91
65	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB, alebo ekvivalent	m2	28,840	3,31	95,46
Cena celkom bez DPH					133 153,57

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávacím spôsobom.

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 4

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
------	---	------	---------------------	--------------------	-------------

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.

Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vypĺňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.

Zhotoviteľ: Ing. Viliam Čech

Pečiatka:

Dátum: 17.9.2018

Podpis:

~~Viliam Čech~~

✓

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 5

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
Elektromontážne práce					46 366,66
Objekt : Vonkajšie osvetlenie					
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:					46 366,66
	210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				2 033,89
1	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D40 (d36)mm	m	6,100	1,12	6,83
2	Rúrka el-inšt PVC tuhá fi 40	m	6,100	2,60	15,86
3	Montáž ochranej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm	m	1 005,600	1,20	1 206,72
4	Chránička kábelová 2-plášťová HDPE, ohybná KOPOFLEX® 40	m	1 005,600	0,80	804,48
	210 04 Vonkajšie vedenie NN				47,80
5	Montáž prúdovej svorky	ks	4,000	6,45	25,80
6	Svorka prúdová SLIP 12.1	ks	4,000	5,50	22,00
	210 10 Ukončenie vodičov - súbory pre káble				298,80
7	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 6 mm2	kus	190,000	0,68	129,20
8	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 6 mm2	kus	2,000	2,20	4,40
9	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x6 mm2	kus	24,000	2,45	58,80
10	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10 mm2	kus	28,000	3,80	106,40
	210 12 Ústrojenstvo istiace				93,26
11	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	32,000	2,00	64,00
12	Poistková vložka závitová DII E27 ,6A	kus	32,000	0,80	25,60
13	Montáž poistkovej vložky, nožové poistky	kus	2,000	0,22	0,44
14	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 000) , PNA000 16A gG	kus	2,000	1,61	3,22
	210 19 Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svork.				994,64
15	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	22,00	22,00
16	Rozvádzač RO	ks	1,000	750,00	750,00
17	Doplnenie rozvádzača R v škole	ks	1,000	50,00	50,00
18	Montáž skrine na stožiar	kus	2,000	13,00	26,00
19	Poistková plastová skrinka SPP2	kus	2,000	60,00	120,00

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 5

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
20	Upínací nerezový pás Bandímex	kus	8,000	3,33	26,64
	210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				27 307,80
21	Demontáž svetidla	kus	1,000	9,00	9,00
22	Montáž, LED svetidlo uličné, cestné, na výložník	kus	6,000	17,00	102,00
23	Svietidlo LED na výložník , LED 55W	ks	6,000	285,00	1 710,00
24	Montáž, LED svetidlo na stožiar	kus	14,000	17,00	238,00
25	Svietidlo LED 20W na stožiar	ks	14,000	475,00	6 650,00
26	Montáž, LED reflektor, IP54-66, vonkajšie použitie	kus	12,000	12,10	145,20
27	Svietidlo reflektorové 140W	ks	12,000	350,00	4 200,00
28	Montáž, stožiar osvetľovací, sadový, oceľový	kus	20,000	18,00	360,00
29	Osvetľovací stožiar rúrkový hliníkový pretláčaný s prírubou 4m	kus	20,000	365,00	7 300,00
30	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 12m	kus	6,000	85,60	513,60
31	Stožiar osvetľovací kužeľový , výška 8m, žiarovo zinkovaný	kus	6,000	385,00	2 310,00
32	Montáž, výložník oceľový 1-ramenný, váha do 35kg	kus	6,000	45,60	273,60
33	Výložník 1-ramenný , dĺžka 1,0m, žiarovo zinkovaný	kus	6,000	75,00	450,00
34	Montáž, päťka stožiarová,	kus	20,000	10,04	200,80
35	Prefabrikovaný základ pre stožiar	kus	20,000	70,00	1 400,00
36	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	20,000	15,60	312,00
37	Svorkovnica stožiarová EKM 2020	kus	20,000	40,00	800,00
38	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 2 svet. okruhy	kus	6,000	15,60	93,60
39	Stožiarová rozvodnica EKM 2020 -2D1	kus	6,000	40,00	240,00
	210 22 Vedenia uzemňovacie				1 582,18
40	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	m	45,600	1,50	68,40
41	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	kg	33,520	1,45	48,60
42	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	352,000	2,14	753,28
43	Plochá uzemňovacia (FeZn) páska 30x4	kg	352,000	1,45	510,40
44	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	51,000	3,12	159,12
45	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	26,000	0,65	16,90

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 5

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
46	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xM8) mosadzné matice	kus	26,000	0,98	25,48
	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				2 452,46
47	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	154,000	0,60	92,40
48	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	154,000	0,60	92,40
49	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x6	m	72,000	0,70	50,40
50	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	m	72,000	2,74	197,28
51	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x10	m	250,000	0,70	175,00
52	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10	m	250,000	4,21	1 052,50
53	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 5x4-16	m	208,000	0,70	145,60
54	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	208,000	3,11	646,88
	210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové				43,99
55	Montáž, kábel Al 1kV voľne uložený AYKY 4x25	m	10,600	0,80	8,48
56	Kábel Al 1kV : NAYY-J 4x25	m	10,600	3,35	35,51
	213 2 PPV a HZS				1 014,00
57	Záverečné meranie intenzity a nastavenie svietidiel	hod	10,000	12,00	120,00
58	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	46,000	14,00	644,00
59	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	250,00	250,00
	M46 - 202 Zemné práce pri ext. Montážach				10 252,84
60	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,400	96,00	38,40
61	Búranie živíčných povrchov do 5 cm	m2	5,200	1,10	5,72
62	Rezanie drážky v asfalte, betóne	m	20,000	2,78	55,60
63	Jama pre stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.3	kus	26,000	35,12	913,12
64	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	6,200	120,00	744,00
65	Rozbúranie betónu	m3	1,000	185,00	185,00
66	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	372,000	5,25	1 953,00
67	Zriadenie káblu lôžka š.45/10cm, piesok, zákrytové dosky	m	372,000	8,50	3 162,00
68	Zákrytová káblová doska HDPE : š.250, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	372,000	2,50	930,00
69	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	372,000	1,85	688,20

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Špecifikácia položiek pre fakturačný celok č. 5

P.č.	Špecifikácia položiek (práca, montáž, materiál)	m.j.	Množstvo, výmera	Jednotková cena	Cena celkom
70	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	372,000	2,60	967,20
71	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	m2	185,000	1,36	251,60
72	Úprava spevnenej plochy	m3	1,000	66,00	66,00
73	Betón - materiál	m3	1,000	88,60	88,60
74	Úprava asfaltu	m2	5,110	40,00	204,40
	OSTATNÉ				245,00
75	plošina	sh	7,000	35,00	245,00
Cena celkom bez DPH					46 366,66

Pokiaľ je v zadávacích dokladoch uvedený konkrétny výrobok alebo výrobca, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť výrobok od iného výrobcu (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie) technické parametre a vlastnosti, ako majú výrobky uvedené v týchto zadávacích dokladoch. Ak sa takýto konkrétny prípad vyskytuje, tak len z dôvodu určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, pričom nebolo možné túto skutočnosť opísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.

Uchádzač je povinný pri každom ním ponúkanom výrobku uviesť/doplniť do tabuľky špecifikácie položiek daného fakturačného celku výrobcu, konkrétny obchodný názov výrobku, ako aj katalógové číslo ponúkaného výrobku podľa katalógu výrobcu.
Vpisovaný text výrazne odlišiť od pôvodného textu (napr. červená farba).

Uchádzač je povinný oceniť každú položku, pričom nie je možné uvedené položky zlučovať a oceňovať ich jednou jednotkovou cenou. Množstvá vypočítať na základe poskytnutých grafických a textových príloh k súťažným podkladom a obhliadky staveniska. Jednotkové ceny uviesť v € na 2 desatinné miesta, výsledné ceny jednotlivých položiek špecifikácie zaokrúhliť príkazom round tiež na 2 (dve) desatinné miesta a s nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta!!!

Svojím podpisom potvrdzujem, že pri vyplňaní formulára špecifikácie položiek, som sa riadil vyššie uvedenými pokynmi.

Zhotoviteľ: Ing. Viliam Čech

Pečiatka:

Dátum: 17.9.2018

Podpis:

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "E" Technické zmluvné podmienky

V Zmluvných podmienkach („tieto Podmienky“), ktoré zahŕňajú tieto Všeobecné a Zvláštne podmienky nasledujúce slová a výrazy budú mať ďalej uvedený význam pre túto zmluvu. Slová označujúce osoby alebo strany zahrňujú obchodné spoločnosti a iné právnické osoby okrem prípadov, kedy kontext vyžaduje niečo iné.

1. Dokumentácia

1.1. Zhotoviteľ v rámci súťaže obdržal od objednávateľa všetkú tendrovú dokumentáciu, v rozsahu ako dokumentáciu pre stavebné povolenie dopracovanú pre potreby súťaže. Zhotoviteľ sa zaväzuje dopracovať obdržanú dokumentáciu ako realizačnú dokumentáciu rozsahu podľa zoznamu UNIKA Bratislava s.r.o. rok 2017 a to časti prílohy č. 3 :

- D. koordinačný výkres stavby
- E. dokumentácia stavebných objektov
- F. projekt organizácie výstavby
- G. dokumentácia prevádzkových súborov
- I. doklady

Dopracovaná dokumentácia musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi a to v textovom a grafickom tvare a príslušnej mierke. Musí zahŕňať všetky činnosti, ktoré vychádzajú z dokumentácie predloženej objednávateľom v rámci súťaže, všetkých podmienok súťaže a z podmienok tejto zmluvy. Nemôže nijakým spôsobom objemovo, dispozične, objektovou skladbou byť v rozpore s podmienkami súťaže (to znamená aj s objednávateľom predloženou dokumentáciou) a tejto zmluvy.

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizačnú dokumentáciu vypracovať na svoje náklady sám, ak je na to odborne spôsobilý a má na to oprávnenie, alebo prostredníctvom svojho poddodávateľa, ktorý má na to oprávnenie a je odborne spôsobilý. Za oprávnenie sa v takomto prípade považuje oprávnenie v zmysle živnostenského zákona a za odbornú spôsobilosť, spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.

1.3. Zhotoviteľ ručí a zodpovedá za úplnosť, rozsah a súlad s platnými právnymi predpismi realizačnej dokumentácie.

1.4. Vyhotovenú realizačnú dokumentáciu doručí zhotoviteľ na odsúhlasenie objednávateľovi ihneď po jej vyhotovení v súlade s touto zmluvou. Objávateľ bude povinný do 21 dní od obdržania realizačnej dokumentácie od zhotoviteľa písomne :

- a) túto overiť a tým aj prijať
- b) alebo vrátiť zhotoviteľovi na dopracovanie s uvedením dôvodov pre ktoré ju vracia na dopracovanie. Toto môže vykonať len z dôvodov, že predložená realizačná dokumentácia nebude v súlade s podmienkami súťaže, tejto zmluvy, alebo platných právnych predpisov.

V prípade, že objednávateľ v lehote do 21 dní odo dňa obdržania realizačnej dokumentácie nedoručí zhotoviteľovi oznámenie že ju objednávateľ overil, alebo mu ju nevráti na dopracovanie s uvedením dôvodu, bude sa mať za to, že je objednávateľom overená a prijatá.

1.5. Zhotoviteľ bude môcť vykonať stavebné práce ako predmet tejto zmluvy len v súlade s objednávateľom overenou a prijatou realizačnou dokumentáciou. Akékoľvek dodatočné náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi z dôvodu ním vypracovanej realizačnej dokumentácie bude znášať zhotoviteľ.

1.6. Zhotoviteľ ako odborne spôsobilá osoba si zabezpečí na svoje náklady pre vyhotovenie dokumentácie pre realizáciu stavby všetky nevyhnutné podklady na jej vypracovanie.

Akékoľvek pochybenia v tomto smere nemôže prenášať na objednávateľa, alebo na objednávateľom poskytnutú dokumentáciu v rámci súťaže.

- 1.7. Všetky dokumenty zhotoviteľa budú v jeho starostlivosti a opatere, pokým a dokiaľ ich neprevezme objednávateľ. Pokiaľ sa neuvádza v Zmluve inak, zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi štyri paré z každého dokumentu realizačnej projektovej dokumentácie v printovej podobe a 2x v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči v tvare -.pdf. a -.dwg, a to minimálne 14 dní pred skutočným začatím stavebných prác.
- 1.8. Zhotoviteľ je povinný uchovávať na stavenisku jedno paré zmluvných dokumentov, publikácií uvedených v Technicko-kvalitatívnych podmienkach, dokumentov zhotoviteľa (ak nejaké sú), výkresov, zmien a ďalších oznámení/správ daných Zmluvou. Zamestnanci objednávateľa budú mať právo prístupu ku všetkým týmto dokumentom v každom rozumnom čase.
- 1.9. Akýkoľvek stupeň alebo druh dokumentácie vyhotovenej alebo zabezpečenej zhotoviteľom v rámci plnenia predmetu Zmluvy o dielo musí byť v štátnom, to je v Slovenskom jazyku.

2. Užívanie dokumentácie zhotoviteľa objednávateľom

- 2.1. Medzi obidvoma stranami platí, že zhotoviteľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva svojich dokumentov a ďalšej projektovej dokumentácie vyhotovenej zhotoviteľom (alebo v jeho mene) len do odovzdania podľa bodu 1.7. časti "E" zmluvy
- 2.2. Zhotoviteľ (podpisom tejto Zmluvy o dielo) poskytne objednávateľovi prenosnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, užívanie a zdieľanie dokumentov zhotoviteľa vrátane vyhotovovania a užívania ich modifikácií až do doby jej straty podľa bodu 1.1 tohto článku. Táto licencia bude:
 - a) oprávňovať ktorúkoľvek osobu, ktorá je platným vlastníkom príslušnej časti stavebného diela ku kopírovaniu, používaniu a zdieľaniu dokumentov zhotoviteľa pre účely kompletizácie, prevádzky, údržby, zmien, úprav, opráv a odstránenia stavebného diela a
 - b) v prípade dokumentov zhotoviteľa, ktoré sú vo forme počítačových programov a iného software, dovoliť ich používanie na ktoromkoľvek počítači na stavenisku a na ďalších miestach predpokladaných v Zmluve, vrátane výmeny ktorýchkoľvek počítačov dodaných zhotoviteľom.

3. Užívanie dokumentácie objednávateľa zhotoviteľom

- 3.1. Medzi obidvoma stranami platí, že objednávateľ si ponechá autorské práva a ďalšie práva vyplývajúce z intelektuálneho vlastníctva projektovej dokumentácie, výkresov a ďalších dokumentov vyhotovených objednávateľom (alebo v jeho mene). Zhotoviteľ môže na vlastné náklady kopírovať, používať a získať tieto dokumenty pre účely vyplývajúce zo Zmluvy. Bez súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ ich nesmie kopírovať, používať alebo zdieľať tretej strane okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto Zmluvy.

4. Dôverné podrobnosti

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť všetky dôverné a iné informácie, ktoré môže stavebný dozor odôvodnene požadovať na to, aby si overil, že zhotoviteľ plní podmienky Zmluvy.
- 4.2. Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať s údajmi v Zmluve ako so súkromnými a dôvernými okrem rozsahu nevyhnutného pre plnenie zmluvných záväzkov, alebo rozsahu nevyhnutného pre súlad s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie publikovať, povoliť publikovanie, alebo poskytnúť akékoľvek údaje o diele v žiadnom obchodnom, ani technickom dokumente, ani v inom dokumente bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

5. Súlad s právnymi predpismi

- 5.1. Pri plnení Zmluvy zhotoviteľ musí konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je vo Zvláštnych podmienkach uvedené inak, zhotoviteľ je povinný zariadiť všetky oznámenia, zaplatiť všetky dane, odvody a poplatky a zadovážiť všetky povolenia, licencie a súhlasy (schválenia) požadované právnymi predpismi týkajúcimi sa vyhotovenia a dokončenia stavebného diela a odstránenia akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný odškodniť objednávateľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla škoda v dôsledku toho, že zhotoviteľ opomenul tak urobiť.

6. Spoločná a vlastná zodpovednosť

- 6.1. Ak zhotoviteľ vytvorí (podľa platných právnych predpisov) spoločný podnik, konzorcium alebo iné zoskupenie dvoch alebo viacerých osôb:
- a) predpokladá sa, že tieto osoby budú spoločne a samostatne zodpovedné voči objednávateľovi za realizáciu stavebného diela,
 - b) tieto osoby sú povinné oznámiť objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať zhotoviteľa a každú z týchto osôb,
 - c) zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právny stav bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

OBJEDNÁVATEĽ

7. Právo prístupu na stavenisko

- 7.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a používanie tých jeho častí, ktoré sú potrebné k realizácii predmetu diela, alebo jeho časti počas doby (alebo dôb) podľa schváleného harmonogramu prác. Právo prístupu a užívanie nebude náležať výhradne zhotoviteľovi. Ak sa podľa Zmluvy požaduje, aby objednávateľ dal zhotoviteľovi do užívania akýkoľvek základ, objekt, zariadenie alebo prostriedok prístupu, objednávateľ tak urobí v čase a spôsobom uvedeným v Technicko-kvalitatívnych podmienkach. Avšak objednávateľ môže odoprieť takéto právo alebo užívanie až kým neobdrží záruku na splnenie zmluvných záväzkov.
- 7.2. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená žiadna lehota, poskytne objednávateľ zhotoviteľovi právo prístupu na stavenisko a umožní mu jeho užívanie v takých termínoch, aké sú potrebné na to, aby zhotoviteľ mohol postupovať podľa harmonogramu predloženého podľa podčlánkov Harmonogram prác v časti "E" schváleného objednávateľom.
- 7.3. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že mu objednávateľ neposkytol toto právo prístupu, alebo neumožnil užívanie staveniska počas spomínanej doby, zhotoviteľ to oznámi zástupcovi objednávateľa a stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok na predĺženie lehoty výstavby v dôsledku každého takého oneskorenia o túto dobu, ak dokončenie diela je alebo bude oneskorené, a to podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E".
- 7.4. Po obdržaní spomínaného oznámenia zhotoviteľa bude stavebný dozor v súčinnosti so zástupcom objednávateľa pre veci technické postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.
- 7.5. Avšak, pokiaľ (a do tej miery) omeškanie objednávateľa bolo spôsobené nejakou chybou alebo oneskorením zhotoviteľa, vrátane chyby v niektorom z dokumentov zhotoviteľa, alebo oneskorením v jeho predložení, zhotoviteľ nebude mať nárok na takéto predĺženie lehoty výstavby.

8. Povolenia, licencie a schválenia

- 8.1. Objednávateľ môže na žiadosť zhotoviteľa (tam, kde to môže urobiť) poskytnúť mu primeranú pomoc pri:
- a) zaopatrení výťahov právnych predpisov krajiny, ktoré sa vzťahujú k zákazke, ale nie sú bežne dostupné a pri

- b) žiadostiach zhotoviteľa o akékoľvek povolenia, licencie alebo schválenia, ktoré sú požadované právnymi predpismi krajiny.

9. Zamestnanci objednávateľa

- 9.1. Objednávateľ zabezpečí, aby jeho pracovníci, prípadne ďalší subdodávatelia na stavenisku:
- a) spolupracovali pri úsilí zhotoviteľa podľa podčlánkov Spolupráca v časti "E" a
 - b) podnikali kroky podobné tým, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa podľa podčlánkov Bezpečnostné postupy v časti "E" a podľa podčlánkov Ochrana životného prostredia v časti "E".

10. Finančné opatrenia objednávateľa

- 10.1. Objednávateľ je povinný predložiť do 28 dní po obdržaní žiadosti od zhotoviteľa primeraný dôkaz o tom, že vykonal príslušné finančné opatrenia/dohody (a ich aj udržiava), ktoré mu umožnia zaplatiť za dielo zmluvnú cenu v súlade s časťou "C". Ak objednávateľ hodlá vykonať akékoľvek vecné zmeny vo svojich finančných opatreniach v nadväznosti na riadiaci orgán, je povinný o tom upovedomiť zhotoviteľa a poskytnúť mu ich podrobný popis.

11. Nároky objednávateľa

- 11.1. Ak sa objednávateľ domnieva, že má nárok na akúkoľvek platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto zmluvných podmienok, alebo inak v súvislosti so Zmluvou a/alebo na predĺženie záručnej doby (lehoty na oznámenie väd), oznámi to objednávateľ alebo stavebný dozor aj s podrobnosťami zhotoviteľovi.
- 11.2. Oznámenie bude podané, čo najskôr potom, ako objednávateľ zistil skutočnosť či okolnosti, ktoré môžu byť dôvodom na vznesenie nároku. Oznámenie týkajúce sa akéhokoľvek predĺženia lehoty na oznámenie väd bude podané pred uplynutím tejto lehoty.
- 11.3. Podrobnosti budú špecifikovať článok alebo iný základ pre vznesenie nároku a budú zahŕňať zdôvodnenie sumy a /alebo predĺženie, o ktorom sa objednávateľ domnieva, že má naň nárok podľa Zmluvy o dielo. Stavebný dozor bude potom postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby odsúhlasil alebo určil (i) výšku čiastky (ak existuje), ktorá by mala byť zaplatená objednávateľovi zhotoviteľom a/alebo (ii) predĺženie (ak existuje) lehoty na oznámenie väd v súlade s podčlánkami Predĺženie záručnej doby v časti "E".
- 11.4. Táto čiastka môže byť zahrnutá ako odpočet zo Zmluvnej ceny a Potvrdenia platieb. Objednávateľ je oprávnený len k odškodneniu či inému zníženiu čiastky uvedenej v Potvrdení platieb zhotoviteľovi alebo inému nároku voči zhotoviteľovi len v súlade s týmto článkom.

POVERENÉ OSOBY A STAVEBNÝ DOZOR

12. Poverené osoby a stavebný dozor

- 12.1.1. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:

- a) za zhotoviteľa:

- i. zástupca vo veciach zmluvných (meno a priezvisko):

.....

- ii. osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho (meno a priezvisko):

.....

- iii. osoba ako koordinátor bezpečnosti pri práci (meno a priezvisko):

.....

- b) za objednávateľa:
- i. zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Brozman
 - ii. osoba poverená vo veciach technických za objednávateľa: osobu ktorá bude v objednávateľa zastupovať vo veciach technických oznámi objednávateľ zhotoviteľovi a stavebnému dozorovi písomne najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia staveniska
 - iii. koordinátor projektu: osobu ktorá bude v mene objednávateľa vykonávať činnosť koordinátora projektu oznámi objednávateľ zhotoviteľovi a stavebnému dozorovi písomne najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia staveniska
 - iv. osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru: osobu ktorá bude v mene objednávateľa vykonávať činnosť stavebného dozora oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia staveniska
- 12.1.2. Zmeny určených osôb sa musia druhej zmluvnej strane oznámiť písomne, a v súlade s podmienkami tejto zmluvy o dielo; oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom oznamujúcej zmluvnej strany a v prípade činností vyžadujúcich oprávnenia v zmysle platných právnych predpisov, musí byť súčasťou oznámenia aj doklad pre novú osobu že spĺňa podmienky platných právnych predpisov. Bez listinného preukázania splnenia takýchto podmienok zmena nemôže nastať. Zmena je účinná okamihom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane a to v prípadoch v ktorých sa nebude jednáť o zmenu poddodávateľa, tam platia ustanovenia tejto zmluvy na výmenu subdodávateľov. Pri tých osobách, ktoré zhotoviteľ určil v súťaži a sú súčasťou príloh tejto zmluvy, tieto môže zhotoviteľ vymeniť len v prípade závažných dôvodov a to len so súhlasom objednávateľa a to v súlade s touto zmluvou o dielo.
- 12.1.3. Ak táto zmluva uvádza v súvislosti s určitým právnym úkonom alebo iným dokumentom viacero osôb, ktoré ho majú podpísať, rozumie sa tým, že ho musia podpísať všetky uvedené osoby.
- 12.2. Povinnosti a právomoc zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora**
- 12.2.1. Objednávateľ a ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46 b zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení). Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 12.2.2. Objednávateľ je povinný menovať svojho zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora, ktorí budú vykonávať povinnosti stanovené v Zmluve. Poverený zástupca vo veciach technických, stavebný dozor a jeho personál musí zahŕňať dostatočne kvalifikovaných inžinierov a ďalších odborníkov, ktorí sú kompetentní vykonávať tieto povinnosti.
- 12.2.3. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor nemá žiadnu právomoc doplňovať/meniť zmluvné dokumenty okrem tých, ktoré zmluva pripúšťa. Stavebný dozor a zástupca vo veciach technických sú povinní pred uskutočnením daného kroku zadovážiť zvláštny súhlas objednávateľa podľa nasledovných podčlánkov tejto Zmluvy pri práve na zmenu pri každej úprave a/alebo zmene stavby, ktorá by mala za následok zmenu ponukovej ceny a/alebo predĺženie lehoty výstavby.
- 12.2.4. Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve, alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby stavebný dozor získal súhlas povereného zástupcu vo veciach technických pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje, že neuplatní ďalšie obmedzenia právomoci stavebného dozora okrem tých, ktoré budú odsúhlasené so zhotoviteľom.
- 12.2.5. Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené ináč:

- a) kedykoľvek si stavebný dozor plní svoje povinnosti alebo vykonáva činnosti uvedené v zmluvných dokumentoch alebo z nich vyplývajúce, predpokladá sa, že stavebný dozor koná v mene objednávateľa,
- b) stavebný dozor nemá právomoc zbaviť ktorúkoľvek zo strán akýchkoľvek povinností, záväzkov alebo zodpovednosti podľa Zmluvy a
- c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, pokyn, upozornenie, návrh, požiadanie, skúška alebo podobný skutok zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora (vrátane absencie nesúhlasu), nezabavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane zodpovednosti za chyby, opomenutia, nehodu či nesúlad.
- d) stavebný dozor je oprávnený pozastaviť/zastaviť práce v prípade ak zhotoviteľ postupuje pri ich vykonávaní v rozpore s touto zmluvou o dielo alebo v rozpore s platnými právnymi a technickými predpismi

12.3. Delegovanie právomoci stavebným dozorom

- 12.3.1. Stavebný dozor môže z času na čas previesť povinnosti a delegovať právomoci na asistentov a môže takýto prevod či delegovanie taktiež odvolať. Medzi týmito asistentmi môže byť stály dozorca stavby a/alebo nezávislí inšpektori menovaní na preskúvanie a/alebo odskúšanie súčasti technologického zariadenia a/alebo materiálov. Prevod povinností, delegovanie právomoci alebo ich odvolanie musí byť v písomnej forme napríklad zápisom do stavebného denníka. Avšak, pokiaľ sa obidve strany nedohodnú ináč, stavebný dozor nesmie delegovať právomoc rozhodovať o akejkoľvek záležitosti v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E".
- 12.3.2. Asistenti stavebného dozora musia byť osobami s vhodnou kvalifikáciou, kompetentní pre vykonávanie týchto povinností a uplatňovanie právomoci.
- 12.3.3. Každý asistent, na ktorého boli prevedené povinnosti alebo delegovaná právomoc, bude oprávnený vydávať pokyny zhotoviteľovi len v rozsahu stanovenom takýmto poverením. Každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, preskúmanie, prehliadka, pokyn, upozornenie, návrh, žiadosť, skúška, alebo podobný krok asistenta v súlade so spomínaným delegovaním, budú mať rovnaký účinok ako keby išlo o úkon stavebného dozora. Avšak:
 - a) akékoľvek opomenutie neschváliť prácu, technologické zariadenie alebo materiály nebude znamenať ich schválenie, a preto nesmie obmedzovať právo zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora zamietnuť takúto prácu, technologické zariadenie alebo materiály,
 - b) ak zhotoviteľ spochybňuje akékoľvek rozhodnutie alebo pokyn asistenta, môže predložiť túto záležitosť stavebnému dozorovi, ktorý je povinný promptne potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť takéto rozhodnutie alebo pokyn.

12.4. Pokyny zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora

- 12.4.1. Poverený zástupca vo veciach technických a stavebný dozor môže (kedykoľvek) vydať zhotoviteľovi pokyny a dodatočné alebo upravené/pozmenené výkresy, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a odstránenie akýchkoľvek väd, všetko v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ bude prijímať pokyny iba od zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné právomoci podľa tohto podčlánku. Ak nejaký pokyn predstavuje zmenu, musia sa použiť články Zmeny a úpravy v časti "E".
- 12.4.2. Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané zástupcom vo veciach technických a stavebným dozorom alebo povereným asistentom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. Kedykoľvek je to možné, ich pokyny sa majú dodať v písomnej forme, napr. zápisom do stavebného denníka.

12.5. Výmena zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora

- 12.5.1. Ak objednávateľ zamýšľa vymeniť zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora je povinný oznámiť zhotoviteľovi, najneskôr 5 pracovných dní pred zamýšľaným dátumom výmeny, meno, adresu a príslušnú prax predpokladaného nového (vymeneného) zástupcu vo

veciach technických alebo stavebného dozora. Objednávateľ nesmie vymeniť zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora za osobu, proti ktorej vznesie zhotoviteľ oprávnené námietky formou upozornenia objednávateľovi, spolu s podporným podrobným opisom.

12.6. Pracovné rokovanie manažmentu stavby

12.6.1. Stavebný dozor, zástupca vo veciach technických, koordinátor projektu alebo zhotoviteľ, stavbyvedúci môžu požadovať vzájomnú prítomnosť na pracovných rokovaníach manažmentu stavby za účelom získania prehľadu o organizácii ďalších prác. Zástupca vo veciach technických, alebo koordinátor projektu zaznamená agendu prerokovanú na týchto rokovaníach a zabezpečí doručenie kópii tohto zápisu účastníkom rokovaní a objednávateľovi. Zodpovednosti uvedené v zápise za akékoľvek kroky, ktoré sa majú podniknúť, musia byť v súlade so zmluvou.

12.7. Fotodokumentácia

12.7.1. Zhotoviteľ je povinný viesť fotodokumentáciu realizovaných prác zachytávajúcu počiatočný, priebežný a konečný stav jednotlivých stavebných aktivít a túto fotodokumentáciu elektronicky v týždenných intervaloch doručovať objednávateľovi diela na jeho adresu podľa Zmluvy.

12.8. Rozhodnutia

12.8.1. Kedykoľvek tieto zmluvné podmienky predpokladajú, že pri odsúhlasovaní alebo rozhodovaní o nejakej záležitosti bude zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor postupovať v súlade s týmito podčlánkami Rozhodnutia, potom zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor je povinný konzultovať s obidvomi stranami a pokúsiť sa dosiahnuť zhodu. Ak sa zhoda nedosiahne, zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor musí urobiť spravodlivé rozhodnutie v súlade so Zmluvou, pričom bude brať do úvahy všetky významné okolnosti.

12.8.2. Zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor je povinný oznámiť obidvom stranám výsledok každej dohody alebo rozhodnutia spolu s podporným podrobným popisom. Každá zo strán uvedie do pôsobnosti každú takúto dohodu alebo rozhodnutie, pokiaľ a dokedy nebudú revidované podľa článkov Požiadavky, spory a rozhodcovské konanie v časti "C".

ZHOTOVITEĽ

13 Všeobecné povinnosti zhotoviteľa

13.1.1 Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, slovenské technické normy, zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne doložiť, že pred nástupom na stavbu vykonal školenie o ochrane pred požiarimi a poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci u všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na stavbe a skontroloval, že tak urobili aj jeho subdodávatelia.

13.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť nápomocný objednávateľovi pri organizovaní kontrolných dní na stavbe, a to minimálne raz za mesiac.

13.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou, podkladmi pre vykonanie diela, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami (najmä na úseku stavebného poriadku, technických požiadaviek na výstavbu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení, ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, odpadového hospodárstva a ochrany pred požiarimi), ktoré sa vzťahujú na dielo a v ich medziach aj v súlade s potrebami a oprávnenými záujmami objednávateľa,

- ktoré sú zhotoviteľovi známe. Je takisto viazaný včas oznámenými pokynmi objednávateľa, ak jeho pokyny neodporujú tejto zmluve, podkladom pre vykonanie diela, príslušným právnym predpisom ani technickým normám, ktoré sa vzťahujú na dielo.
- 13.1.4 Zhotoviteľ obstará všetky veci, ktoré sú vzhľadom na charakter stavby potrebné na zrealizovania diela. Náklady na obstaranie takých vecí sú v plnom rozsahu zahrnuté v dohodnutej cene za zrealizovanie diela.
- 13.1.5 Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje obstaráť a pri vykonávaní diela použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky určené v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v príslušných právnych predpisoch a v technických normách. Na žiadosť objednávateľa mu hodnovernými dokladmi preukáže splnenie uvedených požiadaviek.
- 13.1.6 Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, najmä nebezpečenstvo zničenia, poškodenia, straty a odcudzenia, na všetkých strojových a iných zariadeniach, stavebných výrobkoch a iných veciach, ktoré používa pri vykonávaní diela a ktoré s vykonávaním diela súvisia, a to bez ohľadu na miesto, kde sa nachádzajú. Objednávateľ nezabezpečuje stráženie ani žiadnu inú obdobnú ochranu uvedených vecí.
- 13.1.7 Ak táto zmluva neurčuje inak, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady riadne a včas plniť všetky povinnosti týkajúce sa staveniska a jeho prevádzky, najmä povinnosti určené v ustanovení § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Je takisto povinný na vlastné náklady udržiavať primeraný poriadok a čistotu na stavenisku.
- 13.1.8 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu vykonaných prác a dodávok alebo k inému obdobnému postupu, v dôsledku ktorého sa stanú neprístupnými, ako aj v ďalších prípadoch určených v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v príslušných právnych predpisoch a v technických normách, je zhotoviteľ povinný najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred preukázateľne pozvať objednávateľa na kontrolu vykonávania diela a až do jej ukončenia nepokračovať vo vykonávaní diela (v rozsahu, ktorého sa týka kontrola). Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela, je však povinný zdokumentovať pred zakrytím skutkový stav a toto na požiadanie stavebného dozora alebo technického zástupcu objednávateľa im odovzdať. Objednávateľ však v takom prípade môže požadovať dodatočné odkrytie vykonaných prác a dodávok, pričom znáša náklady s tým spojené a lehota na vykonanie diela sa bez ďalšieho predlžuje o čas potrebný na ich odkrytie a opätovné zakrytie a to v prípade ak sa takouto dodatočnou kontrolou zistí že práce boli vykonané v súlade s touto zmluvou.
- 13.1.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky skúšky a merania týkajúce sa diela, ktoré sú určené podkladmi pre vykonanie diela a ich záväznými zmenami, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je v danej súvislosti povinný najmenej tri pracovné dni vopred preukázateľne pozvať technického zástupcu objednávateľa a stavebný dozor na uvedené skúšky a merania a až do ich ukončenia nepokračovať vo vykonávaní diela (v rozsahu, ktorého sa týkajú skúšky, resp. merania). O vykonaných skúškach a meraniach a o ich výsledkoch je povinný spracovať písomný záznam, ktorý za zhotoviteľa podpíše osoba poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho a za objednávateľa jeho zástupca vo veciach technických, osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozora. Ak sa ktorákoľvek z uvedených osôb, ktoré sa za objednávateľa majú zúčastniť skúšok alebo meraní, bezdôvodne nedostaví na ich vykonanie, zhotoviteľ vykoná stanovené skúšky, resp. merania v ich neprítomnosti; jeho povinnosť spracovať písomný záznam o vykonaných skúškach a meraniach a o ich výsledkoch tým nie je dotknutá. Tento záznam následne bezodkladne doručí technickému zástupcovi objednávateľa a stavebnému dozorovi.
- 13.1.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku podpísaným zástupcom objednávateľa vo veciach technických alebo osobou poverenou výkonom funkcie stavebného

dozoru, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom; lehota na vykonanie diela tým nie je dotknutá. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom (min.5 pracovných dní), vzhľadom na charakter vady spôsobilej na jej odstránenie, je objednávateľ oprávnený, po písomnom upozornení objednávateľa doručenom zhotoviteľovi súčasne s poskytnutím primeranej lehoty, odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak by postup zhotoviteľa viedol k inému než podstatnému porušeniu tejto zmluvy.

- 13.1.11 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti závažným spôsobom, je oprávnený zakázať zhotoviteľovi, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku, z ktorého bude jasne zrozumiteľne a nezameniteľne vyplývať závažné porušenie povinností zhotoviteľa, podpísaným zástupcom objednávateľa vo veciach technických alebo osobou poverenou výkonom funkcie stavebného dozoru, pokračovanie vo vykonávaní diela a určiť mu primeranú lehotu na odstránenie väd vzniknutých do daného okamihu vadným vykonávaním diela; lehota na vykonanie diela tým nie je dotknutá. Ak zhotoviteľ poruší zákaz pokračovať vo vykonávaní diela alebo ak v určenej lehote neodstráni vytknuté vady, je objednávateľ oprávnený po upozornení obsiahnutom aspoň v stavebnom denníku odstúpiť od tejto zmluvy.
- 13.1.12 Zhotoviteľ vedie po celý čas vykonávania diela stavebný denník, v ktorom okrem náležitostí vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi uvádza všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä objektívne údaje klimatických podmienkach, o časovom postupe prác a dodávok a o ich kvalite, ako aj všetky odchýlky oproti podkladom pre vykonanie diela a ich závažným zmenám, vrátane ich zdôvodnenia. Všetky zápisy musia byť vykonané v deň, keď nastala skutočnosť, ktorej sa týkajú, iba výnimočne najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ zástupca zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku vyzve príslušného zástupcu objednávateľa na zaujatie stanoviska k ďalšiemu postupu realizácie diela alebo súhlasu s navrhovanou zmenou, je tento povinný reagovať písomne na tento zápis. Počas bežných pracovných hodín pracovného dňa musí byť stavebný denník nepretržite prístupný v kancelárii stavbyvedúceho na stavbe. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných zápisov do stavebného denníka oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia alebo straty originálu.
- 13.1.13 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi svoju projektovú dokumentáciu skutočne realizovaného trvalého diela v súlade s postupmi stanovenými v Zmluve. Táto dokumentácia zhotoviteľa musí byť v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a výkresmi, musí byť napísaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať dodatočné informácie požadované stavebným dozorom pre doplnenie výkresov kvôli koordinácii projektových dokumentácií oboch strán. Zhotoviteľ bude zodpovedný za túto projektovú dokumentáciu a tá musí byť, po dokončení stavebného diela, pripravená pre účely, na ktoré bola určená.
- 13.1.14 Pred začatím preberacích skúšok je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného zhotovenia a príručky prevádzky a údržby (prevádzkový poriadok) v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami; príručky majú byť dostatočne podrobné tak, aby objednávateľ mohol túto časť stavby prevádzkovať, udržiavať, demontovať, znovu zmontovať, upravovať a opravovať. Takáto časť sa nesmie považovať za dokončenú pre účely prebratia podľa podčlánkov Preberanie stavby objednávateľom v časti "E" dotedy, kým táto dokumentácia a príručky nie sú odovzdané stavebnému dozorovi.
- 13.1.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na stavenisku a všetkých metód výstavby (stavebných postupov). S výnimkou rozsahu stanoveného v Zmluve, zhotoviteľ bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, dočasné dielo (práce a konštrukcie) a taký návrh každého článku technologického zariadenia a materiálov aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so Zmluvou, nebude však zodpovedať za samotný návrh a technicko-kvalitatívne podmienky stavebného diela.
- 13.1.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje uskutočniť pre vyhotovenie stavebného diela, kedykoľvek ho o to zástupca vo veciach

technických alebo stavebný dozor požiada. Bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora sa nesmie vykonať žiadna podstatná zmena týchto opatrení a metód.

13.2. Predstaviteľ zhotoviteľa

- 13.2.1 Zhotoviteľ v tejto zmluve vymenoval stavbyvedúceho ako svojho predstaviteľa (ďalej len stavbyvedúceho) a je povinný dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa podľa Zmluvy.
- 13.2.2 Ak stavbyvedúci má byť dočasne neprítomný na stavenisku počas realizácie stavebného diela, musí sa vymenovať vhodná náhradná osoba (za podmienky predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora) a stavebný dozor musí byť písomne informovaný o tejto skutočnosti.
- 13.2.3 Stavbyvedúci musí v zastúpení zhotoviteľa prijímať pokyny podľa podčlánkov Pokyny zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora v Časti "E".
- 13.2.4 Stavbyvedúci nemôže preniesť akúkoľvek právomoc, funkcie a oprávnenie na ktorúkoľvek kompetentnú osobu bez súhlasu stavebného dozora. Akékoľvek poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byť účinné dovtedy, kým neobdrží od stavebného dozora predchádzajúci súhlas.
- 13.2.5 Stavbyvedúci a všetky tieto osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk.

13.3. Subdodávatelia

- 13.3.1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého subdodávateľa, jeho zmocnencov alebo zamestnancov v celom rade, a tak, ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené ináč:
- a) nepožaduje sa, aby zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov materiálov alebo pre subdodávky, ktorých subdodávatelia sú menovaní v Zmluve,
 - b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozorovi predpokladaný dátum začatia každej práce subdodávateľa najmenej 10 dní dopredu a rovnako tak aj ako začatie takejto práce na stavenisku,
 - c) každá zmluva so subdodávateľom musí obsahovať ustanovenia, ktoré budú oprávňovať objednávateľa na to, aby požadoval prevod čiastkovej zmluvy na objednávateľa podľa podčlánkov Prevod prínosu zo záväzkov subdodávateľa v časti "E", ak je to použiteľné alebo v prípade odstúpenia podľa podčlánkov Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa v časti "C",
 - d) ak je hodnota subdodávky nižšia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej čiastky, predchádzajúci súhlas stavebného dozora nie je potrebný.
- 13.3.2 Zhotoviteľ môže vymeniť, svojich subdodávateľov, a to len v prípadoch:
- na základe odporúčania Objednávateľa
 - z vlastného podnetu po dohode s Objednávateľom
- V takom prípade môže predmetné práce zadať novému subdodávateľovi, pričom je však povinný vopred získať súhlas na výmenu subdodávateľa od Objednávateľa a stavebného dozora. V prípade, že ich zadá novému subdodávateľovi bez predchádzajúceho odsúhlasenia Objednávateľom a stavebným dozorom, bude sa jednáť zo strany Zhotoviteľa za hrubé porušenie tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ, ktorého sa bude týkať návrh na jeho schválenie a výmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia úspešného uchádzača (zhotoviteľa) rovnakom rozsahu ako boli požadované vo výzve na predkladanie ponúk. V prípade, že finančný objem subdodávky prekročí zákonom stanovený limit 100 000,00 € bez DPH, subdodávateľ, ktorý bude realizovať takúto subdodávku musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 13.3.3 Zhotoviteľ je povinný vymeniť, svojich subdodávateľov, a to v prípadoch ak subdodávateľ:
- zanikol
 - stratil oprávnenie na výkon činností, ktoré sú predmetom subdodávky predmetu tejto zmluvy

- pri plnení predmetu tejto zmluvy hrubým spôsobom porušuje svoje odborné povinnosti, pričom bol na to preukázateľne písomne upozornený no napriek tomu nedošlo k zjednaniu nápravy. Táto skutočnosť sa preukazuje listinným dôkazom

V takom prípade musí zhotoviteľ predmetné práce zadať novému subdodávateľovi, pričom je však povinný vopred získať súhlas na nového subdodávateľa od Objednávateľa a stavebného dozora. V prípade že ich zadá novému subdodávateľovi bez predchádzajúceho odsúhlasenia Objednávateľom, bude sa jednáť zo strany Zhotoviteľa za hrubé porušenie tejto zmluvy. Každý nový subdodávateľ, ktorého sa bude týkať návrh na jeho schválenie a výmenu, musí spĺňať podmienky osobného postavenia úspešného uchádzača (zhotoviteľa) rovnakom rozsahu ako boli požadované vo výzve na predkladanie ponúk. V prípade, že finančný objem subdodávky prekročí zákonom stanovený limit 100 000,00 € bez DPH, subdodávateľ, ktorý bude realizovať takúto subdodávku musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

13.4. Prevod prínosu zo záväzkov subdodávateľa

- 13.4.1 Ak záväzky subdodávateľa časovo presahujú dátum ukončenia príslušnej záručnej doby (lehoty pre oznámenie väd) a stavebný dozor pred týmto dátumom vydá zhotoviteľovi pokyn, aby previedol prínos z týchto záväzkov na objednávateľa, vrátane prevodu záruky zo zodpovednosti za vady, potom je zhotoviteľ povinný tak urobiť. Pokiaľ nie je v tomto prevode stanovené inak, nebude mať zhotoviteľ voči objednávateľovi žiadne záväzky za prácu vykonanú subdodávateľom potom, čo tento prevod nadobudol účinnosť.

13.5. Spolupráca

- 13.5.1 Podľa pokynov zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora stavby, je zhotoviteľ povinný zaistiť vhodné podmienky pre vykonávanie prác:
- a) zamestnancom objednávateľa,
 - b) všetkým ďalším zhotoviteľom zamestnávaným objednávateľom,
 - c) zamestnancom všetkých legálne zriadených verejných orgánov, teda osôb, ktoré môžu byť zamestnané pri vykonávaní nejakej práce na stavenisku alebo v jeho okolí, ktorá nie je zahrnutá v zmluve (na danú zákazku).

13.6. Vytýčovanie

- 13.6.1 Zhotoviteľ vytýči dielo prostredníctvom osoby poverenej výkonom funkcie geodeta stavby podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených v Zmluve, projektovej dokumentácii, ktorú dopracoval zhotoviteľ alebo oznámených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie všetkých častí stavebného diela a je povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení, výškach, rozmeroch alebo vo vedení trasy stavebného diela.
- 13.6.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na vlastné náklady zabezpečiť oprávneným geodetom stavby na stavenisku vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov. Je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt a je povinný sa o prevzaté body starať až do odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
- 13.6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vytýčenie takým spôsobom, aby sa práce vykonali na pozemkoch, alebo pod nimi, ktoré sú majetkoprávne vysporiadané a nie sú v rozpore s povoleniami stavby

13.7. Bezpečnostné postupy

- 13.7.1 Zhotoviteľ je povinný:
- a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy a zaviesť systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa OHSAS 18001,
 - b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na stavenisku,
 - c) vynakladať primerané úsilie na to, aby na stavenisku neboli zbytočné prekážky a tak sa zabránilo ohrozeniu týchto osôb,
 - d) zabezpečiť oplotenie, osvetlenie, ochranu a stráženie stavebného diela, až do jeho dokončenia a prebratia podľa článkov Preberanie stavby objednávateľom v časti "E",

- e) zabezpečiť všetky dočasné objekty (vrátane ciest, chodníkov, zábradlí a plotov), ktoré môžu byť potrebné (z titulu realizácie stavby) pre užívanie a ochranu verejnosti, vlastníkov a nájomcov príľahlých pozemkov.

13.8. Zabezpečenie kvality

- 13.8.1 Zhotoviteľ je povinný zaviesť systém zabezpečenia kvality ISO 9001, čím bude demonštrovať súlad s požiadavkami Zmluvy. Systém musí zodpovedať podrobnostiam uvedeným v Zmluve alebo jej prílohách. Zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor bude oprávnený preskúmať akýkoľvek aspekt systému.
- 13.8.2 Podrobnosti všetkých postupov a dokumenty o zhode sa musia kvôli informácii odovzdať stavebnému dozorovi predtým, než začne každá z projektových a realizačných fáz stavby. Keď sa pre stavebného dozora vydáva akýkoľvek dokument technickej povahy, musí byť na tomto dokumente uvedený dôkaz o predchádzajúcom schválení samotným zhotoviteľom.
- 13.8.3 Súlad so systémom zabezpečenia kvality nezabavuje zhotoviteľa žiadnej z jeho povinností alebo zodpovedností podľa Zmluvy.

13.9. Údaje o stavenisku

- 13.9.1 Objednávateľ poskytol v rámci súťaže zhotoviteľovi všetky údaje a dokumenty, ktoré má k dispozícii. Prípadné ďalšie údaje a dokumenty, ktoré zhotoviteľ potrebuje na realizáciu predmetu tejto zmluvy si zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí sám.
- 13.9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy dôkladne oboznámil s podmienkami vykonávania diela a nezistil žiadne prekážky na jeho strane znemožňujúce vykonanie diela. Ak si nevykonal obhliadku na tvare miesta v rámci súťaže a tým sa neoboznámil s podmienkami vyplývajúcimi len z fyzickej obhliadky má sa za to, že tak vykonal svojvoľne a na svoj úkor a dobrovoľne a má sa za to, ako by sa s nimi oboznámil. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a povolenie na vykonanie diela a zabezpečí, aby aj jednotliví jeho subdodávatelia mali odbornú spôsobilosť a povolenia na vykonanie príslušnej časti diela.
- 13.9.3 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že dohodnutá lehota na vykonanie diela i dohodnutá cena za vykonanie diela zohľadňujú osobitné podmienky miesta vykonávania diela, vrátane klimatických podmienok v čase uzavretia tejto zmluvy.

13.10. Primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny

- 13.10.1 Bude sa mať za to, že zhotoviteľ:
- a) bol uspokojený, pokiaľ ide o správnosť a primeranosť akceptovanej zmluvnej ceny

13.11. Nepredvídateľné fyzické podmienky

- 13.11.1 Ak sa zhotoviteľ stretne s fyzickými podmienkami, ktoré považuje za nepredvídateľné z vyššej moci, oznámi túto skutočnosť stavebnému dozorovi, ihneď ako je to možné. V tomto oznámení popíše fyzické podmienky vyššej moci tak, aby mohli byť preverené stavebným dozorom a uvedie dôvody, prečo ich zhotoviteľ považuje za nepredvídateľné z dôvodu vyššej moci. Zhotoviteľ pokračuje v realizácii stavby za použitia všetkých náležitých a primeraných prostriedkov, ktoré sú vhodné pre dané fyzické podmienky a splní všetky pokyny, ktoré mu dá stavebný dozor.
- 13.11.2 Po prijatí tohto oznámenia a prekontrolovaní a/alebo preskúmaní týchto fyzických podmienok, bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol či a pokiaľ áno, tak do akej miery boli tieto fyzické podmienky nepredvídateľné z dôvodu vyššej moci a o záležitostiach popísaných vyššie v súvislosti s touto mierou.
- 13.11.3 Stavebný dozor môže zobrať do úvahy akýkoľvek dôkaz o fyzických podmienkach predvídateľných z dôvodu vyššej moci zhotoviteľom, ktorý môže byť predložený zhotoviteľom, ale nebude žiadnym takým dôkazom viazaný.

13.12. Prístupové práva a zariadenia zhotoviteľa

- 13.12.1 Zhotoviteľ ponese všetky náklady a poplatky za zvláštne a/alebo dočasné prístupové práva, ktoré potrebuje, vrátane tých, ktoré sa týkajú prístupu na stavenisko. Zhotoviteľ tiež získa na

svoje riziko a náklady všetky ďalšie technické zariadenia mimo staveniska, ktoré môže potrebovať pre účely stavby.

13.13. Zamedzenie prekážkam

13.13.1 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:

- a) prevádzkovanie zariadení objednávateľa, ktoré nie sú stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác bude koordinovať so zástupcom vo veciach technických alebo stavebným dozorom,
- b) prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo vlastníctve objednávateľa alebo iných osôb alebo
- c) pohodlie verejnosti.

13.13.2 Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda v prípade dôsledkov takéhoto zbytočného alebo nevhodného obmedzovania.

13.14. Prístupové cesty

13.14.1 Bude sa mať za to, že zhotoviteľ bol uspokojený, pokiaľ ide o vhodnosť a dostupnosť prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie na to, aby sa zabránilo poškodeniu všetkých ciest alebo mostov v dôsledku dopravy zhotoviteľa alebo jeho zamestnancov. Toto úsilie zahŕňa používanie vhodných vozidiel a trás.

13.14.2 Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak:

- a) zhotoviteľ bude (rovnako ako je to medzi stranami) zodpovedný za údržbu, ktorá môže byť požadovaná preto, lebo používa prístupové cesty,
- b) zhotoviteľ poskytne všetky potrebné značky alebo smerovky na prístupových cestách a získa všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi na to aby mohol používať cesty, značky a smerovky,
- c) objednávateľ nebude zodpovedný za žiadne požiadavky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku používania prístupových ciest, a
- d) objednávateľ neručí za vhodnosť ani dostupnosť určitých prístupových ciest a
- e) náklady spôsobené nevhodnosťou alebo nedostupnosťou prístupových ciest (pre používanie) požadovaných zhotoviteľom bude znášať zhotoviteľ.

13.15. Dodanie vybavenia

13.15.1 Pokiaľ nie je v Zvláštnych podmienkach uvedené inak:

- a) zhotoviteľ preukázateľne oznámi stavebnému dozorovi najmenej 3 pracovné dni pred dátumom dodávky, kedy bude na stavenisko dodané nejaké technologické zariadenie alebo významnejšia položka iného vybavenia,
- b) zhotoviteľ bude zodpovedný za balenie, naloženie, prepravu, dodávku, vyloženie, skladovanie a ochranu všetkého vybavenia a ďalších vecí vyžadovaných pre stavbu
- c) zhotoviteľ odškodní objednávateľa a zabezpečí, aby mu nevznikla škoda následkom poškodenia, spôsobeného prepravou vybavenia a prerokuje a zaplatí všetky požiadavky (škody), ktoré vznikli jeho prepravou.

13.16. Zariadenie zhotoviteľa

13.16.1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky svoje zariadenia. Keď budú dopravené na stavenisko, bude sa mať za to, že výhradným účelom zariadenia zhotoviteľa je realizácia stavby. Zhotoviteľ neodstráni zo staveniska žiadne svoje významnejšie zariadenie bez súhlasu stavebného dozoru. Jedinou výnimkou je, že súhlas sa nebude vyžadovať pre vozidlá dopravujúce zariadenie alebo personál zhotoviteľa zo staveniska.

13.17. Ochrana životného prostredia

13.17.1 Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (ako na stavenisku aj mimo neho) a na zamedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku spôsobeného znečistením, hlukom a ďalšími následkami jeho činnosti.

13.17.2 Zhotoviteľ zabezpečí, aby emisie a povrchové znečistenia spôsobené jeho činnosťou nepresiahli hodnoty stanovené v technicko-kvalitatívnych podmienkach, ani hodnoty predpísané zodpovedajúcimi právnymi predpismi.

13.18. Elektrina, voda a plyn

13.18.1 Zhotoviteľ bude zodpovedný za zabezpečenie si energie, vody a ďalších služieb, ktoré bude potrebovať a to na svoje náklady.

13.18.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady a riziko všetky prístroje potrebné pre používanie týchto služieb, vrátane merača na meranie spotrebovaného množstva príslušného média a uzavretie zmluvy s dodávateľom týchto médií na dobu do odovzdania a prevzatia diela.

13.19. Správy o postupe prác

13.19.1 Zhotoviteľ pripraví každý mesiac správy o postupe prác a predloží ich stavebnému dozorovi v troch kópiách.

13.19.2 Každá správa bude obsahovať:

- a) podrobné popisy postupu prác, dokumentáciu zhotoviteľa, obstarávanie, výrobu, dodávku na stavenisko, výstavbu, montáž a skúšanie a tiež bude zahŕňať tieto štádia pre všetky práce vykonané podzhotoviteľmi,
- b) fotografie dokumentujúce stav výroby a vývoj na stavenisku,
- c) pri každej dôležitej položke technologického zariadenia a materiálov meno výrobcu, miesto výroby, percentuálny stav a skutočné alebo očakávané údaje o nakládke a dodaní na stavenisko,
- d) kópie dokumentov o zabezpečení kvality, výsledky skúšok a certifikáty materiálov,
- e) zoznam požiadaviek podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" a požiadaviek predložených podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C",
- f) bezpečnostné štatistiky, vrátane podrobností o akýchkoľvek nebezpečných nehodách a činnostiach, ktoré sa vzťahujú k životnému prostrediu a verejnosti a
- g) porovnanie skutočného a plánovaného postupu s podrobnosťami o všetkých udalostiach, alebo okolnostiach, ktoré by mohli ohroziť dokončenie v súlade so Zmluvou a o opatreniach, ktoré sú (alebo budú) prijaté na prekonanie oneskorenia.

13.20. Zabezpečenie staveniska

13.20.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať prístup na stavenisko a povolané osoby sa musia obmedziť na personál zhotoviteľa a personál objednávateľa a všetok ďalší personál, oznámený objednávateľovi zhotoviteľom alebo stavebným dozorom ako oprávnený personál ďalších zhotoviteľov. Zabezpečenia staveniska zhotoviteľom musí byť zrealizované tak, aby nebolo narušené užívanie ostatných častí stavby, najmä pokiaľ ide o vybudovanie prechodov, stavebných prepážok a pod..

13.21. Činnosť zhotoviteľa na stavenisku

13.21.1 Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať a ktoré zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor odsúhlasí ako pracovné priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie a personál zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch a aby nezaberal príslušné pozemky a priestory.

13.21.2 Počas doby vykonávania prác sa zhotoviteľ postará o to, aby na stavenisku neboli žiadne zbytočné prekážky a zabezpečí skladovanie, rozmiestnenie alebo odstránenie všetkých zariadení zhotoviteľa alebo prebytočného materiálu. Zhotoviteľ vyčistí stavenisko a odstráni z neho všetok odpad, suť a dočasné zariadenia, ktoré už ďalej nie sú potrebné.

13.21.3 K termínu vydania Preberacieho protokolu zhotoviteľ vyčistí tú časť staveniska a stavby, na ktoré sa preberací protokol vzťahuje a odstráni z nich všetky zariadenia zhotoviteľa, prebytočný materiál, sutiny, odpad a dočasné konštrukcie. Zhotoviteľ zanechá túto časť staveniska a stavby čistou a bezpečnú. Avšak zhotoviteľ môže počas záručnej doby ponechať na stavenisku na vlastné riziko a nebezpečenstvo také vybavenie, ktoré je pre neho potrebné na splnenie záväzkov na základe Zmluvy a to v priestoroch dohodnutých so stavebným dozorom.

13.21.4 Zhotoviteľ bude môcť vykonávať práce len v nasledujúcich dňoch a hodinách:

- v pracovné dni v čase od 07:00 hod. do 18:00 hod.
- v dňoch pracovného voľna v čase od 08:00 do 16:00 hod.

- v dňoch štátnych a štátom uznaných cirkevných sviatkov sa budú môcť vykonávať práce len na základe osobitného povolenia Objednávateľa.

13.22. Nálezy na stavenisku

- 13.22.1 Všetky fosílie, mince, cenné alebo starožitné predmety a objekty a iné pozostatky alebo predmety geologicky a archeologicky zaujímavé nájdené na stavenisku budú odovzdané do starostlivosti a právomoci objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie personálu zhotoviteľa alebo iným osobám, aby odstránili alebo poškodili niektoré z týchto nálezov.
- 13.22.2 Zhotoviteľ po objavení takýchto nálezov ihneď podá oznámenie stavebnému dozorovi, ktorý vydá pokyn ako sa s nimi má zaobchádzať. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie v dôsledku plnenia týchto pokynov, odovzdá zhotoviteľ ďalšie oznámenie stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty za každé takéto oneskorenie ak dokončenie je alebo bude preukázateľne oneskorené z tohto dôvodu podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E".
- 13.22.3 Po obdržaní tohto ďalšieho oznámenia bude zástupca pre veci technické spolu so stavebným dozorom postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

MENOVANÍ SUBDODÁVATELIA

14.1. Platby menovaným subdodávateľom

- 14.1.1. Zhotoviteľ zaplatí menovanému subdodávateľovi čiastky, o ktorých stavebný dozor potvrdí, že sú v súlade so zmluvou.

14.2. Preukázanie platieb

- 14.1.1. Pred vydaním potvrdenia faktúry, ktoré zahrňuje aj čiastku splatnú menovanému subdodávateľovi, stavebný dozor môže požadovať, aby zhotoviteľ poskytol primeraný dôkaz o tom, že menovaný subdodávateľ obdržal všetky čiastky splatné podľa predchádzajúcich potvrdení faktúr. Zhotoviteľ bude v takomto prípade povinný do 7 dní od požiadavky stavebného dozora poskytnúť stavebnému dozoru takýto doklad. V prípade že zhotoviteľ nepreukáže v stanovenom termíne, že uhradil pohľadávky subdodávateľa za túto stavbu, objednávateľ bude mať právo tieto uhradiť priamo zo zábezpeky zhotoviteľa uvedenej v bode 13.2.1 časti „E“.

TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY

15.1. Spôsob vykonávania prác

- 15.1.1. Zhotoviteľ je povinný obstarat' technologické zariadenia, pomôcky a materiál a ďalej vykonávať práce:
- a) spôsobom uvedeným v Zmluve a jej prílohách,
 - b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou dobrou praxou.

15.2. Vzorky

- 15.4.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov a potrebné informácie na odsúhlasenie predtým, než budú materiály zabudované alebo použité na stavbe:
- a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu, a to na náklady zhotoviteľa,
 - b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného dozora, čo bude chápané ako zmena.
- 15.2.2. Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe.

15.3. Kontrola

- 15.3.1. Zamestnanci objednávateľa budú v akúkoľvek potrebnú dobu:
- a) mať plný prístup do všetkých častí staveniska,
 - b) v priebehu výstavby (na stavenisku a kdekoľvek inde) sú oprávnení preverovať, kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výstavby.

- 15.3.2. Zhotoviteľ poskytne zamestnancom objednávateľa plné možnosti pri vykonávaní týchto činností vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné vybavenie. Žiadna táto činnosť nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti.
- 15.3.3. Zhotoviteľ preukázateľne oznámi zástupcovi pre veci technické a stavebnému dozorovi vždy, keď bude nejaká práca pripravená a pred tým, než bude zakrytá a nebude ju možné vidieť. Zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor potom bez zbytočného odkladu vykoná buď podrobnú prehliadku, kontrolu, meranie alebo skúšanie, alebo oznámi zhotoviteľovi, že to nevyžadujú. Ak to zhotoviteľ neoznámi, potom je povinný, ak je o to zástupcom pre veci technické alebo stavebným dozorom požiadany, odkryť prácu, upraviť a uviesť ju do pôvodného stavu, to všetko na vlastný náklad.

15.4. Skúšky

- 15.4.1. Tento článok bude platiť pre všetky skúšky uvedené v Zmluve okrem preberacích skúšok.
- 15.4.2. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska predloží stavebnému dozorovi na schválenie kontrolný a skúšobný plán, ktorý bude obsahovať minimálne :
- a) popis kontrolovaného alebo skúšaného zariadenia
 - b) druh vykonávanej skúšky
 - c) periodicitu
 - d) právny predpis na základe ktorého sa skúška požaduje alebo preukazuje
 - e) aký bude výstupný doklad zo skúšky alebo kontroly
 - f) prípadne iné informácie ak to je potrebné

Tento plán bude obsahovať zoznam všetkých príslušných kontrol a skúšok ktoré budú na stavbe potrebné za účelom preukázania kvalitatívnych parametrov a to vyplývajúcich či už z platných právnych predpisov, alebo ktoré zhotoviteľ alebo stavebný dozor považujú za potrebné na preukázanie kvalitatívnych parametrov.

stavebný dozor bude mať 14 dní na schválenie predloženého kontrolného a skúšobného plánu, alebo na jeho vrátenie zhotoviteľovi na dopracovanie. Stavebným dozorom schválený kontrolný a skúšobný plán bude záväzný pre vykonávanie skúšok počas plnenia zmluvy. Skúšky a kontroly uvedené v tomto schválenom skúšobnom a kontrolnom pláne bude možné vykonávať až po jeho schválení stavebným dozorom.

- 15.4.8. Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie, elektrinu, svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivá, nástroje, pracovné sily, materiál a zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie skúšok. Zhotoviteľ spolu so alebo stavebným dozorom odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného technologického zariadenia, materiálov alebo iných častí stavby.
- 15.4.9. Stavebný dozor môže podľa článkov Zmeny a úpravy v časti "E" zmeniť miesto alebo detaily určitých skúšok, alebo môže vydať pokyn zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky. Ak tieto pozmenené alebo dodatočné skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, materiály alebo práce nie sú v súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať zhotoviteľ, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy.
- 15.4.10. Zhotoviteľ preukázateľne oznámi zástupcovi objednávateľa pre veci technické a stavebnému dozorovi minimálne 7 dní pred plánovaným začatím skúšok plánovaný dátum a hodinu ich začatia. Ak sa zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor bez vážneho dôvodu nedostaví na dohodnuté miesto v dohodnutom čase, môže zhotoviteľ uskutočniť skúšky (ak nedostal od zástupcu pre veci technické alebo stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa budú považovať za vykonané v prítomnosti stavebného dozora.
- 15.4.11. Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady plynúce z toho, že vykonával pokyny zástupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od pokračovania v skúškach) alebo v dôsledku oneskorenia, za ktoré zodpovedá objednávateľ, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty výstavby v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ dokončenie diela je alebo bude preukázateľne oneskorené z tohto dôvodu, podľa podčlánkoch Predĺženie lehoty výstavby v časti "E".

- 15.4.12. Po obdržaní tohto oznámenia stavebný dozor bude postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo rozhodol.
- 15.4.13. Zhotoviteľ dodá stavebnému dozorovi bezodkladne riadne potvrdené správy o skúškach. Ako náhle boli požadované skúšky uskutočnené, stavebný dozor potvrdí zhotoviteľovi správy o skúškach.
- 15.4.14. V prípade ak predmetom zákazky sú aj zemné práce obsahujúce zásypy, násypy alebo iné terénne úpravy (napr. spätné zásypy výkopov, výstavba chodníkov alebo komunikácií a pod.) a v prípade že platný právny predpis stanovuje alebo vyžaduje meranie zásypov alebo podloží (ľahká dynamická skúška a statická záťažová skúška) sa budú vykonávať zariadením, ktoré bude elektronicky merať, elektronicky zaznamenávať priebeh merania a elektronicky publikovať alebo vyhodnocovať priebeh skúšok, a zabezpečí printový výstup priebehu a hodnôt merania a zároveň umožní sledovanie meraných hodnôt a priebehu skúšky z elektronického zariadenia počas skúšky z displeja, alebo monitora prístroja priamo počas celého vykonávania skúšky.
- 15.5. Odmietnutie**
- 15.5.1. Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor zistí, že niektoré technologické zariadenia, materiály alebo práca sú závadné, alebo inak nezodpovedajú požiadavkám Zmluvy, môže zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor technologické zariadenia, materiál alebo prácu odmietnuť tak, že to oznámi zhotoviteľovi spolu s udaním dôvodu. Potom je zhotoviteľ povinný vadu bezodkladne odstrániť a zaistiť, aby odmietnutá položka bola v súlade so Zmluvou.
- 15.5.2. Ak zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor požaduje, aby bolo toto technologické zariadenie, materiály alebo práce následne znovu preskúšané, budú sa skúšky za rovnakých podmienok opakovať. Ak odmietnutie a opakované skúšanie spôsobí objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí zhotoviteľ podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" tieto náklady objednávateľovi.
- 15.6. Opravné práce**
- 15.6.1. Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu môže zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor vydať zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby:
- odstránil zo staveniska všetky technologické zariadenia alebo materiály, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,
 - odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,
 - vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť diela, či už z dôvodu nehody, nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu.
- 15.6.2. Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovená v príkaze alebo okamžite, ak je stanovená bezodkladnosť podľa pododstavca (c).
- 15.6.3. Ak zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz, bude objednávateľ oprávnený zamestnať iné osoby, ktoré prácu vykonajú. Okrem sumy, ktorá by predstavovala nároky zhotoviteľa na platbu za prácu, bude zhotoviteľ povinný podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" uhradiť objednávateľovi všetky náklady plynúce z tohoto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia).
- 15.7. Poplatky**
- 15.6.1. Ak nie je v technicko-kvalitatívnych podmienkach stanovené ináč, zaplatí zhotoviteľ všetky poplatky, výpožičné a ďalšie platby za:
- prírodné materiály získané mimo staveniska a
 - odvoz materiálov po demoláciách a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov, okrem prípadu kedy sa priestory pre ich uloženie nachádzajú na stavenisku.

ZAČATIE PRÁC, ONESKORENIE A PRERUŠENIE PRÁC

16.1. Začatie prác

- 16.1.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko na základe výzvy objednávateľa a najneskôr do 7 pracovných dní po prevzatí staveniska začať práce v zmysle podmienok tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ oznámi stavebnému dozorovi dátum začatia prác najmenej 7 dní vopred. V prípade neodôvodneného neprevzatia staveniska zo strany zhotoviteľa, bude sa jednať o hrubé porušenie podmienok zmluvy a objednávatel' uplatní sankčné pokuty v zmysle tejto zmluvy. Odôvodnenými podmienkami neprevzatia staveniska, zhotoviteľom sú majetkoprávne nároky tretích osôb, nezabezpečenie vstupu na stavenisko od tretích osôb, kolízie s inžinierskymi sieťami, ktoré nerieši objednávatel'om poskytovaná projektová dokumentácia, vyššia moc. V prípade že odôvodnené podmienky neprevzatia staveniska sa týkajú len časti staveniska, zhotoviteľ bude povinný prevziať tie časti staveniska, ktorých sa odôvodnenými podmienkami neprevzatia staveniska netýkajú. Pri následnom úplnom prevzatí staveniska je zhotoviteľ povinný uviesť toto následné úplné prevzatie staveniska bude mať vplyv na termín ukončenia predmetu zmluvy. V prípade, že si zhotoviteľ uplatní predĺženie termínu z dôvodu úplného prevzatia staveniska a preukáže relevantnosť tohto nároku, termín ukončenia predmetu zmluvy bude možné predĺžiť maximálne o predĺženú lehotu na úplné prevzatie staveniska od čiastočného prevzatia.
- 16.1.2. Zhotoviteľ začne s výstavbou diela okamžite ako je to odôvodnene uskutočniteľné po dátume začatia prác a potom bude so stavbou postupovať so zodpovedajúcou rýchlosťou a bez odkladu a podľa časového harmonogramu realizácie jednotlivých činností podľa časti "G" tejto zmluvy o dielo.
- 16.2. Lehota výstavby**
- 16.2.1. Zhotoviteľ dokončí celý predmet v lehote podľa čl. IV. časti "A" tejto Zmluvy v lehote vrátane:
- úspešného výsledku preberacích skúšok a
 - dokončenie všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve tak, ako sa to vyžaduje, aby bola stavba podľa považovaná za dokončenú pre účely prevzatia podľa podčlánkov Preberacie konanie v časti "E"
- 16.3. Harmonogram prác**
- 16.3.1. Časový harmonogram jednotlivých činností vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby je v rámci zmluvy vypracovaný ako úsečkový pre každý fakturačný celok. Okrem realizácie činností jednotlivých fakturačných celkov je z neho zrejmé, kedy a v akom časovom horizonte bude realizované vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby. Ďalej je z neho zrejmé, kedy sa s konkrétnou aktivitou (v týždňoch od odovzdania staveniska) začne, koľko dní bude trvať, a kedy sa ukončí v zmysle podmienok zmluvy (týždeň a mesiac)
- 16.3.2. Keďže nebolo možné vopred predpokladať, kedy bude ukončená súťaž, a v ktorom časovom úseku kalendárneho roka obdrží objednávatel' finančné prostriedky na spolufinancovanie zákazky, bude mať zhotoviteľ právo v prípade, ak bude časový harmonogram realizácie jednotlivých činností podľa časti "G" tejto zmluvy o dielo v rozpore s možnými klimatickými pomermi zimného obdobia pre dané územie, predložiť zástupcovi objednávatel'a a stavebnému dozorovi v lehote do 14 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska na odsúhlasenie aktualizovaný časový harmonogram realizácie jednotlivých činností (v časti "G" Zmluvy). Aktualizovaný harmonogram musí obsahovo aj vecne byť zhodný s pôvodným, časovo sa pripúšťajú zmeny len v častiach, kde technologické procesy nie sú zlučiteľné s klimatickými podmienkami zimného obdobia pre dané územie, pričom celková lehota podľa článku IV. časti "A" Zmluvy o dielo musí byť zachovaná.
- 16.3.2. Po ich odsúhlasení Objednávatel'om a stavebným dozorom sa tieto stanú záväznými pre realizáciu predmetu zmluvy a nahradia pôvodné dokumenty zmluvy.
- 16.3.3. Zhotoviteľ predložil objednávatel'ovi časový harmonogram realizácie jednotlivých činností (ďalej môže byť len harmonogram) ako súčasť ponuky v rámci súťaže.
- 16.3.4. Harmonogram podľa predchádzajúceho bodu bude obsahovať:
- postup, ktorým chce zhotoviteľ realizovať stavbu, dokumentáciu zhotoviteľa, postupu zadávania subdodávok, dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a odskúšania,
 - všetky tieto štádia práce vykonávané každým z menovaných subdodávateľov tak, ako sú definované v článkoch Menovaní subdodávateľa v časti "E",

- c) sled a načasovanie prehliadok a skúšok a
- d) sprievodnú správu, ktorá obsahuje:
 - i. všeobecný popis metód, ktorý zhotoviteľ mieni použiť, popis hlavných etáp vykonávaných prác a
 - ii. podrobnosti, ukazujúce zhotoviteľov odôvodnený odhad počtu pracovníkov zhotoviteľa v každej kategórii a všetkých typov zariadení zhotoviteľa, ktoré sa požadujú na stavenisku v každej z hlavných etáp.

16.4. Predĺženie lehoty výstavby

16.4.1. Zhotoviteľ bude mať podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" právo na predĺženie lehoty výstavby do tej miery, v akej dokončenie pre účely podčlánkoch Preberacie konanie v časti "E" je alebo bude oneskorené preukázateľne z niektorých nasledujúcich dôvodov:

- a) V prípade vyššej moci
- b) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené objednávateľom alebo personálom objednávateľa alebo inými zhotoviteľmi (objednávateľ) na stavenisku.

Predĺženie lehoty výstavby nad rámec lehoty podľa tejto zmluvy však podlieha predbežnému schváleniu Poskytovateľom finančnej podpory.

16.4.2. Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predĺženie lehoty výstavby, oznámi to stavebnému dozorovi v súlade s podčlánkami Požiadavky zhotoviteľa v časti "C". Pri určovaní každého predĺženia lehoty podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C", skontroluje stavebný dozor všetky predchádzajúce rozhodnutia a môže celkové predĺženie lehoty zvýšiť, nie však znížiť. Konečné odsúhlasenie zvýšenie lehoty výstavby podlieha schváleniu a podpisu dodatku k ZoD obidvomi zmluvnými stranami.

16.5. Oneskorenie spôsobené úradmi

16.5.1. Tým, že objednávateľ odovzdal všetku dokumentáciu, ktorú má k dispozícii zhotoviteľovi ešte v rámci súťaže a všetky ostatné činnosti zabezpečuje alebo vykonáva zhotoviteľ (aj styk s úradmi na zabezpečenie predmetu zmluvy), oneskorenie spôsobené úradmi ide na vrub zhotoviteľa.

16.6. Rýchlosť postupu

16.6.1. Ak kedykoľvek postup sa spomalil oproti platnému harmonogramu podľa podčlánkov Harmonogram prác v časti "E" z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v podčlánkoch Predĺženie lehoty výstavby v časti "E", potom môže stavebný dozor vydať zhotoviteľovi príkaz, aby podľa podčlánkoch Harmonogram prác v časti "E" predložil revidovaný harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované metódy, ktoré chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil ukončenie stavby v rámci lehoty výstavby.

16.6.2. Ak neoznámí stavebný dozor niečo iné, prijme zhotoviteľ revidované metódy, ktoré môžu vyžadovať predĺženie pracovnej doby a/alebo nárast počtu pracovníkov zhotoviteľa a /alebo zvýšenie vybavenia na riziko a náklady zhotoviteľa. Ak tieto revidované metódy spôsobia objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí zhotoviteľ podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" tieto náklady objednávateľovi, spolu s odškodnením za oneskorenie (ak nastane) podľa podčlánkov Odškodnenie za oneskorenie v časti "E".

16.7. Odškodnenie za oneskorenie

16.7.1. Ak zhotoviteľ nebude konať v súlade s podčlánkami Lehota výstavby časti "E" a článku IV: časti "A", je objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi účtovať za tento nedostatok zmluvnú pokutu vo výške špecifikovanej v podčlánkov Zmluvné sankcie v časti "C". Tým nie dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním zhotoviteľa.

16.7.2. Toto odškodnenie nezavahuje zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovedností, ktoré môže mať podľa zákona lebo Zmluvy.

16.8. Prerušenie prác

16.8.1. Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe alebo jej časti. V priebehu tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť, uchovávať a

zabezpečovať stavbu alebo časť stavby pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením.

- 16.8.2. Stavebný dozor tiež oznámi príčinu prerušenia. Ak, a do tej miery ako je príčina ohlásená a zodpovedá za ňu zhotoviteľ, alebo je ním spôsobená, neplatia nasledujúce podčlánky Následky prerušenia v časti "E" a Predĺženie prerušenia v časti "E".

16.9. Následky prerušenia

- 16.9.1. Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozoru podľa podčlánkov Prerušenie prác v časti "E" a/alebo tým, že znovu začal s prácou, oznámi to zhotoviteľ stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty v dôsledku každého takého oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie preukázateľne oneskorené z tohto dôvodu, podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E". Po obdržaní tohto oznámenia bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E", aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

- 16.9.2. Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie lehoty ani na zaplatenie vzniknutých nákladov v prípade nápravy chybnéj práce alebo materiálov zhotoviteľa alebo v prípade, že zhotoviteľ nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil dielo podľa podčlánkov Prerušenie práce v časti "E".

16.10. Predĺženie prerušenia

- 16.10.1. Ak na diele podľa článkov Prerušenie práce v časti "E" trvá viac než 84 dní, môže zhotoviteľ požiadať stavebný dozor o povolenie pokračovať v práci. Ak stavebný dozor nevydá povolenie do 28 dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže zhotoviteľ, ak to oznámi stavebnému dozoru, považovať toto prerušenie za nevykonanie dotknutej časti stavby podľa článkov Zmeny a dodatky. Ak prerušenie zasiahne celú stavbu, môže zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy o dielo podľa článkov Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa v časti "C".

16.11. Pokračovanie v práci

- 16.11.1. Po vydaní povolenia alebo príkazu k pokračovaniu v práci, skontroluje stavebný dozor a zhotoviteľ spoločne stavbu, technologické zariadenia a materiály, ktorých sa prerušenie prác týkalo. Zhotoviteľ napraviť všetky schátrania alebo vady či straty na stavbe, alebo v technologických zariadeniach a materiáloch, ak k nim došlo v priebehu prerušenia prác.

PREBERACIE SKÚŠKY

17.1. Povinnosti zhotoviteľa

- 17.1.1. Zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky v súlade s týmto článkom a podčlánkami Skúšky v časti "E" po tom, čo poskytol dokumenty v súlade s podčlánkami Všeobecné povinnosti zhotoviteľa v časti "E".
- 17.1.2. Zhotoviteľ oznámi stavebnému dozoru dátum, po ktorom bude pripravený vykonať každú z preberacích skúšok, 10 dní vopred. Ak nie je dohodnuté inak, budú preberacie skúšky uskutočnené najneskôr do 14 dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch určených stavebným dozorom.
- 17.1.3. Pri zvažovaní výsledkov preberacích skúšok prihliadne stavebný dozor k účinku akéhokoľvek užívania stavby objednávateľom pri prevádzke alebo k iným vlastnostiam stavby. Ako náhle stavba, alebo časť stavby prejde niektorými preberacími skúškami, odovzdá zhotoviteľ overenú správu o výsledkoch týchto skúšok stavebnému dozoru.

17.2. Odklad skúšok

- 17.2.1. Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené objednávateľom, budú platiť podčlánky Skúšky v časti "E" a/alebo podčlánky Prekážky vykonania preberacích skúšok v časti "E".
- 17.2.2. Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené zhotoviteľom, môže stavebný dozor oznámením požiadať zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do 3 pracovných dní po tom, čo obdržal oznámenie. Zhotoviteľ vykoná skúšky v deň alebo v dňoch v tejto lehote, ako to zhotoviteľ stanoví a oznámi stavebnému dozoru.

17.2.3. Ak zhotoviteľ nevykoná skúšky do 21 dní, môže k skúškam pristúpiť personál objednávateľa na riziko a náklady zhotoviteľa. Potom sa bude mať za to, že preberacie skúšky boli vykonané za prítomnosti zhotoviteľa a výsledky skúšok budú akceptované ako správne.

17.3. Opakovanie skúšok

17.3.1. Ak stavba, alebo časť stavby neprejde preberacími skúškami, budú platiť podčlánky Odmietnutie v časti "E" a stavebný dozor alebo zhotoviteľ môžu požadovať, aby sa skúšky a tiež preberacie skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali.

17.4. Neúspešné preberacie skúšky

17.4.1. Keď stavba neprejde opakovanými preberacími skúškami podľa podčlánkov Opakovanie skúšok v časti "E", bude stavebný dozor oprávnený :

- a) nariadiť ďalšie opakovanie preberacích skúšok. Opakovanie skúšok v časti "E";
- b) keď neúspech skúšok zbavuje objednávateľa v podstate celého úžitku zo stavby, alebo časti stavby, odmietnuť stavbu, alebo časť stavby (podľa okolností) a v tomto prípade bude mať objednávateľ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje podčlánok 19.5.2 odsek (c) podčlánku Neodstránenie vád v časti "E";
- c) vydať preberací protokol, ak to vyžaduje objednávateľ.
- d) V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v odseku ©, bude zhotoviteľ pokračovať podľa všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena bude znížená o takú čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre objednávateľa v dôsledku tohto neúspechu. Pokiaľ nie je zodpovedajúce zníženie uvedené v Zmluve o dielo (alebo definovaná metóda jeho výpočtu), môže objednávateľ požadovať, aby zníženie bolo schválené oboma stranami (tak, aby plne uhradilo len tento neúspech) a zaplatené pred vydaním tohto preberacieho protokolu, alebo stanovené a zaplatené podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" a podčlánkov Rozhodnutia v časti "E".

PREBERANIE STAVBY OBJEDNÁVATEĽOM

18.1. Preberacie konanie

18.1.1. S výnimkou stanovenou podčlámkami Neúspešné preberacie skúšky v časti "E", bude stavba prebratá objednávateľom, keď bola stavba dokončená v súlade so Zmluvou o dielo, vrátane záležitostí popísaných v podčlámkami Lehota výstavby časti E a článku IV. časti "A" a s výnimkou dovoľenou podľa podčlánku 17.4.1. písm. c) uvedenom vyššie v časti "E".

18.1.2. Zhotoviteľ prostredníctvom oznámenia stavebnému dozoru požiada o zvolanie preberacieho konania, nie skôr ako 14 dní predtým, než bude stavba podľa názoru zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu. Výsledkom preberacieho konania po úspešnom ukončení bude vydanie preberacieho protokolu

18.2. Prekážky vykonania preberacích skúšok

18.2.1. Keď je zhotoviteľovi po viac ako 14 dní bránené vo vykonaní preberacích skúšok z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť objednávateľ, bude sa mať za to, že objednávateľ prevzal stavbu, alebo časť stavby (podľa okolností) v deň, kedy by preberacie skúšky inak skončili.

18.2.2. Stavebný dozor potom v súlade s tým vydá preberací protokol a zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky v najkratšom možnom čase pred skončením lehoty na oznámenie vád. Stavebný dozor bude požadovať, aby boli preberacie skúšky vykonané tak, že to oznámi 14 dní vopred a v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami Zmluvy o dielo.

18.2.3. Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku tohto oneskorenia v realizácii preberacích skúšok, oznámi to stavebnému dozoru a vznikne mu nárok podľa podčlánkov Požiadavky zhotoviteľa v časti "C" na predĺženie lehoty v dôsledku tohto oneskorenia podľa podčlánkov Predĺženie lehoty výstavby v časti "E", pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu.

18.3. Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu

18.3.1. Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplatí, že protokol na časť stavby alebo časť prác potvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch vyžadujúcich uvedenie do pôvodného stavu.

18.4. Osobitné podmienky pre prebratie stavby a jej častí

18.4.1. Po dokončení diela, najneskôr však do 21 dní odo dňa oznámenia podľa bodu 18.1.2. časti "E" je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty podľa § 13 a § 14 zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (v platnom znení), ako aj potvrdenie správcu skládky odpadov o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, geometrický plán v 3 vyhotoveniach pre zápis do katastra nehnuteľností a porealizačné zameranie stavby. Porealizačné zamerania stavby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť pomocou osoby oprávnenej realizovať geodetické práce, pričom zhotoviteľ zabezpečí pre digitálne porealizačné zameranie stavby, aby toto digitálne zamerania stavby bolo odovzdané ako súbor (výkres) dgn (Micro-Station). V prípade prevodov z iných súborov je vecou zhotoviteľa, aby zabezpečil korektný prevod.

18.4.2. Zhotoviteľ bude povinný k prebratiu stavby predložiť aj :

- energetický certifikát podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
- a v prípade novostavby, alebo prístavby k jestvujúcej stavbe úradne overený príslušnou správou katastra geometrický plán stavby pre účely kolaudačného konania a zápisu stavby do evidencie katastra nehnuteľností

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

19.1. Zodpovednosť za vady

19.1.1. Zhotoviteľ je povinný riadne vykonať a riadne dokončiť dielo. Dielo je riadne vykonané, ak je vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými stranami, podkladmi pre vykonanie diela a ich záväznými zmenami, príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na dielo a v ich medziach aj v súlade s pokynmi, potrebami a oprávnenými záujmami objednávateľa, ktoré sú zhotoviteľovi známe. Dielo je riadne dokončené, ak sú vykonané všetky práce a dodávky určené v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách.

19.1.2. Dielo trpí vadami, najmä ak dielo nie je riadne vykonané alebo dokončené alebo ak dielo nemá vlastnosti alebo nespĺňa požiadavky vyžadované objednávateľom alebo ak nie je spôsobilé na použitie na účel, ktorému má slúžiť.

19.1.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávateľom, a to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokiaľ zhotoviteľ nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávateľom, ak sú spôsobené porušením povinností zhotoviteľa.

19.1.4. Zhotoviteľ ďalej poskytuje objednávateľovi záruku, že dielo bude spôsobilé na použitie na účel, ktorému má slúžiť, a že si zachová vlastnosti určené v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v príslušných právnych predpisoch a v technických normách, ktoré sa vzťahujú na dielo, a to v trvaní **60 mesiacov** odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Záruka sa rovnako vzťahuje na všetky vykonané práce a dodávky pri vykonávaní diela.

19.1.5. Záručná doba na celé dielo sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od vytknutia vady diela do jej úplného odstránenia, a to aj v prípade, ak sa vada týka iba časti diela, okrem prípadu ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu diela. V takom prípade sa o túto lehotu predlžuje záručná doba len tej časti diela, ktorej sa vytknutá vada týka.

19.1.6. Nároky objednávateľa z väd diela a zo záruky sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník (v znení neskorších predpisov) najmä § 563 až 565. Nároky z väd je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v písomnej forme. Ak objednávateľ požaduje odstránenie väd diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú lehotu na ich odstránenie s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy, ktorú je zhotoviteľ povinný

dodržať; pri závažných vadách diela je zhotoviteľ povinný začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávateľa.

19.2. Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád

19.2.1. Aby bola stavba, dokumentácia zhotoviteľa a každá časť stavby, v stave požadovanom v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí zodpovedajúca lehota pre oznámenie vád alebo odôvodnene čo najskôr, potom zhotoviteľ:

- a) dokončí všetky práce, ktoré zostávajú vykonať k dátumu uvedenom v preberacom protokole v primeranej lehote, podľa pokynov stavebného dozoru a
- b) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia lehoty pre oznámenie vád pre stavbu alebo časť stavby (podľa okolností).

19.3. Náklady na odstránenie vád

19.3.1. Všetky práce uvedené v podčlánku 19.2.1. písm. b) Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád v časti "E", budú vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej miery, v ktorej možno práce pričítať:

- a) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,
- b) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou o dielo, alebo
- c) tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.

19.3.2. Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to zhotoviteľovi okamžite oznámené objednávateľom (alebo v jeho mene) a budú platiť podčlánky Postup pri zmenách v časti "E"

19.4. Predĺženie záručnej doby

19.4.1. Objávateľ bude mať podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" nárok na predĺženie lehoty na oznámenie vád pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia (podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené, z dôvodu vady alebo poškodenia.

19.5. Neodstránenie vád

19.5.1. Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu alebo poškodenie, môže byť objednávateľom stanovený reálny dátum, kedy alebo dokedy má byť vada alebo poškodenie odstránené.

19.5.2. Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu alebo poškodenie neodstráni a tieto nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánkov Náklady na odstránenie vád v časti "E", objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby):

- a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na riziko a náklady zhotoviteľa, avšak zhotoviteľ za túto prácu nenesie žiadnu zodpovednosť a zhotoviteľ podľa podčlánkov Nároky objednávateľa v časti "E" zaplatí objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi pri odstraňovaní vady alebo poškodenia,
- b) požiadať stavebný dozor, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny diela v súlade s podčlánkov Rozhodnutia v časti "E", alebo
- c) ak vada alebo poškodenie zbavuje objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu zo stavby alebo časti stavby, odstúpiť od Zmluvy o dielo ako celku, alebo vo vzťahu ku ktorýmkoľvek častiam stavby, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania. Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa Zmluvy o dielo alebo iné, bude mať potom objednávateľ nárok na vrátenie čiastok zaplatených za celú stavbu alebo jej časti (podľa okolností), plus náklady na financovanie a náklady na demontáž stavby alebo jej časti, upratanie staveniska a vrátenie technologického zariadenia a materiálov zhotoviteľovi.

19.6. Odstránenie vadnej práce

19.6.1. Ak nemôže byť vada alebo poškodenie účinne odstránené na stavenisku a objednávateľ s tým súhlasí, môže zhotoviteľ odviezť zo staveniska pre účely opravy tie súčasti stavby

a technologické zariadenia, ktoré sú vadné alebo poškodené. V tomto súhlase je možné požadovať, aby zhotoviteľ zvýšil čiastku záruky za prevedenie diela o úplné náklady na náhrady tých častí alebo aby poskytol iné vhodné záruky.

19.7. Ďalšie skúšky

19.7.1. Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo poškodenia by mohlo ovplyvniť realizáciu stavby, môže zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor vyžadovať opakovanie akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve o dielo. Táto požiadavka bude oznámená do 28 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.

19.7.2. Tieto skúšky budú vykonané v súlade s podmienkami použitými pre predchádzajúce skúšky okrem toho, že budú vykonané na riziko a náklady strany zodpovednej za náklady na opravné práce podľa podčlánkov Náklady na odstránenie vád v časti "E".

19.8. Právo na prístup

19.8.1. Pokiaľ nie je vydané potvrdenie o vykonaní diela bude mať zhotoviteľ také právo na prístup k stavbe, aké je odôvodnene potrebné k tomu, aby zhotoviteľ vyhovel tomuto článku pokiaľ to neodporuje bezpečnostným obmedzeniam objednávateľa.

19.9. Zhotoviteľove zisťovanie príčiny vady

19.9.1 Ak je o to zhotoviteľ požiadaný zástupcom vo veciach technických alebo stavebným dozorom, bude pod vedením dozoru stavby zisťovať príčinu vady. Ak nemá byť vada odstránená na náklady zhotoviteľa podľa podčlánkov Náklady na odstránenie vád v časti "E", stavebný dozor odsúhlasí alebo určí v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E" náklady na toto zisťovanie, ktoré budú zahrnuté do zmluvnej ceny.

19.10. Protokol o vyhotovení diela

19.10.1. Splnenie povinností zhotoviteľa nebude pokladané za úplné, pokiaľ stavebný dozor zhotoviteľovi nevydá Protokol o vyhotovení diela s uvedením dátumu, kedy zhotoviteľ dokončil svoje povinnosti podľa Zmluvy o dielo.

19.10.2. Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení diela do 14 dní potom, čo skončí posledná z lehôt pre oznámenie vád alebo čo najskôr potom, ako náhle zhotoviteľ poskytne celú dokumentáciu zhotoviteľa o skutočne realizovanej stavbe a dokončí a vyskúša celú stavbu vrátane odstránenia všetkých vád. Jedna kópia potvrdenia o vykonaní diela bude odovzdaná objednávateľovi. Prijatie prác bude dokladať len Protokol o vyhotovení diela.

19.11. Nesplnené záväzky

19.11.1. Potom, čo bolo vydané potvrdenie o vykonaní diela zostáva každá zo strán zaviazaná k splneniu všetkých povinností, ktoré v tejto dobe zostávajú nesplnené. Pre účely stanovenia povahy a rozsahu neuskutočnených povinností sa bude mať za to, že Zmluva o dielo zostáva v platnosti.

19.12. Upratovanie staveniska

19.12.1. Po prebratí potvrdenia o vykonaní diela zhotoviteľ bezodkladne odstráni zostávajúce vybavenie zhotoviteľa, prebytočný materiál, odpad, sutinu a pomocné konštrukcie (dočasné stavby) zo staveniska.

19.12.2. Ak všetky tieto položky nie sú odstránené do 10 dní potom, čo objednávateľ obdržal kópiu potvrdenia o vykonaní diela, môže objednávateľ, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, všetky zbytky predať alebo s nimi naložiť inak. Objednávateľ bude mať nárok na zaplatenie nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto predajom alebo odstránením a rekultiváciou staveniska.

19.12.3. Peňažný zostatok z predaja bude vyplatený zhotoviteľovi. Ak je týchto peňazí menej, než koľko činia náklady objednávateľa, zhotoviteľ uhradí tento rozdiel objednávateľovi.

MERANIE A OCENENIE

20.1. Meranie prác

- 20.1.1. Tento článok Zmluvy bude použitý pri oceňovaní naviac prác a naviac dodávok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Práce budú merané a oceňované pre účely platby v súlade s týmto článkom.
- 20.1.2. Kedykoľvek stavebný dozor požiada o to, aby bola nejaká časť stavby zmeraná, bude to zodpovedajúcim spôsobom oznámené zástupcovi zhotoviteľa, ktorý
- a) v termíne dohodnutom so stavebným dozorom buď sám, ak je na to oprávnený v zmysle platných právnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostredníctvom oprávnenej osoby ak to zmluva umožňuje, vykoná merania prostredníctvom certifikovaného merača s platnou kalibráciou a
 - b) vysvetlí všetky podrobnosti týkajúce sa merania požadované stavebným dozorom.
- Za zmeranie stavby možno považovať najmä: meranie výškového a priestorového usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných sústav, merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla, merania strát v elektrických rozvodoch, merania elektrických izolačných odporov, merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí, merania miery zhutnení zásypov výkopov a plání pod spevnené plochy, merania vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a pod.
- 20.1.3. Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, kedykoľvek budú zhotovované práce merané podľa záznamu budú tieto záznamy pripravené a odovzdané stavebnému dozorovi.
- 20.1.4. Stavebný dozor bude oprávnený vykonať si svoje kontrolné merania, čo mu bude zhotoviteľ povinný umožniť.

20.2. Metóda merania

- 20.2.1. Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak a bez ohľadu na miestnu prax,
- a) bude sa merať netto skutočného množstva každej položky zhotovovaných prác a
 - b) metóda merania bude v súlade s popisom prác alebo inými použiteľnými súvisiacimi dokumentmi.

20.3. Ocenenie

- 20.3.1. Ak nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, bude stavebný dozor postupovať v súlade s podčlánkami Rozhodnutia v časti "E", aby odsúhlasil alebo určil cenu diela tým, že ocení každú položku práce pri použití dohodnutého alebo stanoveného merania v súlade s vyššie uvedenými podčlánkami Meranie a oceňovanie v časti "E" a s použitím príslušnej sadzby alebo ceny za túto položku.
- 20.3.2. Príslušná sadzba alebo cena za každú položku práce bude sadzba alebo cena určená v Zmluve o dielo buď za túto položku alebo (ak tam nie je táto položka uvedená) za podobnú prácu. Pre príslušnú položku bude vhodná nová sadzba alebo cena, ak:
- a)
 - i. merané množstvo položky sa zmení o viac než 10% proti množstvu tejto položky uvedenému v popise prác alebo inom súvisiacom dokumente
 - ii. táto zmena množstva vynásobená stanovenou sadzbou za túto položku prevyšuje o 0,01% schválenú zmluvnú cenu
 - iii. táto zmena množstva má priamy vplyv na zmenu nákladov na jednotku množstva tejto položky o viac než 1% a
 - iv. táto položka nie je uvedená v Zmluve o dielo ako "položka za pevnú sadzbu" alebo
 - b)
 - i. pokyn k práci bol vydaný podľa článkov Zmeny a úpravy v časti "E",
 - ii. v Zmluve o dielo nie je pre túto položku uvedená žiadna sadzba ani cena a
 - iii. nie je vhodná žiadna z uvedených sadzieb ani cien, pretože práca nie je podobného charakteru a ani nie je vykonaná za podobných podmienok ako niektorá iná položka Zmluvy o dielo.
- 20.3.3. Každá nová sadzba alebo cena bude odvodená od niektorej zodpovedajúcej sadzby alebo ceny v Zmluve o dielo s odôvodnenými úpravami, ktoré zohľadnia záležitosti popísané v odsekoch a) a/alebo b), podľa toho, čo je použiteľné. Ak pre odvodenie novej sadzby alebo ceny nie je

zodpovedajúca žiadna sadzba, ale ani cena bude cena odvodená zo zodpovedajúcich nákladov za vykonanie prác spolu s primeraným ziskom, pričom sa vezmú do úvahy ďalšie zodpovedajúce záležitosti.

ZMENY A ÚPRAVY

21.1. Právo na zmenu


- 21.1.1. Zmeny môže iniciovať zástupca vo veciach technických alebo stavebný dozor kedykoľvek pred vydaním preberacieho protokolu prostredníctvom žiadosti zhotoviteľovi, aby predložil návrh.
- 21.1.2. Všetky zmeny budú odsúhlasované na výrobnom výbore a na ich schválenie je potrebný súhlas stavebného dozoru, zástupcu vo veciach technických a koordinátora projektu, pretože všetky zmeny znamenajú potrebu dodatku k Zmluve o dielo.
- 21.1.3. Zhotoviteľ vykoná a bude viazaný každou zmenou až pokiaľ bezodkladne nepodá oznámenie zástupcovi vo veciach technických alebo stavebnému dozorovi, v ktorom uvedie (spolu so zdôvodnením), že nemôže ihneď získať vybavenie potrebné k zmene; pri obdržaní tohto oznámenia stavebný dozor pokyn zruší, potvrdí alebo zmení.
- 21.1.4. Každá zmena môže zahŕňať:
- zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve (tieto zmeny však nemusia nutne znamenať zmenu v zmysle tohto článku),
 - zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - zmeny výšky, polohy a/alebo rozmerov niektorej časti stavby,
 - vynechanie niektorej práce pokiaľ nemá byť vykonaná niekým iným,
 - akúkoľvek dodatočnú prácu, technologické zariadenie, materiály alebo služby nevyhnutné pre trvalé dielo vrátane všetkých preberacích skúšok s nimi spojených, vrtov a ďalších skúšobných a výskumných prác alebo
 - zmenu následnosti alebo načasovania výstavby diela.
- 21.1.5. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu úpravu a/alebo zmenu stavby, pokiaľ a dokiaľ stavebný dozor nevydá rozhodnutie o zmene alebo ju neschváli.
- 21.1.6. Keďže Zmluva o dielo predpokladá platbu zmluvnej ceny v eurách, potom kedykoľvek je úprava dohodnutá alebo stanovená tak, ako je uvedené vyššie, bude určená čiastka vypočítaná splatná v eurách.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "F" Technické riešenie zhotoviteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude povinný vykonať dielo (predmet Zmluvy o dielo výlučne podľa zmluvných podmienok tejto zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi. Akákoľvek zmeny alebo odchýlky je oprávnený uskutočniť len ak to umožňuje zmluva. Súčasťou tejto časti "F" Technické riešenie zhotoviteľa je, a pozostáva z nasledovných častí :

- Svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy *ihriská a cesty a chodníka*
- spotreba elektrickej energie
- licenčné právo
- projekčná činnosť
- zdvíhacie práce
- likvidácia odpadu vznikajúceho počas uskutočňovania stavebných prác
- vyhradené technické zariadenia elektrické
- odborná garancia projekčných prác
- stavbyvedúci
- vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických

príčom tieto tvoria prílohu tejto časti "F" Zmluvy o dielo.

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:

Svetelnotechnické parametre osvetľovacej sústavy ihriska a cesty a chodníka

Zhotoviteľ vyhlasuje, že svetelnotechnické riešenie pozostáva z priložených výpočtov svetelnotechnického riešenia a je úplné, vypracoval ich (*meno a priezvisko*) *Ing. Vladimír Mikluš* s odbornou kvalifikáciou /oprávnením *VŠT Košice, Stavebná fakulta* a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotovený. Zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzuje, že svetelnotechnické riešenia/výpočty a ich prílohy majú 10 strán a hodnoty pre spevnenú plochu a ostatné pracovné priestory sú :

Intenzita osvetlenia : **102,44 lx**

Rovnomernosť osvetlenia U_0 : **0,75**

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že svetelnotechnické riešenie je prepočítané z poskytnutých podkladov objednávateľom v súťaži, a ktoré zhotoviteľ obdržal v súťaži a zohľadňuje všetky svetelné zdroje (svietidlá), ktoré vyplývajú z podmienok súťaže, ako i zahrňa všetky svetelné zdroje (svietidlá). Vo výpočtoch uvažované a tým ponúkané materiály alebo výrobky budú záväzné pre realizáciu zákazky v zmysle podmienok zmluvy.

Prílohy : sumarizačná tabuľka;

svetelnotechnické výpočty ihriska a cestu a chodník v tvare a podmienok v zmysle podmienok zmluvy, s uvedením mimo iného aj typu a výrobcu svietidla počítaného vo výpočte;

katalógové listy od výrobcov/predajcov použitých svietidiel vo výpočtoch, z ktorých sú zrejmé ich konkrétne typy, výrobca a parametre svietidla preukazujúce min. parametre v sumarizačnej tabuľke;

doklad o kvalifikácii / oprávnení osoby ktorá vypracovala výpočet

V Prešove, dňa 17.9.2018

.....
zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

K výpočtu sa odporúča využitie nasledujúcej vzorovej tabuľky

**PRÍLOHA SVETELNOTECHNICKÉHO RIEŠENIA ČASTI "F" ZMLUVY O DIELO
TABUĽKA PRE VONKAJŠIU PRACOVNÚ PLOCHU**

Názov vonkajšej pracovnej spevnenej plochy podľa PD	Intenzita osvetlenia uviesť : číselnú hodnotu v lx	Rovnomernosť osvetlenia - U_0 uviesť : číselnú hodnotu	Podanie farieb - RA uviesť : číselnú hodnotu	Splnenie STN 12464-2 uviesť : áno / nie
ihrisko	196	0,76	89	áno
cesta a chodník	8,88	0,74	89	áno

Priemer za riešené lokality	102,44	0,75
--------------------------------	--------	------

V Prešove, dňa 17.9.2018

podpis osoby ktorá vypracovala svetelnotechnické výpočty :

podpis zhotoviteľa :

Osvetlenie cesty Drienovská Nová Ves

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:


Datum: 17.09.2018
Zpracovateľ:

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

proli spol. s r.o. SRL 018(700mA 55W 4000K S2 Type II) SRL 018(700mA 55W 4000K S2 Type II) / Datový list svítidla

Výstup světla 1:

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

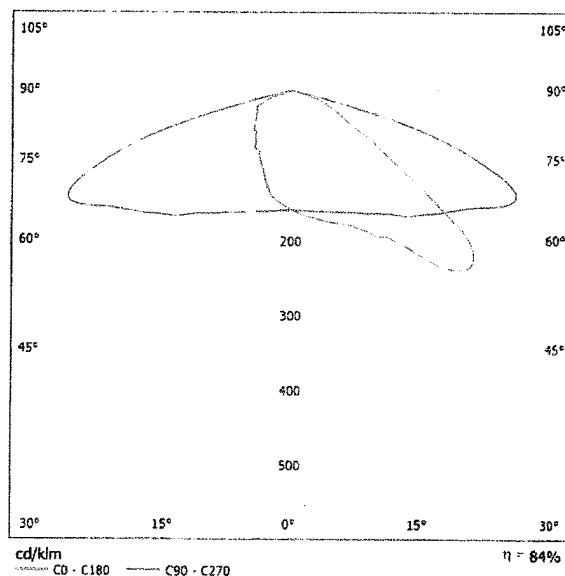

Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 32 74 98 100 83

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail



Silnice 1 / Plánovací údaje

Profil ulice

Vozovka 1 (Šířka: 6.500 m, Pocat jízdních pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

Činitel údržby: 0.80


Rozmístění svítidel

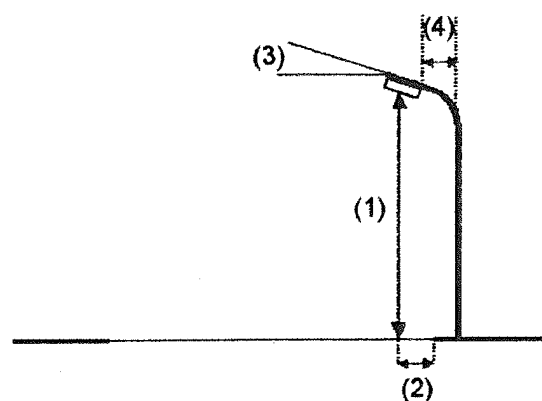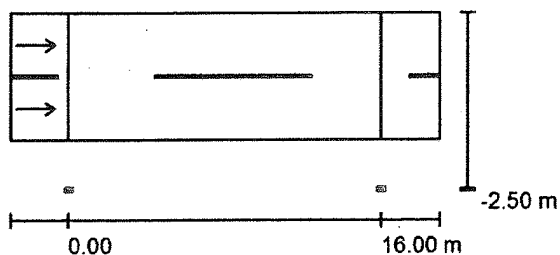

Svítidlo:	proli spol. s r.o. SRL 018(700mA 55W 4000K S2 Type II) SRL 018(700mA 55W 4000K S2 Type II)	
Světelný tok (Svítidlo):	5563 lm	Nejvyšší hodnoty intenzity světla
Světelný tok (Zdroje):	6660 lm	u 70°: 651 cd/klm
Výkon svítidla:	55.0 W	u 80°: 111 cd/klm
Umístění:	jednostranně dole	u 90°: 1.45 cd/klm
Vzdálenost sloupů:	16.000 m	Vždy do všech směrů, které u použitelně nainstalovaného svítidla tvoří stanovený úhel se spodní vertikálou.
Montážní výška (1):	8.000 m	Žádná svítivost nad 95°.
Výška světelného bodu:	7.910 m	Uspřádání splňuje třídu intenzity osvětlení G2.
Přesah (2):	-2.492 m	Uspřádání splňuje třídu indexu oslnění D.6.
Sklon ramene (3):	5.0 °	
Délka ramene (4):	1.000 m	

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Silnice 1 / Světelně technické výsledky

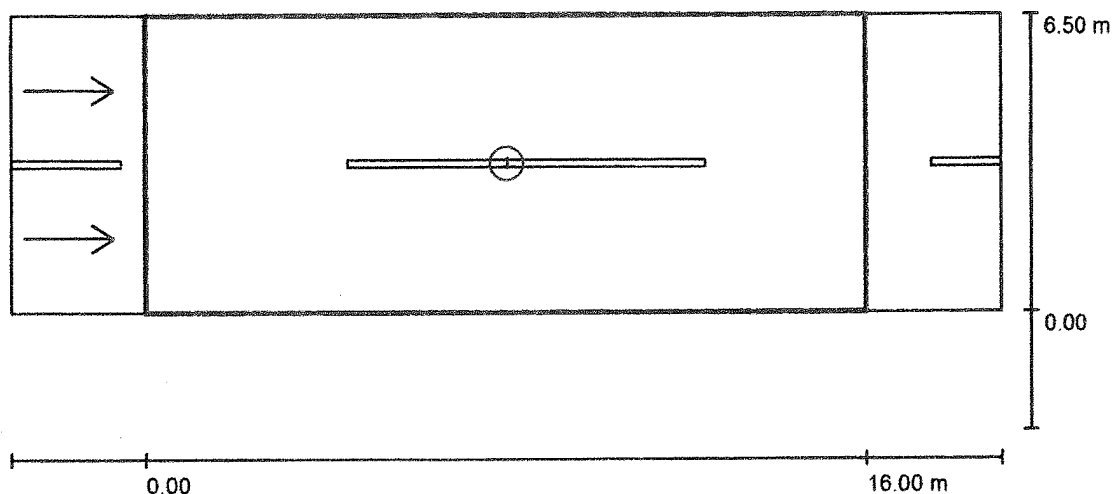

Činitel údržby: 0.80

Měřítko 1:158

Soupis vyhodnocovacího pole

- 1 Vyhodnocovací pole Vozovka 1
Délka: 16.000 m, Šířka: 6.500 m
Rastr: 10 x 6 Body
Příslušející silniční prvky: Vozovka 1.
Povrch: R3, q0: 0.070
Zvolená třída osvětlení: ME6

(Jsou splněny všechny fotometrické požadavky.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Skutečné hodnoty podle výpočtu:	0.31	0.51	0.54	1	0.98
Požadované hodnoty podle třídy:	≥ 0.30	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	/
Splněno/nesplněno:	✓	✓	✓	✓	✓

Ihrisko Drienovská Nová Ves

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:


Datum: 17.09.2018
Zpracovatel:

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

PROLI spol. s r.o. LRF 180 HB 100st 140W IP66 / Datový list svítidla

Obrázek svítidla najdete v našem katalogu svítidel.

Výstup světla 1:

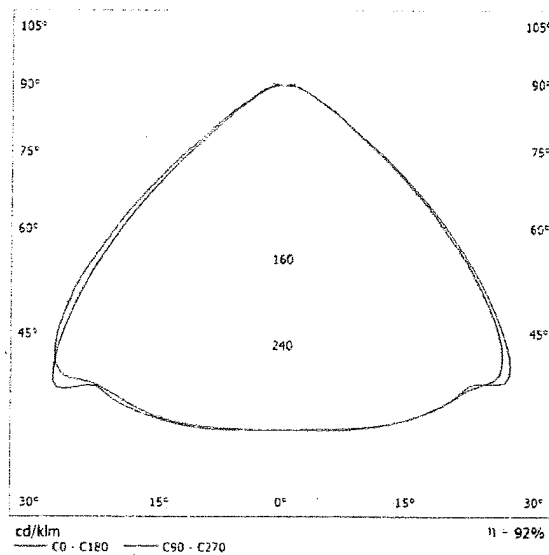


Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 56 89 97 99 92

Na základě chybějících vlastností symetrie nemůže být pro toto svítidlo znázorněna žádná tabulka UGR.

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Ihrisko / Plánovací údaje

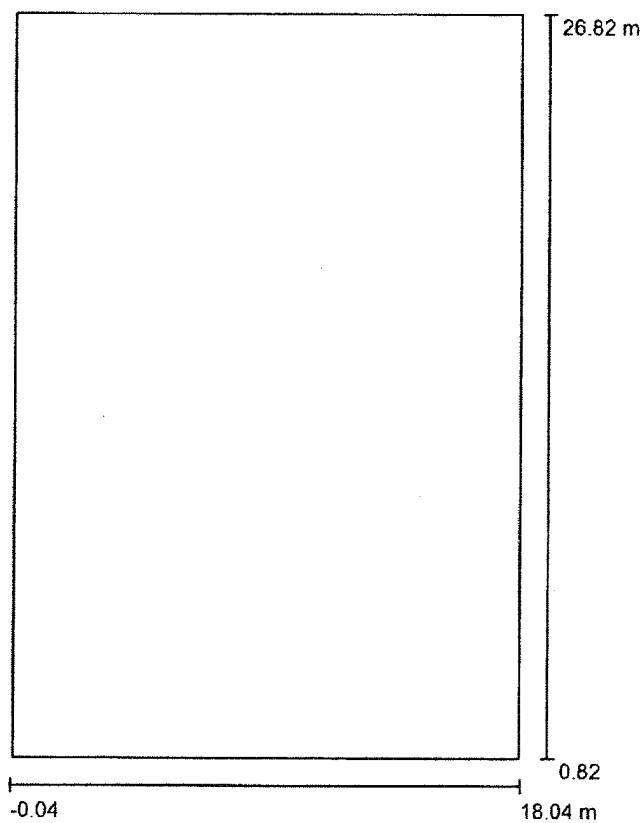

Činitel údržby: 0.80, ULR/ FHS Inst.: 21.0%


Měřítko 1:242

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítilo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	12	PROLI spol. s r.o. LRF 180 HB 100st 140W IP66 (1.000)	17429	18888	140.0
Celkem:			209151	Celkem: 226656	1680.0

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

Ihrisko / Podlahový prvek 1 / Plocha 1 / Isolinie (E)

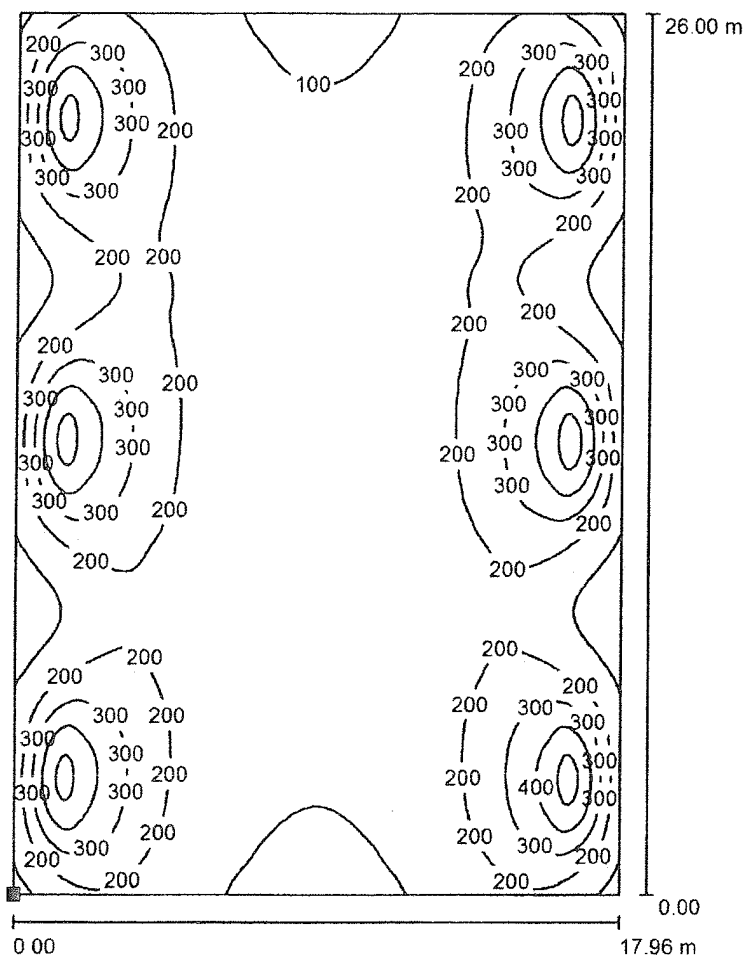

Hodnoty v Lux, Měřitko 1 : 204

Poloha plochy ve venkovní scéně:
Označený bod:
(0.044 m, 0.818 m, 0.000 m)



Rastr: 128 x 128 Body

E_m [lx]
196

E_{min} [lx]
56

E_{max} [lx]
543

E_{min} / E_m
0.285

E_{min} / E_{max}
0.103

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola technická v Košiciach - Múzejná fakulta
č. 180

D
№ 002329

DIPLOM

Mikluš Vladimír

narodený(á) *12. septembra* 19 *61* v *Prešove* okres *Prešov*

skončil(a) štúdium vykonaním štátnej záverečnej skúšky a získal(a) vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore *36-32-8 Pozemné stavby*

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách sa mu (jej) priznáva titul

„inžinier“ (v skratke „Ing.“)

v *Košiciach* *196* 19 *84*

Prof. Ing. Alojz Szűcs, dr. h. c.
rektor

LS

Prof. Ing. J. Kútny, dr. h. c.
dekan

SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Zhotoviteľ vyhlasuje, že priložené výpočty spotreby elektrickej energie ako hodinová spotreba elektrickej energie celej inštalovanej sústavy pri plnom výkone, vrátane strát sú úplné, vypracoval ich (*meno a priezvisko*) *Ing. Vladimír Mikluš*.

s odbornou kvalifikáciou /oprávnením *VŠT Košice, stavebná fakulta* a v tejto kvalite bude predmet zmluvy zhotovený. Zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzuje, že výpočty spotreby elektrickej energie majú 1 strán a

hodinová spotreba v zmysle vyššie uvedeného je **2,29 kWh**

Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že spotreba elektrickej energie vo forme výpočtu zohľadňuje všetky elektrické spotrebiče uvažované alebo navrhované v ponuke zhotoviteľa v zmysle podmienok verejného obstarávania, pričom je vypočítaná z poskytnutých súťažných podkladov verejným obstarávateľom. Vo výpočtoch uvažované a tým ponúkané materiály alebo výrobky budú záväzné pre realizáciu zákazky.

Prílohy : výpočty spotreby elektrickej energie s uvedením mimo iného aj druhu elektrického spotrebiča, jeho elektrického príkonu v kW počítaného vo výpočte a to pre všetky elektrické spotrebiče počítané vo výpočte.

doklad o kvalifikácii / oprávnení osoby ktorá vypracovala výpočet

V Prešove, dňa 17.9.2018

.....
zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

K výpočtu sa odporúča využitie nasledujúcej vzorovej tabuľky:

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA

Vysoká škola Technická v Košiciach - Inžinierska fakulta
c.180

D

№ 002329

DIPLOM

Mikluš Vladimír

narodený(á) *12. septembra* 19 *61* v *Prešove* okres *Prešov*

skončil(a) štúdium vykonaním štátnej záverečnej skúšky a získal(a) vysokoškolské vzdelanie v štu-
diijnom odbore *36-32-8 Počunni študy*

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách sa mu [jej] priznáva titul

„inžinier“ (v skratke „Ing.“)

v *Košiciach* *196* 19 *84*
Prof. Ing. Alojz Sz. Dr. G.
rektor

LS

Prof. Ing. J. Kútny, DrSc.
dekan

LICENČNÉ PRÁVO

Zhotoviteľ vyhlasuje, že tendrovú dokumentáciu na realizáciu svedomite preštudoval, je s ňou riadne a bez výhrad oboznámený, a vo svojej súťažnej ponuke na realizáciu predmetného diela, ako i v zmluve o dielo, zahrnul len licencie, ktoré bezprostredne súvisia s plnením služieb, výkonom prác, dodávkou materiálov a zariadení, ku ktorým má súhlas vlastníkov zahrnutých licencií. (pozn. Pod týmto licenčným právom nie je myslené licenčné právo na dokumentáciu poskytnutú objednávateľom v súťaži. Toto licenčné právo má objednávateľ so spracovateľom tendrovej projektovej dokumentácie, resp. projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vysporiadané.)

Prílohy : Súhlas vlastníkov licencií, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri plnení predmetu zmluvy na realizáciu projektu sa prikladá k tejto prílohe a tvoria jeho súčasť. (pozn. V prípade že plnenie zmluvy zo strany zhotoviteľa nepodlieha žiadnemu licenčnému právu, prílohou je čestné prehlásenie uchádzača/zhotoviteľa o tejto skutočnosti podpísané uchádzačom/zhotoviteľom.

V Prešove, dňa 17.9.2018

zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Dole podpísaný Ing. Viliam Čech, IČO : 34347470 čestne prehlasujem, že plnenie zmluvy " **Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves** " zo strany zhotoviteľa nepodlieha žiadnemu licenčnému právu.

V Prešove, 17.9.2018

Pečiatka a podpis



PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo bude realizovať prostredníctvom technického zariadenia na spracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom zmluvy o dielo a to v elektronickej podobe prostredníctvom :

názov programu BENTLEY POWER MAP
výrobca (názov) :
Vlastník programu TRISTÁN STUDIO s.r.o.
jeho adresa Vyšná Šebastová 138, 03006 Prešov
jeho IČO 43779476

Prílohy : doklad o legálnom nadobudnutí zariadenia

v Prešove dňa 14.9.2018

v Prešove dňa 17.9.2018

.....
vlastník programu
meno, priezvisko a podpis

.....
zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis



Informace o dodání softwaru a licenci

Zákazník	Informace o objednávce
TRISTÁN studio, s.r.o. Vyšná Šebastová 138 08006 PREŠOV SLOVAKIA	Číslo zakázky : 44229416 Číslo objednávky : Číslo zákazníka : 1002956974 Datum : 05 LIS 10 17:13
Kontaktní osoba : Marián Ferjo Telefon : 51 77 340 49 Email : tristanstudio@tristanstudio.sk	

Děkujeme za Vaši aktuální objednávku softwaru Bentley Systems!

Jsme si vědomi, že Váš další úspěch závisí na efektivním zavedení nového softwaru. Proto jsme vytvořili tento webový dokument s pokyny k získání licencí k produktům společnosti Bentley Systems.

Shrnutí objednávky:

Řada	Produkt	Sériové číslo
20	Bentley PowerMap	30000000130597
	Stážení instalace:	http://appsnet.bentley.com/productdownload/default.aspx?guid=DFE8F79C4DBA2BF1B1790019B9E838A

Postup aktivace produktu:

Před zahájením tohoto postupu zkontrolujte, zda jste připojeni k internetu.

Stážení a aktivace produktů Bentley

- Jednotlivé odkazy ke stažení nově zakoupených produktů Bentley jsou uvedeny v části Shrnutí objednávky.
- Spusťte instalaci a v průvodci aktivací produktu zadejte následující informace:

Název serveru	ProductActivation.bentley.com
Aktivační klíč	[REDACTED]

ZDVÍHACIE PRÁCE

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo bude realizovať prostredníctvom technického zariadenia na zdvíhacie práce ktoré sú predmetom zmluvy o dielo prostredníctvom :

názov zariadenia

a typ podľa výrobcu

FASSI F415A/455 AXP28

výrobca zariadenia :

FASSI GRU SPA

názov a adresa

Via ROME 110, 24021 Albino (BG) Italy

Vlastník zariadenia : názov

Ing. Viliam Čech

adresa

K Surdoku 9, 08001 Prešov

IČO

34347470

Prílohy :

- V prípade že zariadenie podlieha evidencii na premávku na pozemných komunikáciách (má pridelené evidenčné číslo) prílohou je doklad ktorým je technický preukaz, alebo ekvivalentný doklad nahrádzajúci technický preukaz v zmysle platných právnych predpisov,
- V prípade že zariadenie nepodlieha evidencii na premávku na pozemných komunikáciách, je nutné uviesť výrobné číslo :

výrobné číslo :

V Prešove dňa 17.9.2018

V Prešove dňa 17.9.2018

Ing. Viliam Čech

K Surdoku 9, 080 01 PREŠOV

IČO: 34347470 IČ DPH: SK1020745781

tel.: 051/7710 088

vlastník

meno, priezvisko a podpis

zhotoviteľ

meno, priezvisko a podpis

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O EVIDENCII

B Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) **31.8.2007**
 I Dátum prvej evidencie v SR **14.10.2013** E VIN **WJME2NNS40C1B1835**
 A Evidenčné číslo **PO287ET** H Platnosť do .
 C.2.1 Vlastník vozidla **Ing. Viliam ČECH**
 Dátum narodenia / IČO **0034347470**
 C.2.3 Trvalý pobyt / sídlo vlastníka **Prešov**
 K Surdoku **6044/9**
 C.1.1 Držiteľ osvedčenia **Ing. Viliam ČECH**
 Dátum narodenia / IČO **0034347470**
 C.1.3 Trvalý pobyt / sídlo držiteľa **Prešov**

K Surdoku **6044/9**

v **Prešove**
 dňa **14.10.2013**

Zmena údajov o vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi osvedčenia o evidencii

C.5
 C.6

Záznamy o prevode držby vozidla na inú osobu

zňa

podpis oprávnenej osoby
 odlaček pečiatky

podpis oprávnenej osoby
 odlaček pečiatky

zo dňa

č. kómania

II. Nadvetva je namontovaná na vozidlo podľa osvedčenia Ministerstva dopravy,
 výskazy a regionálneho rozvoja SR o kvalifití typu nadvetvy vozidla

podpis oprávnenej osoby
 odlaček pečiatky

dňa **09.10.2013**

v **Prešove**

č. kómania **5201304923** zo dňa **09.10.2013**

osvedčenia (č. ZTO)

komunikácie v **Prešove**

je schválené rozhodnutím (b)vodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné

komunikáciách

komunikáciách

komunikáciách

komunikáciách

I. Motorové - prípojné vozidlo je

DAŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY

EURÓPSKA UNIA
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA



OSVEDČENIE O EVIDENCII - ČASŤ II
 (TECHNICKÝ PREUKAZ)



TA 371652

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY
 A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
 SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Службствено за регистрацията - част II

Permito de circulação - Parte II

Osvedčenie o registrácii - Časť II

Registrierungsdokument - Teil II

Zulassungsberechtigung - Teil II

Registrierungsdokument - Osa II

Зберегальний лист /

Πιστοποιητικό Εγγραφής - Μέρος II

Registration certificate - Part II

Certificat d'immatriculation - Partie II

Testas Clădithe

Carta di circolazione - Parte II

Registračian apliecbas - II. daļa

Registrācijas liudijimas - II. daļe

Forpalmi engedély - II. Rész

Certificat la/ Registrasyonu - II-II Parti

Kentelenbewijs - Deel II

Dovodil Registracijny - Časť II

Certificado de matricula - Parte II

Certificat de înmatriculare - Partea II

Prosmetno dovoljenje - Del II

Reģistrācijas dokuments - Osa II

Registrierungsdokument - Teil II

VOZIDLO	
1 Druh	NÁKLADNÉ VOZIDLO
2 J Kategória	N3 3 E VIN WJME2NNS40C181835
4 D.1 Značka	IVECO
5 D.3 Obchodný názov	TRAKKER
6-8 D.2 Typ / variant / verzia	AD260T33 / - / -
9 Výrobca vozidla (podvozku)	IVECO MAGIRUS AG, ESP
10 K Číslo typového schválenia ES	
11 Dátum typového schválenia ES	
MOTOR A PREVODOVKA	
12 Výrobca motora	IVECO MAGIRUS AG, ESP

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)	F2BE3681B*P		
14 P.1 Zdvihový objem valcov	7 790,0 cm ³	15 Katalyzátor	BEZKAT
16-17 P.2 / P.4 Najväčší výkon motora / otáčky	243,00 kW / 2 400 min ⁻¹		
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie	MM		
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L)		kW.kg ⁻¹	
20 Prevodovka / počet stupňov	MT / 16		

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)	
21 Druh (typ)	BA VALNÍKOVÁ
22 R Farba	BIELA
23 Výrobca	IVECO MAGIRUS AG, ESP
24 Výrobné číslo	
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových	2 / -

25.2 S.2 Počet miest na spánie	25	3 Počet lôžok	-
26 Zataženie strechy		kg	-
27 Objem skrine - ríšterny		m ³	-
28 W Objem palivovej nádrže		l	-

ROZMERY A HMOTNOSTI					
29 Celkové rozmery d	10 075 mm	s	2 550 mm	v	3 371 mm
30 Rozmery ložnej plochy d	6 900 mm	l	2 450 mm		
31 G Prevádzková hmotnosť		kg	16 625		
32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť		kg	26 000		
33 N Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4		kg	8 000 / 9 500 / 9 500 / -		
34 F.3 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy		kg	40 000		

35 Najväčšia prípustná hmotnosť pripojného vozidla			
O.1 brzdeného	kg	O.2 nebrzdeného	kg

BRZDY			
36 ES/EHK			
37.1 Prevádzková	ÁNO	37.4 Núdzová	ÁNO
37.2 Parkovacia	ÁNO	37.5 ABS	ÁNO
37.3 Odťahovacia	ÁNO		

NÁPRAVY	
38 Druh kolies	DISKOVÉ
39 L Počet náprav	3 z toho poháňaných 1: NIE 2: ÁNO 3: ÁNO 4:
40 M Rázvor [mm]	4 800 + 1 380

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1	385/65 R22,5 158L / NIE
2	315/80 R22,5 154/150 / ÁNO
3	315/80 R22,5 154/150 / ÁNO
4	
42 Rozmer ráfikov na náprave	
1	22,5x11,75
2	22,5x11,75
3	22,5x11,75
4	
43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla	90 km.h ⁻¹

SPÁJACIE ZARIADENIE					
44.1 Trieda					
44.2 Značka					
44.3 Typ					
45 Schvaľovacia značka					
46.1-3 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia					
horný záves	- kg	spodný záves	- kg	točnica	- kg

EMISIE ZVUKU			
47 ES/EHK			
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla			
U.1 stojaceho	- dB(A)	U.2 pri otáčkach	- min ⁻¹
U.3 za jazdy	- dB(A)		

EMISIE A SPOTREBA			
49 V.9 Emisie ES/EHK	88/77*2001/27B1 (EURO 4)		
50 Dymivosť ES/EHK			
51.1 V.1 CO	-	51.2 V.2 HC	-
51.3 V.3 NOx	-	51.4 V.4 HC+NOx	- g.km ⁻¹
51.5 V.5 Častice	-	51.6 V.6 Koef. súčiniteľ absorpcie P _{0,841}	m ³
51.7 V.7 CO ₂	- g.km ⁻¹	51.8 V.8 Spotreba paliva	- l.100.km ⁻¹

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
HYDRAULICKÁ RUKA TEMPOMAT	TACHOGRAF


*Hydraulická ruka: FASSI, typ F413A/455AXP 20

FRESI

F455AXP.28 - Load Diagram

LOAD DIAGRAM WITH LIFTING MOMENT LIMITING DEVICE

Via Roma, 119
 14100 ALESSANDRIA (C.G.)
 Tel. +39 0421 271111
 Fax +39 0421 271122
 E-mail: sales@fresi.it
 Website: www.fresi.it

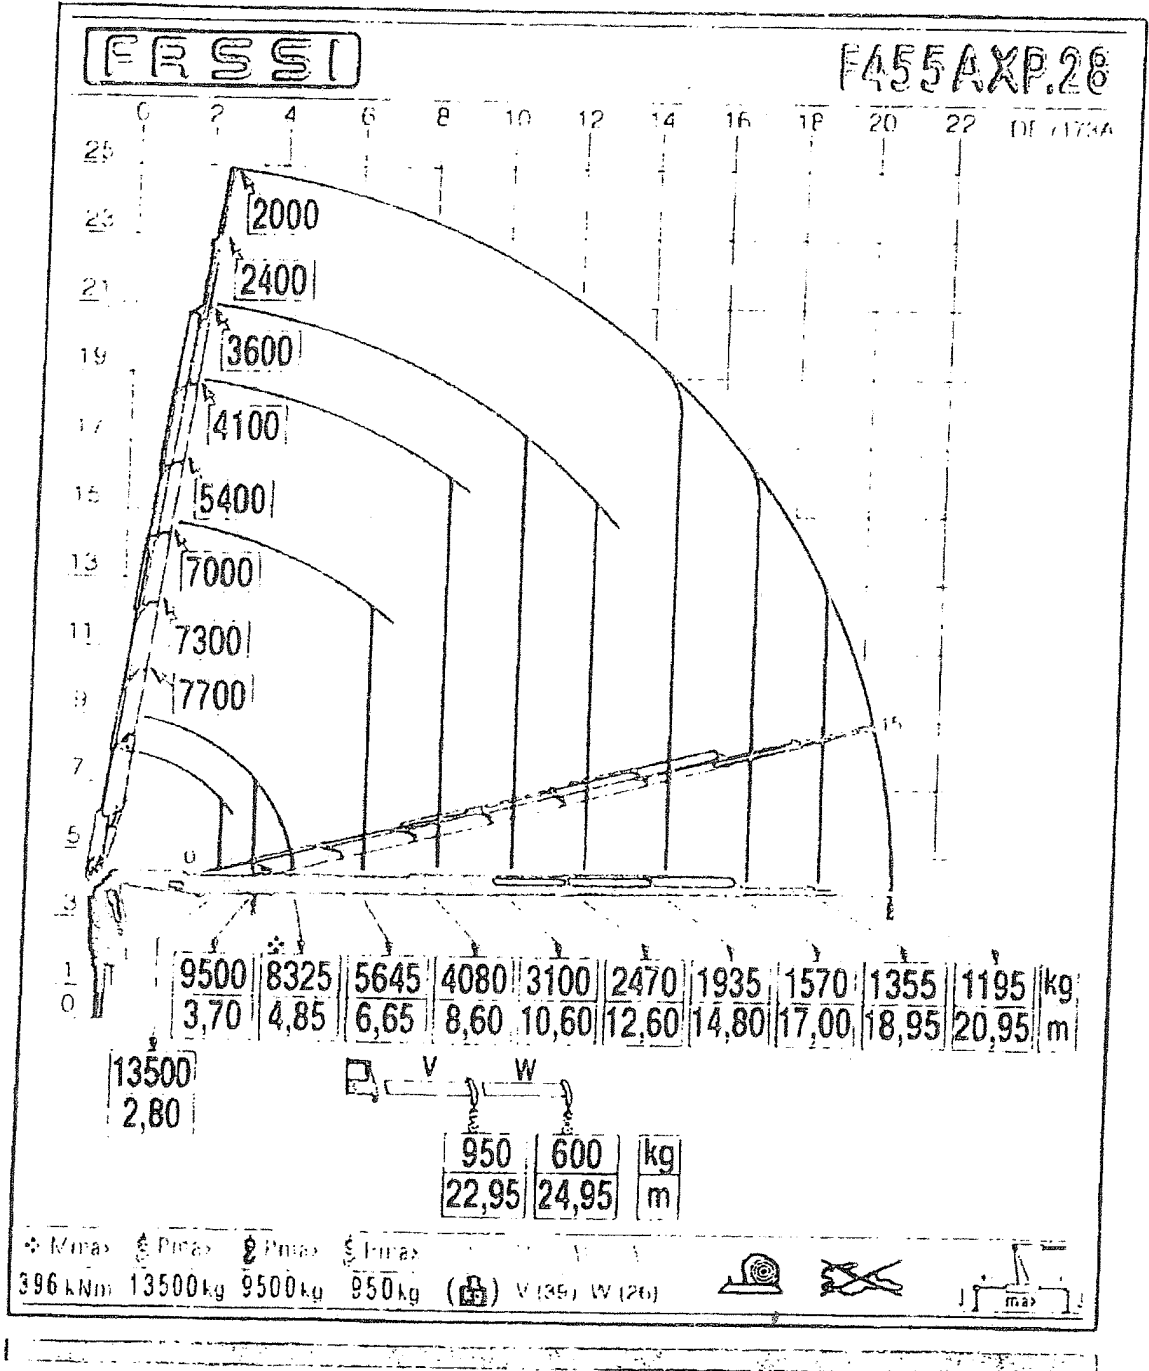

LIKVIDÁCIA ODPADU VZNIKAJÚCEHO POČAS STAVEBNÝCH PRÁC

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo v časti likvidácie prebytočných výkopov bude likvidovať technickým zariadením na uskladňovanie prebytočných výkopov a odpadu vznikajúceho počas uskutočňovania stavebných prác, ktoré sú predmetom zmluvy a to nasledovným zákonným spôsobom :

Miesto umiestnenia : mesto/obec

PREŠOV

parcelné číslo

Strojnícka 11

Číslo povolenia na prevádzku :

OU-PO-OSZP3-2016/014030-04/04-K4

Vlastník zariadenia : názov

ENBPA s.r.o.

adresa

Strojnícka 17, Prešov

IČO

45309591

Prílohy : doklad - platné povolenie na prevádzku

V PREŠOVE dňa 14.9.2018

V PREŠOVE dňa 14.9.2018

vlastník
meno, priezvisko a podpis

zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV


odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

OU-PO-OSZP3-2016/014030-04/OH-Kn

V Prešove dňa 17.5.2016

ROZHODNUTIE

17.5.2016
17.5.2016
17.5.2016



Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 písm.e) zákona č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 písm. m) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), na základe žiadosti spoločnosti ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov a po vykonanom správnom konaní v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 113 ods.1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

u d e ľ u j e s ú h l a s

na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvora

odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d/zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre spoločnosť:

Obchodné meno: ENBRA, s.r.o.

Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov

IČO : 45 309 591

Miesto nakladania s odpadmi: ENBRA, s.r.o., Strojnícka 11, 080 01 Prešov

Zoznam druhov odpadov, ktorých zber sa bude v zariadení vykonávať v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov nasledovne:

Katalógové číslo	Druh odpadu	Kat.
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	0
01 01 02	odpad z ťažby z nerudných nerastov	0
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	0

01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	0
05 01 17	bitúmen	0
17 01 01	betón	0
17 01 02	tehly	0
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika	0
17 01 07	zmesi betónu tehál, škridiel, obkladového materiálu, a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	0
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0

Spôsob nakladania s odpadmi:

Nakladanie s odpadom bude pozostávať z jeho zhromažďovania v priestoroch zariadenia do doby zabezpečenia jeho zhodnotenia/zneškodňovania oprávnenými organizáciami v zmysle zákona č.79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhodnocovanie odpadov spočíva v mechanickej úprave odpadov zo stavebných demolácií prostredníctvom mobilného zariadenia HARTL POWERCRUSHER 10/55 J- čeľusťový drvič, na ktorý bol Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov pod číslom OU-PO-OSZP2-2015/042368-07-FB zo dňa 10.12.2015 udelený spoločnosti ENBRA, § 7 ods.1 písm.h/ zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch podľa §7 ods.1 písm.f/zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov. Materiál, ktorý vznikne sa následne používa pri stavebných a rekonštrukčných prácach ako spevňujúci podkladový materiál.

Technické požiadavky prevádzky:

Areál spoločnosti je oplotený, zabezpečený uzamykateľnou vstupnou bránou voči prístupu neoprávnených osôb. Zber a výkup odpadov sa vykonáva na vyhradenej časti zberne, na spevnenej ploche. Zariadenie je prevádzkované v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia a technickej dokumentácie ku zariadeniu. Pri dodávke odpadov do zariadenia sa skontroluje kompletnosť a správnosť dokladov a údajov, vykoná sa kontrola množstva dodaného odpadu a zaeviduje sa.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia:

Činnosť zariadenia sa riadi prevádzkovým poriadkom zariadenia a opatreniami pre prípad havárie. Pri prevádzkovaní zariadenia budú dodržiavané všeobecné bezpečnostné predpisy pri práci a zásady bezpečnosti práce v zmysle prevádzkového poriadku zariadenia.

Začiatok prevádzky: Od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súhlas na zber odpadov sa vydáva na dobu určitú do 30. 04. 2021.

Upozorňujeme na povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť finančné krytie zodpovednosti za environmentálnu škodu a predložiť príslušnému úradu kópie zmluvy o zabezpečení finančného krytia v termíne najneskôr do 100 dní od povolenia podľa § 13 ods.3 zákona č.359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Podmienky súhlasu:

Skladovanie odpadov a výsledného produktu zhodnocovania zabezpečiť tak, aby sa jeho skladovanie nestalo zdrojom znečisťovania ovzdušia a okolia areálu.

Odôvodnenie:

Spoločnosť ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov požiadala dňa 29.2.2016 tunajší úrad o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods.1 písm.d) zákona č.79/2015 Z.z.o odpadoch pre prevádzku Strojnícka 11, 080 01 Prešov.


Na prerokovanie danej žiadosti tunajší úrad zaslal upovedomenie o začatí konania č.OU-PO-OSZP3-2016/014030-02/OH-Kn zo dňa 24.3.2016 na deň 21.4.2016. Na ústnom konaní bolo konštatované, že zber sa bude uskutočňovať v areáli na ul. Strojnícka 11, v Prešove v zmysle platnej legislatívy. Mesto Prešov v zastúpení Dr.Tiborom Bindasom, OD a ŽP súhlasí s prevádzkou zariadenia na zber a likvidáciu odpadov vrátane zberného dvora a v lehote stanovenej v upovedomení o začatí konania Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného neuplatnilo žiadne námietky ani pripomienky k udeleniu predmetného súhlasu.

K žiadosti boli doložené: návrh na zaradenie odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Prevádzkový poriadok mobilného zariadenia HARTL POWERCRUSHER 10/55 J na zhodnocovanie ostatných odpadov, kópia Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov I k dátumu 24.11.2015, Oddiel Sro., Vložka č.22302/P, faktúra VFVL/160308, Plán opatrení pre prípad havárie mobilného zariadenia HARTL POWERCRUSHER 10/55 J na zhodnocovanie ostatných odpadov, kópia rozhodnutia Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov pod číslom OU-PO-OSZP2-2015/042368-07-FB zo dňa 10.12.2015, správny poplatok v hodnote 11 € vybraný tunajším úradom podľa položky 162 písm.d/sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, po preskúmaní predložených podkladov a po vykonanom správnom konaní konštatuje, že žiadateľ splnil podmienky pre vydanie požadovaného súhlasu a rozhodol ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov podľa § 54 cit. zákona. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Doručí sa:

1. ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov
3. pre spis

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Číslo:OU-PO-OSZP2-2015/042368-07-FB

V Prešove: 10. 12. 2015

22-12-2015

Rozhodnutie je

právoplatné dňom

7. 1. 2016

vykonateľné dňom

7. 1. 2016



podpis

[Signature]

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 70 písm. n) a p) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), rozhodujúc vo veci žiadosti spoločnosti ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov, na základe vykonaného správneho konania podľa ustanovenia § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto rozhodol:

u d e ľ u j e s ú h l a s

- a) na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením podľa ust. § 7 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch,
- b) na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov podľa ust. § 7 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch pre spoločnosť:

ENBRA, s.r.o.
Strojnícka 17
080 01 Prešov
IČO : 45 309 591

Súhlas sa udeľuje na tieto druhy ostatných odpadov, ktoré sú zaradené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov:

Katalógové číslo	Druh odpadu	Kategória odpadu
01 01 01	odpad z ťažby rudných nerastov	O
01 01 02	odpad z ťažby nerudných nerastov	O
01 03 06	hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05	O
01 04 08	odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07	O

05 01 17	bitumén	0
17 01 01	betón	0
17 01 02	tehly	0
17 01 03	obkladačky, dlaždice a keramika	0
17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	0
17 03 02	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0
17 05 04	zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	0
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	0
17 08 02	stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01	0
17 09 04	zmiešané odpady kaly zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	0

Spôsob nakladania s odpadmi

Nakladanie spočíva v zhodnocovaní uvedených odpadov mobilným zariadením HARTL POWERCRUSHER 10/55 J (čelúst'ový drvič) u jednotlivých pôvodcov a držiteľov odpadu a to v mieste kde odpad vzniká, alebo v mieste kde, sa odpad zhromaždí na území Slovenskej republiky činnosťou R5 – recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch.

Materiálová bilancia

Mobilné zariadenie HARTL POWERCRUSHER 10/55 J umožňuje zhodnotenie takmer 100 % vstupujúcich odpadov. Zhodnotený materiál sa využíva pri stavebných a rekonštrukčných prácach ako konštrukčný spevňovací materiál alebo prekryvka na vyrovnávanie terénu. Pri procese zhodnocovania môže vzniknúť odpad kat. č. 17 04 05 - železo a oceľ, ktorý tvorí súčasť betónov. Tento odpad je uvoľnený z betónu, zachytený na magnetickom separátore a následne odovzdaný do zariadenia na zber odpadov alebo priamo do zariadenia určeného na jeho zhodnotenie. Hmotnostné ani percentuálne vyjadrenie podielu obsahu odpadu 17 04 05 v zhodnocovaných odpadoch nie je možné vopred stanoviť, nakoľko závisí od zloženia vstupných zhodnocovaných odpadov.

Technické požiadavky prevádzky zariadenia

Výkon zariadenia HARTL POWERCRUSHER 10/55 J je stanovený výrobcom na 70 - 150 t/hod (priemerný výkon = cca 100 t/hod). Kapacita zariadenia bude priamoúmerná počtu prevádzkových hodín. Predpokladané množstvo zhodnoteného odpadu za rok bude cca 40 000 ton/ročne, za predpokladu 400 prevádzkových hodín v roku. Zariadenie je umiestnené na pásovom vozidle o šírke 350 mm poháňané je naftovým spaľovacím motorom Caterpillar CAT 3126 B o výkone 186 kW.

Ďalej k mobilnému zariadeniu patria obslužné a doplnkové zariadenia – kolesový nakladač Komatsu WA 250/Liebherr s výklopnou lyžicou a prídavným hydraulickým kladivom a nákladné vozidlo Tatra 815 S3.

Do násypky s objemom 5 m³ s regulovateľným vibračným podávačom je za pomoci nakladača vložený stavebný odpad, ktorého kusovitosť musí byť rozmerovo menšia ako 1 000 x 550 mm, nakoľko vstupné ústie drviča má rozmer 1 000 x 550 mm. Z násypky je stavebný odpad presúvaný vibračným podávačom do samotného čelúst'ového drviča, kde nastáva proces

zdrobnenia na vopred nastavenú zrnitosťnú triedu, ktorej rozmedzie je od 50 - 150 mm. Zdrobnený materiál prepadáva na vynášací pás a prechádza ešte cez magnetický separátor, ktorý oddelí od zdrobneného stavebného odpadu prípadné kovové zložky nachádzajúce sa hlavne v betóne, v ktorom slúžia ako materiál zvyšujúci pevnosť.

Bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov a iné potrebné mechanizmy môžu obsluhovať iba osoby na to spôsobilé a pravidelne školené, ktoré sú oboznámené s obsluhou daného zariadenia a vyškolené v bezpečnostných predpisoch. Pri práci na strojnom zariadení sú povinné používať pracovný odev a ochranné pracovné pomôcky podľa druhu zariadenia.

Povinnosti prevádzkovateľa:

- zabezpečiť znalosť prevádzkových predpisov a s tým súvisiacich školení,
- zabezpečiť používanie osobných ochranných pomôcok pri obsluhu mobilného zariadenia,
- vykonávať revízie mobilného zariadenia.

Ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje:

1. Prevádzkovateľ mobilného zariadenia bude pri svojej činnosti postupovať v súlade s prevádzkovým poriadkom.
2. Najneskôr 3 dni vopred ohlásiť Okresnému úradu, odboru starostlivosti o ŽP, v ktorého územnom obvode sa budú odpady zhodnocovať, miesto, druh, kategóriu a množstvo odpadu, s ktorým sa bude nakladať.
3. Zmeny v prevádzke mobilného zariadenia je potrebné zaznamenať do prevádzkového poriadku a písomne informovať tunajší úrad.

Súhlas na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia sa udeľuje na dobu určitú do **30.11.2020**.

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov požiadala listom doručeným tunajšiemu úradu dňa 30.09.2015 o udelenie súhlasu na zhodnocovanie ostatných odpadov mobilným zariadením a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ďalej len tunajší úrad) nariadil ústne pojednávanie vo veci, na ktorom žiadateľ doplnil náležitosti potrebné pre udelenie súhlasu. Rozhodnutím č. OU-PO-OSZP2-2015/042368-05-FB zo dňa 27.10.2015 bolo konanie vo veci prerušené a dňa 4.12.2015 žiadateľ doplnil podanie.

K žiadosti o udelenie súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie odpadov bolo doložené:

- prevádzkový poriadok mobilného zariadenia HARTL POWERCRUSHER 10/55 J na zhodnocovanie ostatných odpadov, schválený Ing. Ľubomírom Duplákom – konateľom spoločnosti ENBRA, s.r.o., Prešov, dňa 03.12.2015,

- plán opatrení pre prípad havárie mobilného zariadenia HARTL POWERCRUSHER 10/55 J na zhodnocovanie odpadov, schválený Ing. Ľubomírom Duplákom – konateľom spoločnosti ENBRA, s.r.o., Prešov, dňa 30.9.2015.
- kópia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov

Uvedené mobilné zariadenie bude prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, je konštrukčne a technicky usposobené na častý presun z miesta na miesto, nie je pevne spojené so zemou ani so stavbou, je určené na zhodnocovanie odpadov v mieste vzniku alebo v mieste zhromažďovania odpadov a nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa stavebného zákona.

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po preskúmaní podkladov rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Doručí sa:

1. ENBRA, s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov

Na vedomie:

1. MŽP SR v Bratislave
2. SIŽP Košice

UYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo bude realizovať prostredníctvom technického zariadenia na meranie vyhradených technických zariadení elektrických, ktoré sú predmetom zmluvy v rámci odborných prehliadok a odborných skúšok v zmysle platných právnych predpisov prostredníctvom :

názov zariadenia

a typ podľa výrobcu

UNIMER Vy Pro Si

výrobca zariadenia :

ELECTRON spol. s r.o.

názov a adresa

Jelšová 24, 08001 Prešov

výrobné číslo

0735

dátum poslednej úradnej

kalibrácie (preskúšanie v zmysle

platných právnych predpisov)

15.6.2016

Vlastník zariadenia : názov

JÁN ČIŽNAR

adresa

Družstevná 18, 08006 Prešov

IČO

10739938

Prílohy : doklad - platný kalibračný list, na všetky časti podliehajúce kalibrácii alebo doklad o úspešnej kalibrácii všetkých častí podliehajúcich kalibrácii, s uvedením doby platnosti do ďalšej kalibrácie,

V Prešove dňa 14.9.2018

V Prešove dňa 17.9.2018

.....
vlastník
meno, priezvisko a podpis

.....
zhotoviteľ
meno, priezvisko a podpis

Kontrola etalónového prúdu prúdového chrániča:

Skúšobný prúd (mA)	Nameraná hodnota (mA)	Nameraná chyba (mA)
10,0	10,80	0,00
30,0	30,00	0,00
100,0	99,80	0,20
300,0	301,10	1,10
500,0	500,50	0,50

ELECTRON spol. s r.o.
Jelšová 24, 080 01 Prešov
tel+fax: 051 - 77 230 79
electron@elcicon.sk
www.electron.sk

Vyhásenie o prvotnej kalibrácii výrobcu ELECTRON spol. s r.o., Prešov

Spoločnosť ELECTRON Prešov prehlasuje, že tento merací prístroj bol testovaný v súlade s kalibračnými procedúrami firmy ELECTRON spol. s r.o., Prešov počas výrobného procesu. Tieto procedúry zaisťujú, že prístroj zodpovedá technickým špecifikáciám, ktoré sú uvádzané v spravidelnej technickej dokumentácii k prístroju.

Tento dokument nie je certifikátom o kalibrácii prístroja, len dokladuje prevedenie prvotnej kalibrácie pri výrobnom procese, čo je dostatočné prehlásenie u novozakúpeného prístroja.

Uvedený merací prístroj musí byť opätovne kalibrovaný v pravidelných intervaloch od začiatku jeho používania v kalibračnom laboratóriu naviazanom na etalóny vyššieho radu.

Typ prístroja: UNIMER 09Profí
Výrobné číslo: 0735
Dátum: 15. 6. 2016

pečiatka a podpis výrobcu

ELECTRON

Výsledky meraní UNIMET odporů v.č.: 0736

Meranie izolačného odporu:

100 V: merací rozsah: 0,1 - 1000 M Ω , presnosť merania: $\pm(2,5\% \text{ MH} + 8 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (M Ω)	Nameraná hodnota (M Ω)	Dovolená chyba (M Ω)	Nameraná chyba (M Ω)
4,57	4,55	0,19	0,02
99,22	101	3,28	1,78
496,6	499	20,4	2,40

250 V: merací rozsah: 0,25 - 1000 M Ω , presnosť merania: $\pm(2,5\% \text{ MH} + 8 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (M Ω)	Nameraná hodnota (M Ω)	Dovolená chyba (M Ω)	Nameraná chyba (M Ω)
4,57	4,54	0,19	0,03
99,22	100	3,28	0,78
496,6	498	20,4	1,40

500 V: merací rozsah: 0,5 - 1000 M Ω , presnosť merania: $\pm(2,5\% \text{ MH} + 8 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (M Ω)	Nameraná hodnota (M Ω)	Dovolená chyba (M Ω)	Nameraná chyba (M Ω)
4,57	4,55	0,19	0,02
99,22	100	3,28	0,78
496,6	499	20,4	2,40

1000 V: merací rozsah: 1,0 - 1000 M Ω , presnosť merania: $\pm(2,5\% \text{ MH} + 8 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (M Ω)	Nameraná hodnota (M Ω)	Dovolená chyba (M Ω)	Nameraná chyba (M Ω)
4,57	4,55	0,19	0,02
99,22	101	3,28	1,78
496,6	498	20,4	1,40

Meranie príechodového odporu:

merací rozsah: 0,001 - 200 Ω , presnosť merania: $\pm(1,5\% \text{ MH} + 4 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (Ω)	Nameraná hodnota (Ω)	Dovolená chyba (Ω)	Nameraná chyba (Ω)
0,010	0,010	0,004	0,000
0,101	0,104	0,005	0,003
1,00	0,993	0,016	0,007
10,0	10,1	0,55	0,1

Meranie impedancie súčty:

merací rozsah: 0,01 - 20,0 Ω , presnosť merania: $\pm(7,5\% \text{ MH} + 10 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (Ω)	Nameraná hodnota (Ω)	Dovolená chyba (Ω)	Nameraná chyba (Ω)
0,373	0,40	0,13	0,027
6,80	6,84	0,59	0,04
10,50	10,70	1,90	0,20

Meranie AC napätia:

merací rozsah: 3,0 - 750,0 V, presnosť merania: $\pm(2,5\% \text{ MH} + 6 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (V)	Nameraná hodnota (V)	Dovolená chyba (V)	Nameraná chyba (V)
10,0	10,2	0,85	0,2
100,0	100,6	3,10	0,6
300,0	302	8,10	2,0

Meranie DC napätia:

merací rozsah: 3,0 - 999,9 V, presnosť merania: $\pm(2,5\% \text{ MH} + 6 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (V)	Nameraná hodnota (V)	Dovolená chyba (V)	Nameraná chyba (V)
10,00	10,1	0,85	0,1
100,0	100,9	3,10	0,9
300,0	301	8,10	1,0

Meranie dotykového napätia na prúdovom chrániči:

merací rozsah: 0,0 - 100,0 V, presnosť merania: $\pm(5\% \text{ MH} + 10 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (V)	Nameraná hodnota (V)	Dovolená chyba (V)	Nameraná chyba (V)
2,0	2,10	1,10	0,10
10,0	10,20	1,50	0,20
50,0	50,20	3,50	0,20

Meranie zemného odporu:

merací rozsah: 0,01 - 9999 Ω , presnosť merania: $\pm(2\% \text{ MH} + 6 \text{ Dig})$

Nastavená hodnota (Ω)	Nameraná hodnota (Ω)	Dovolená chyba (Ω)	Nameraná chyba (Ω)
0,10	0,12	0,062	0,02
1,0	1,1	0,62	0,1
10,0	10,1	0,8	0,1
100	105	3	0,5

ODBORNÝ GARANT PROJEKČNÝCH PRÁČ

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo v časti projektovej dokumentácie, ktoréhokoľvek druhu alebo stupňa, bude v zmysle platných právnych predpisov uskutočňovať a garantovať osoba :

Meno a priezvisko :

Ing. arch. Marián Ferjo

Vzťah k zhotoviteľovi :

(napr. zamestnanec, subdodávateľ)

Subdodávateľ

v prípade subdodávateľa:

názov

Tristan studio s.r.o.

adresa

Vyžná Šebastová 138, 08006 Prešov

IČO

43779476

Táto osoba bude uskutočňovať a garantovať


tento druh a stupeň projektovej dokumentácie Realizačná dokumentácia

vlastnoručný podpis predmetnej osoby



Prílohy : doklad - platné oprávnenie na projektovanie v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 v znení neskorších zmien a doplnkov

V Prešove dňa 17. 7 2018


.....
zhotoviteľ

AUTORIZAČNÉ OSVEDČENIE



Slovenská komora architektov

Slovenská komora architektov osvedčuje,
že na základe splnenia zákonných podmienok
bol1.1.2004.... zapísaný do zoznamu autorizovaných
architektov pod registračným číslom1198 AA..... ako

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

.....Ing.arch. Marián FERJO.....

.....nar. 22.4.1973.....

P. Pm.

.....
predseda

(Signature)
.....
predseda
autorizačnej komisie

STAVBYVEDÚCI

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo v časti uskutočňovania stavebných prác bude v zmysle platných právnych predpisov uskutočňovať prostredníctvom stavbyvedúceho :

Meno a priezvisko :

Ing. Viliam Čech

Vzťah k zhotoviteľovi :

(napr. zamestnanec, subdodávateľ)

zamestnanec

v prípade subdodávateľa:

názov

.....

adresa

.....

IČO

.....

vlastnoručný podpis oprávnenej osoby
(stavbyvedúceho)

.....

Prílohy : doklad - platné oprávnenie v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 v znení neskorších zmien a doplnkov

V Prešove dňa 17.9.2018

.....
zhotoviteľ



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Viliam Čech

691005/8595

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Pozemné stavby

s evidenčným číslom **09444*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

17.12.2001

Dátum vydania

**VYKONANIE ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH
SKÚŠOK VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
ELEKTRICKÝCH**

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo v časti odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v zmysle platných právnych predpisov bude uskutočňovať a garantovať osoba :

Meno a priezvisko :

Ján Čizmár

Vzťah k zhotoviteľovi :

(napr. zamestnanec, subdodávateľ)

Subdodávateľ

v prípade subdodávateľa:

názov

Ján Čizmár


adresa

Družstevná 18, 03006 Prešov

IČO

10739998

vlastnoručný podpis predmetnej osoby





Prílohy : doklad - platné oprávnenie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

V Prešove dňa 17.9.2018

.....
zhotoviteľ

INŠPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE V PREŠOVE



OPRÁVNENIE

číslo: 211 IPV 1998 EZ M,O,S A,B E2

vydané podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z. (ďalej len „zákon“) a § 3 vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písm. c) zákona dňa: 29.05.1998

na činnosť: montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

poznámka: Odb. prehliadky a odb. skúšky el. zariadení do 52 kV

pre: Ján ČIŽMÁR
Družstevná 18
080 06 Prešov

IČO: 10739998

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom a záväznom stanovisku č.: 2435/3/98 zo dňa: 29.05.1998 vydanom Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona, na základe ktorých bolo oprávnenie vydané a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Oprávnenie platí do:

V Prešove



dňa: 08.06.1998



Ing. Priputen Július

RIADITEĽ IBP

INŠPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE V PREŠOVE



OSVEDČENIE

číslo: 114 IPV 1998 EZ E A,B E1.1

vydané podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona NR SR č. 256/1994 Z.z. (ďalej len „zákon“) a § 14 ods. 3 vyhlášky ÚBP SR č. 74/1996 Z.z. po preverení odbornej spôsobilosti Technickou inšpekciou podľa § 6a ods. 1 písm. d) zákona dňa: 12.03.1998

na činnosť: Elektrotechnik špecialista - odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov

poznámka: zariadenia do 52 kV

pre: Ján ČIŽMÁR
Družstevná 18
08006 Prešov

Rod. č. 431109/148

Držiteľ osvedčenia je pri činnosti podľa osvedčenia povinný dodržiavať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Osvedčenie platí do:

V Prešove




dňa: 07.04.1998



Ing. Priputen Július

RIADITEĽ IBP

Potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy v zmysle
zákona č. 124/2006 § 16 ods. 4

<p>Dátum absolvovania : 15.06.2004</p> <p>V rozsahu / počet hodín / : 10 hod.</p> <p>Číslo oprávnenia fyzickej osoby : VV2-0112/04-05.2</p>	<p>Pečiatka a podpis :</p> 
<p>Dátum absolvovania : 19.03.2012</p> <p>V rozsahu / počet hodín / : P</p> <p>Číslo oprávnenia fyzickej osoby :</p>	<p>Pečiatka a podpis :</p> 
<p>Dátum absolvovania : P.2.2012</p> <p>V rozsahu / počet hodín / : P</p> <p>Číslo oprávnenia fyzickej osoby : VV2-0023/13-05.1 VV2-0027/13-05.2</p>	<p>Pečiatka a podpis :</p> 
<p>Dátum absolvovania :</p> <p>V rozsahu / počet hodín / :</p> <p>Číslo oprávnenia fyzickej osoby:</p>	<p>Pečiatka a podpis:</p>

Zmluva o dielo

na zhotovenie stavby:

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

časť "G" Ostatné doklady zmluvy

Ostatnými dokladmi zmluvy sú nasledujúce prílohy tejto časti "G" Zmluvy o dielo :

- časový harmonogram realizácie jednotlivých činností podľa jednotlivých fakturačných celkov
- poisťné zmluvy v zmysle zmluvných podmienok *)
- zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov *)
- zoznam subdodávateľov

Objednávateľ:

Zastúpený: Ing. Ján Brozman

Miesto a dátum: V Drienovskej Novej Vsi, dňa 5.9.2019

Podpis:



Zhotoviteľ:

Zastúpený: Ing. Viliam Čech

Miesto a dátum: V Prešove, dňa 12.10.2018

Podpis:

*) predkladá následne len úspešný uchádzač

Harmonogram

Stavba : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves

Fakturačný celok	Dĺžka cyklu v mesiacoch					
	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						

V Prešove, dňa 17.9.2018

Ing. Viliam Čech

PRÍLOHA ČASŤI "G" ZMLUVY O DIELO - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov	Adresa sídla	IČO (identifikačné číslo organizácie)	Predmet plnenia	Percentuálny podiel plnenia z celkovej hodnoty zákazky
Tristan studio, s.r.o.	Vyšná Šebastová 138	42 779 476	Realizačná PD	0,1 %

Príloha: Overené kópie dokladov oprávnenia uskutočňovať práce, resp. služby vyššie uvedených subdodávateľov (výpis z obchodného resp. živnostenského registra alebo na ich úroveň postavené oprávnenie)

V Prešove, dňa 17.9.2018

podpis zhotoviteľa :

10/11/2018 10:00:00
Príloha číslo 9
275 98 Banská Bystrica
052

Číslo dožiadania : el-56069/2018/P

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Prešov

k dátumu 17.09.2018

Oddiel: **Sro**

Vložka číslo: 19253/P

I. Obchodné meno

TRISTÁN studio, s. r. o.

II. Sídlo

Názov obce: Vyšná Šebastová 138

PSČ: 080 06

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 43 779 476

IV. Deň zápisu: 20.10.2007

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
2. organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, konferencií a výstav
3. sprostredkovanie služieb v stavebníctve
4. prenájom hnutelných vecí
5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
6. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
7. inžinierska činnosť v stavebníctve, okrem vybraných činností vo výstavbe
8. reklamná a propagačná činnosť, výroba reklamných a propagačných produktov
9. projektovanie stavieb

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Marián Ferjo

Bydlisko:

Názov obce: Vyšná Šebastová 138

PSC: 080 06

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.04.1973

Rodné číslo: 730422/9570

Vznik funkcie: 20.10.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačnému alebo písanému obchodnému menu pripojí svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Marián Ferjo

Bydlisko:

Názov obce: Vyšná Šebastová 138

PSC: 080 06

Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR

Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

IX. Výška základného imania

6 638,783775 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

6 638,783775 EUR

Výpis zo dňa 09.05.2018

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
- Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

SP-09-05-2018-000545

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

09.05.2018 09:36:57

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Rra9ePLBC3sj+UMpVRU6VUDRiDaf5qdxWcDyM60rCQ8=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Jana

Priezvisko

Puškárová

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

2 / 2

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1681 -
